Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Надземная строительная часть здания				
			Раздел: Вентшахты (АР-88)				
1	154	6105-0201-0410ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	89.96	36 413	3 275 712
2	155	212-401-0103РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	15.302196	20 929	320 260
3	156	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый 50 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	25.629604	111 768	2 864 570
4	157	6105-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.51	316 026	161 173
5	158	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.51	382 476	195 063
			Итого по разделу: Вентшахты (АР-88)				**6 816 779**
			Итого по локальной смете: Надземная строительная часть здания				**6 816 779**
			ИТОГО по акту:				**6 816 779**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.300%)				6816779.000 x 7.30%	497 624
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				6816779.000 + 497624.880	7 314 403
		Сметная прибыль, (5.00%)				7314403.880 x 5.00%	365 720
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				7314403.880 x 5.000%	365 720
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					8 045 844
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				8045844.268 x 1.0557	8 493 997
		НДС (12%)				8493997.794 x 12%	1 019 279
		Итого с НДС				8493997.794 + 1019279.735	9 513 277

Лист согласования
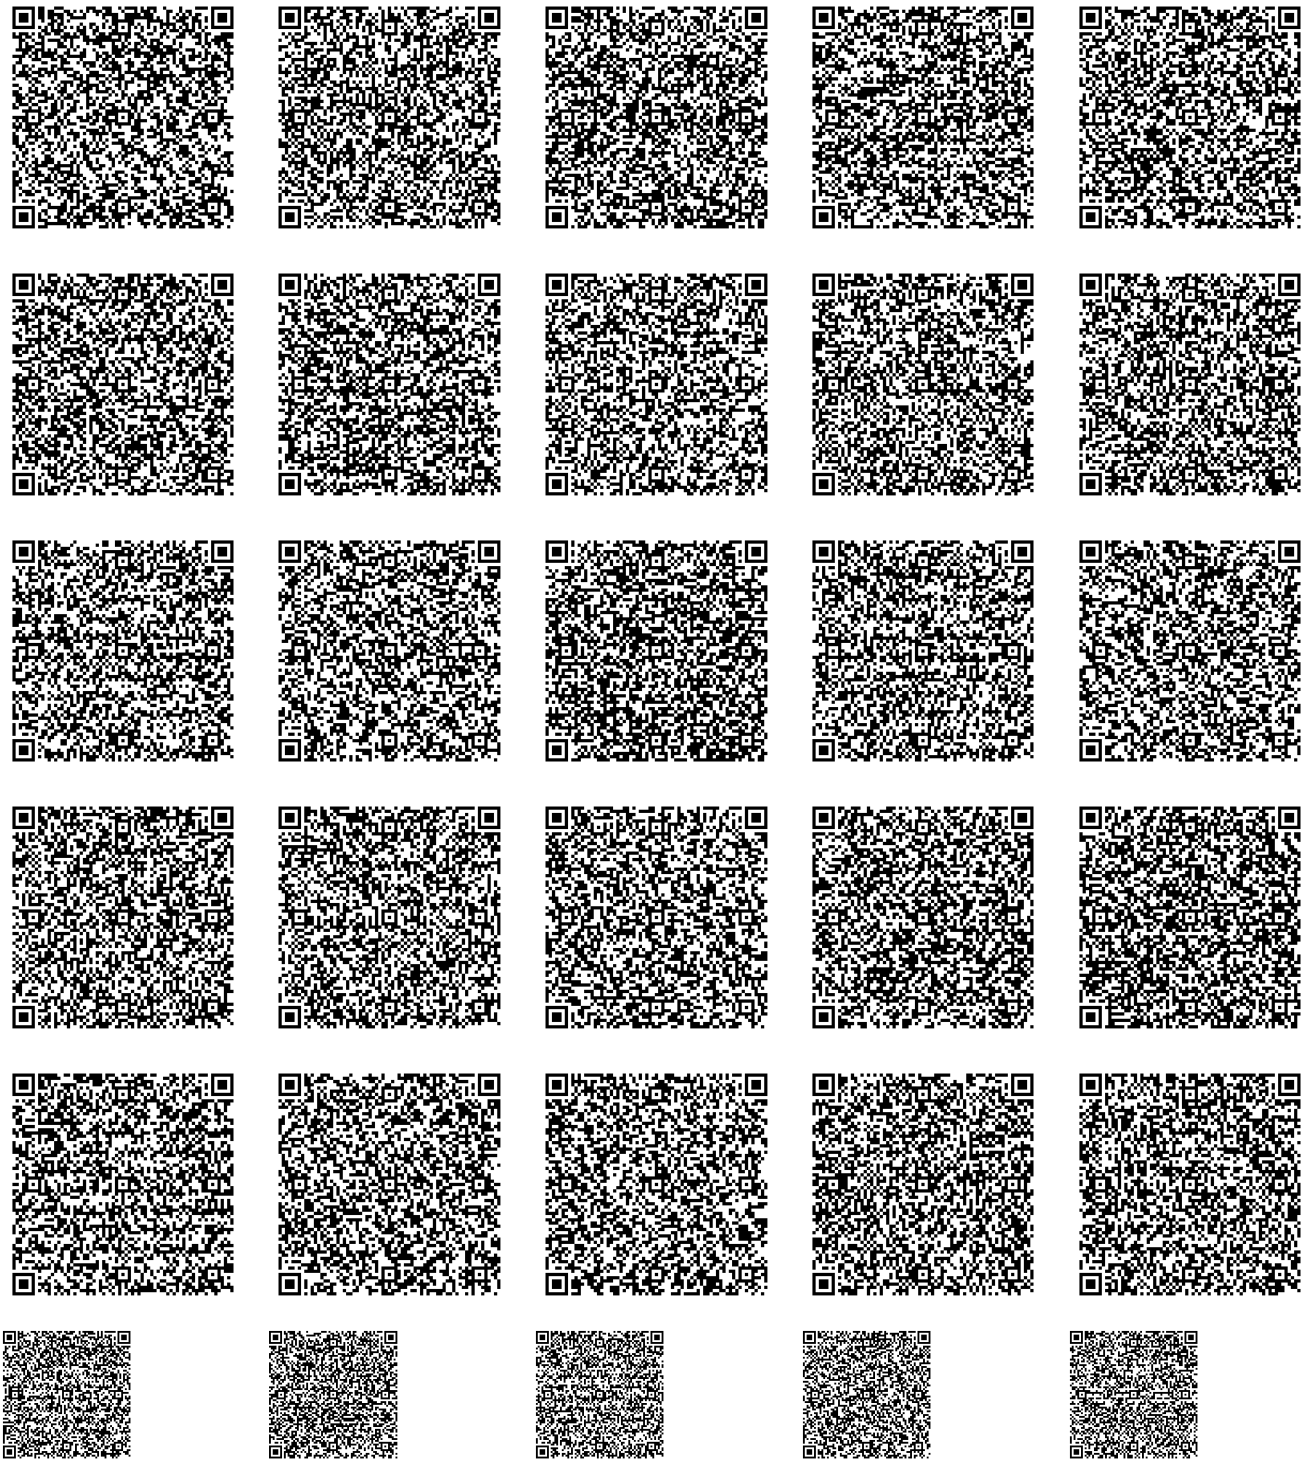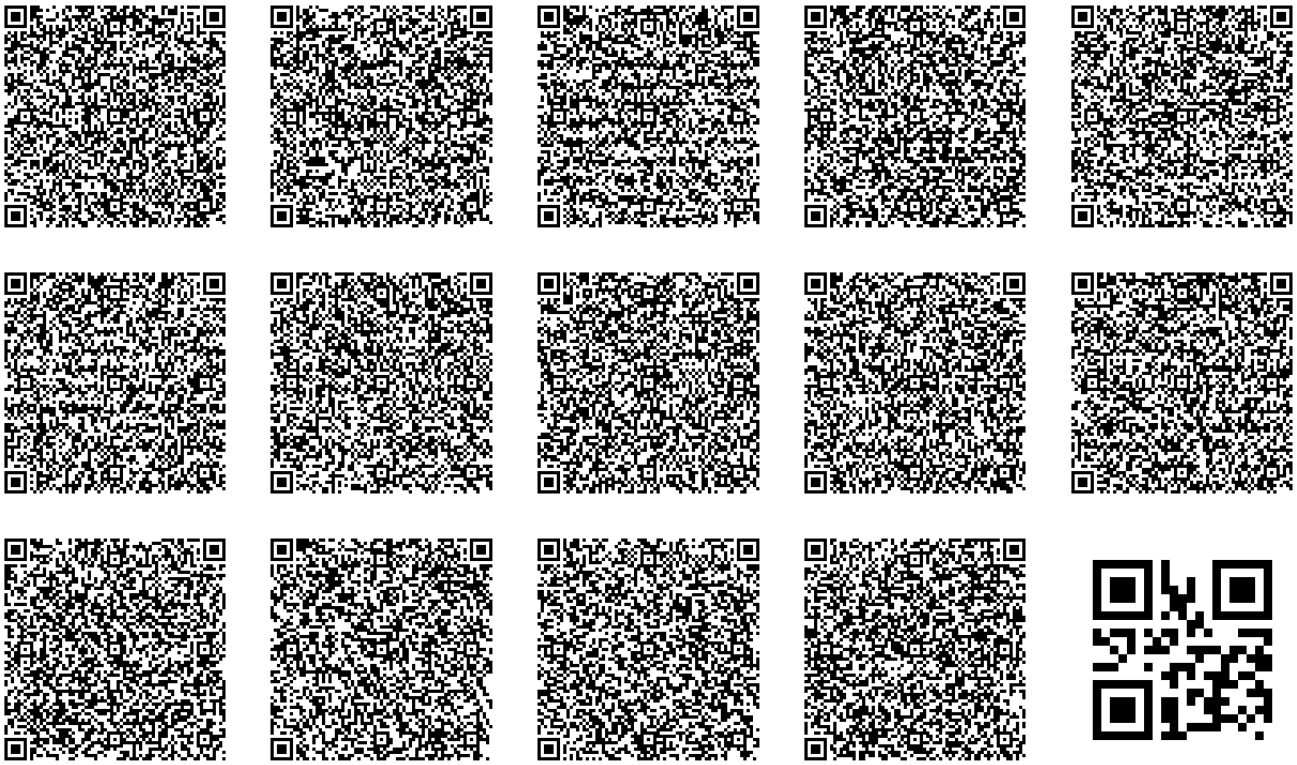
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	20.03.2025 16:54
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	21.03.2025 16:12
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	21.03.2025 18:00
Представители заказчика		
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	31.03.2025 16:09
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	31.03.2025 23:58
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	31.03.2025 23:57 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
