*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Апрель 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Система контроля и управления доступом. Охранная сигнализация** | | | | |
| | | | **Раздел: Охранная сигнализация** | | | | |
| 1 | 52 | 6125-0601-0701ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного | шт. | 1 | 17 403 | 17 403 |
| 2 | 53 | 248-303-0234СпрСЦ 03.2024 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 | 250 112 | 250 112 |
| 3 | 54 | 6125-0601-0303ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля | шт. | 1 | 29 575 | 29 575 |
| 4 | 55 | 248-306-0341РСНБ РК 2022 | Источник электропитания ИВЭПР 12/2 исп.1х7-Р | шт. | 1 | 22 504 | 22 504 |
| 5 | 56 | 6124-0105-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1 | шт. | 1 | 12 990 | 12 990 |
| 6 | 57 | 248-306-0377СпрСЦ 03.2024 | Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М | шт. | 1 | 30 602 | 30 602 |
| 7 | 58 | 6125-0601-0204ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей | шт. | 86 | 5 625 | 483 750 |
| 8 | 59 | 248-301-0914РСНБ РК 2022 | Извещатель охранный Модели ИО-32920-2 | шт. | 9 | 20 060 | 180 540 |
| 9 | 60 | 248-301-0916СпрСЦ 03.2024 | Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание | шт. | 52 | 3 659 | 190 268 |
| 10 | 61 | 248-301-0917СпрСЦ 03.2024 | Извещатель охранный Модели ИО 40920-2, ИК, пассивный, объёмный | шт. | 25 | 12 967 | 324 175 |
| 11 | 62 | 6125-0601-0701ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного | шт. | 4 | 17 403 | 69 612 |
| 12 | 63 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3 | шт | 4 | 3 663 | 14 653 |
| 13 | 64 | 6125-0601-0206ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж конструкции для установки извещателя | шт. | 25 | 2 241 | 56 025 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 65 | 243-907-4317РСНБ РК 2022 | Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы /+для крепления извещателя ИО 40920-2 SMB-10/ | шт. | 25 | 749 | 18 725 |
| | | | **Подраздел: Кабели и провода** | | | | |
| 15 | 66 | 6119-0102-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 1250 | 859 | 1 073 750 |
| 16 | 67 | 241-207-0302РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 1262.5 | 54 | 68 175 |
| 17 | 68 | 243-305-0905СпрСЦ 03.2024 | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,35 | м | 1287.5 | 201 | 258 788 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабели и провода** | | | | **1 400 713** |
| | | | **Итого по разделу: Охранная сигнализация** | | | | **3 101 647** |
| | | | **Итого по локальной смете: Система контроля и управления доступом. Охранная сигнализация** | | | | **3 101 647** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **3 101 647** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%) | 3086994.000 x 7.30% | 225 351 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 3101647.000 + 225350.568 | 3 326 998 |
| | Сметная прибыль, (5.00%) | 3312344.568 x 5.00% | 165 617 |
| | Непредвиденные расходы, (5.000%) | 3326997.568 x 5.000% | 166 350 |
| | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | 3 658 965 |
| | **НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557** | 3658964.675 x 1.0557 | 3 862 769 |
| | НДС (12%) | 3862769.007 x 12% | 463 532 |
| | **Итого с НДС** | 3862769.007 + 463532.281 | 4 326 301 |

Лист согласования
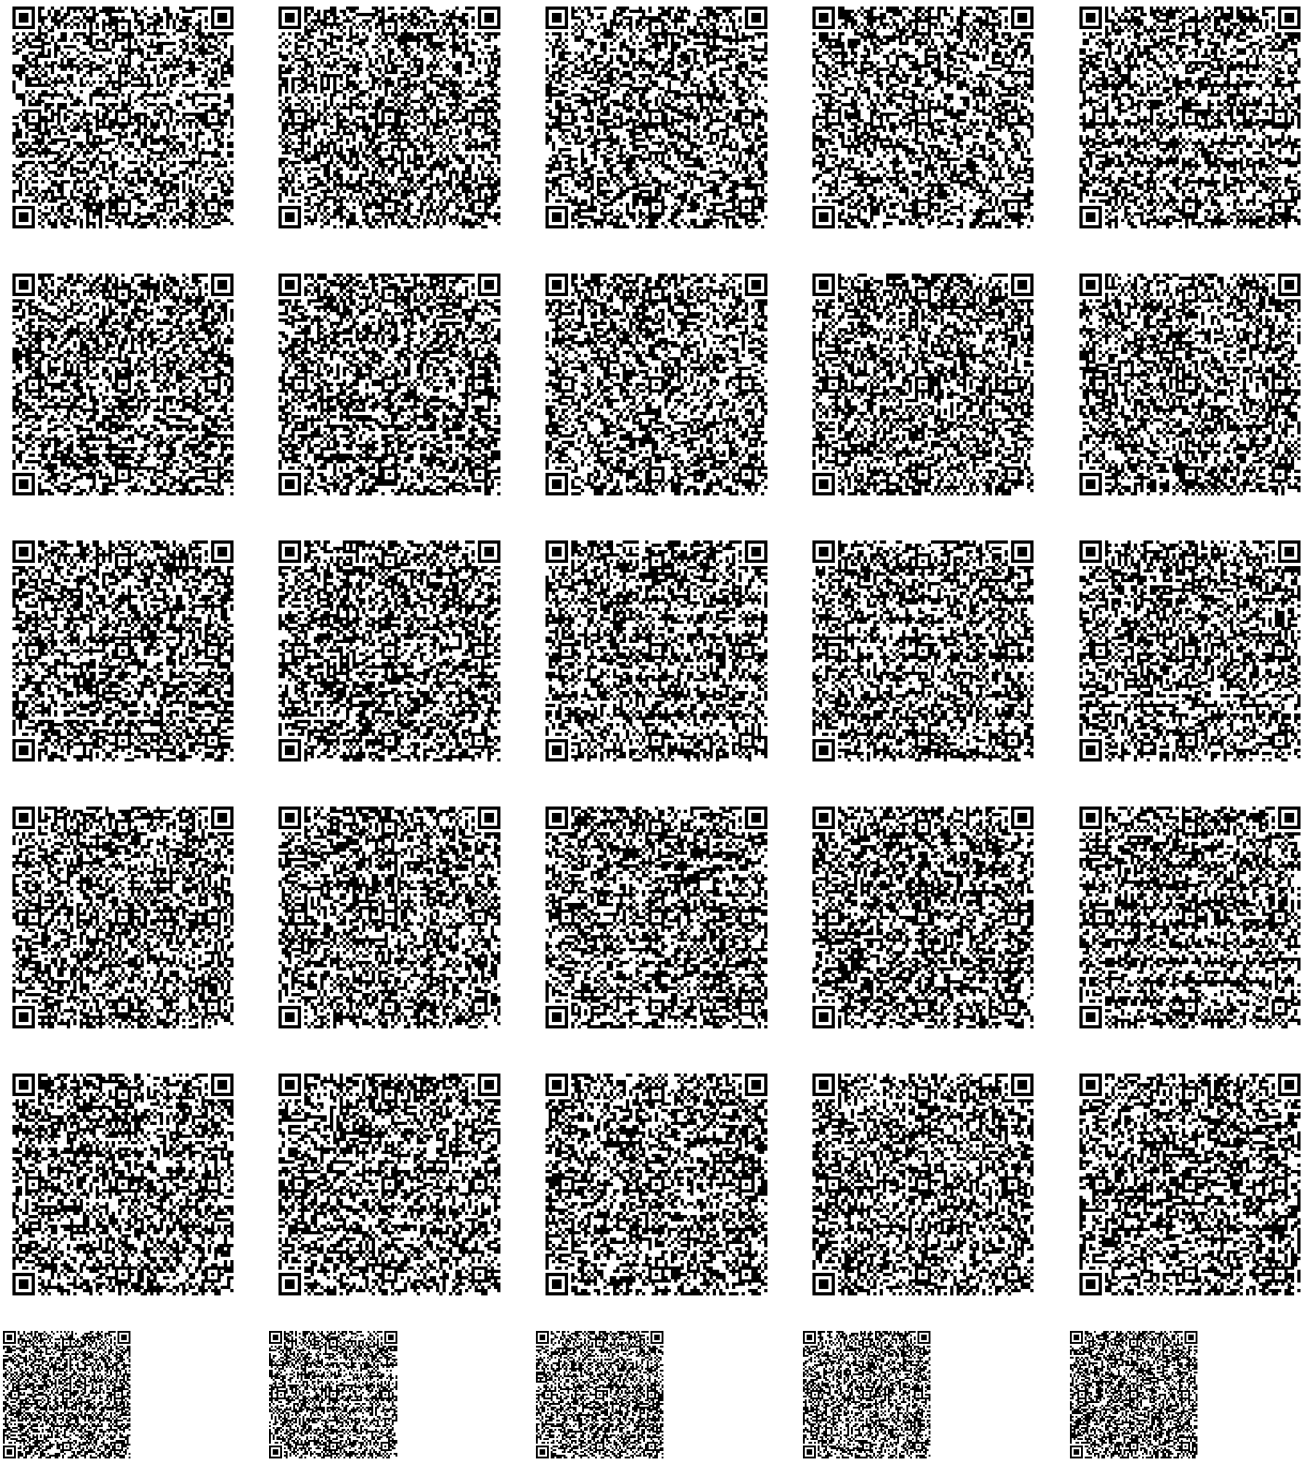
| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ | Директор | 01.04.2025 08:50 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 871006350537 - ЖАНГУЖИН САЯН АМАНЖОЛОВИЧ | технический надзор | 01.04.2025 15:51 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ | Авторский надзор | 02.04.2025 10:06 |
| **Представители заказчика** | | |
| 950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ | Ведущий специалист | 04.04.2025 17:38 |
| 820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА | Ведущий специалист (сметчик) | 07.04.2025 12:37<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ | Директор регионального подразделения | 08.04.2025 10:43 |
