Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система электрочасофикации и звонковой сигнализации				
			Раздел: Электрочасофикация				
1	1	6125-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования часов первичные электрических показывающих кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1	шт.	1	18 292	18 292
2	2	518-203-0102СпрСЦ 03.2024	Часовая станция Standing, 300 мм х 315 мм х 56 мм, 220 В, температура от -10 до +45	шт.	1	238 814	238 814
3	3	6125-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на стене электрочасов вторичных для помещений односторонних	шт.	37	10 061	372 257
4	4	518-203-0202СпрСЦ 03.2024	Цифровые часы Standing 114, 448 мм х 186 мм х 12 мм, 220В, температур от -10 до +45	шт.	37	89 406	3 308 022
5	5	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	37	4 748	175 676
6	6	518-203-0301СпрСЦ 03.2024	Standing-BGR, блок гальванической развязки	шт.	37	10 343	382 691
7	7	6125-0202-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого усилителя дуплексного или абонентского	шт.	14	85 837	1 201 718
8	8	518-203-0302СпрСЦ 03.2024	Standing-AUS, активный усилитель сигнала и напряжения	шт.	14	88 129	1 233 806
9	9	СпрСЦ 03.2024	Зажимные колодки	шт	74	778	57 562
10	10	СпрСЦ 03.2024	Коннектор RG-45	шт	35	39	1 381
11	11	6125-0408-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж звонка	шт.	36	5 050	181 800

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	518-203-0303СпрСЦ 03.2024	МЗМ-1, звонок громкого боя	шт.	36	28 134	1 012 824
13	13	247-202-0701РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	18	928	16 704
			Подраздел: Кабельные изделия				
14	14	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	1980	403	797 940
15	15	243-107-2301РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х1 (ок)-0,66	м	1060.9	241	255 677
16	16	243-107-2503РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	м	978.5	730	714 305
			Итого по подразделу: Кабельные изделия				**1 767 922**
			Подраздел: Трубная продукция				
17	17	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1980	1 478	2 926 440
18	18	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1999.8	54	107 989
			Итого по подразделу: Трубная продукция				**3 034 429**
			Итого по разделу: Электрочасофикация				**13 003 898**
			Итого по локальной смете: Система электрочасофикации и звонковой сигнализации				**13 003 898**
			ИТОГО по акту:				**13 003 898**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	6826360.000 x 7.30%	498 324
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	13003898.000 + 498324.293	13 502 222
	Сметная прибыль, (5.00%)	7324684.293 x 5.00%	366 234
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	13502222.293 x 5.000%	675 111
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		14 543 568
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557	14543567.622 x 1.0557	15 353 644
	НДС (12%)	15353644.339 x 12%	1 842 437
	Итого с НДС	15353644.339 + 1842437.321	17 196 082

Лист согласования
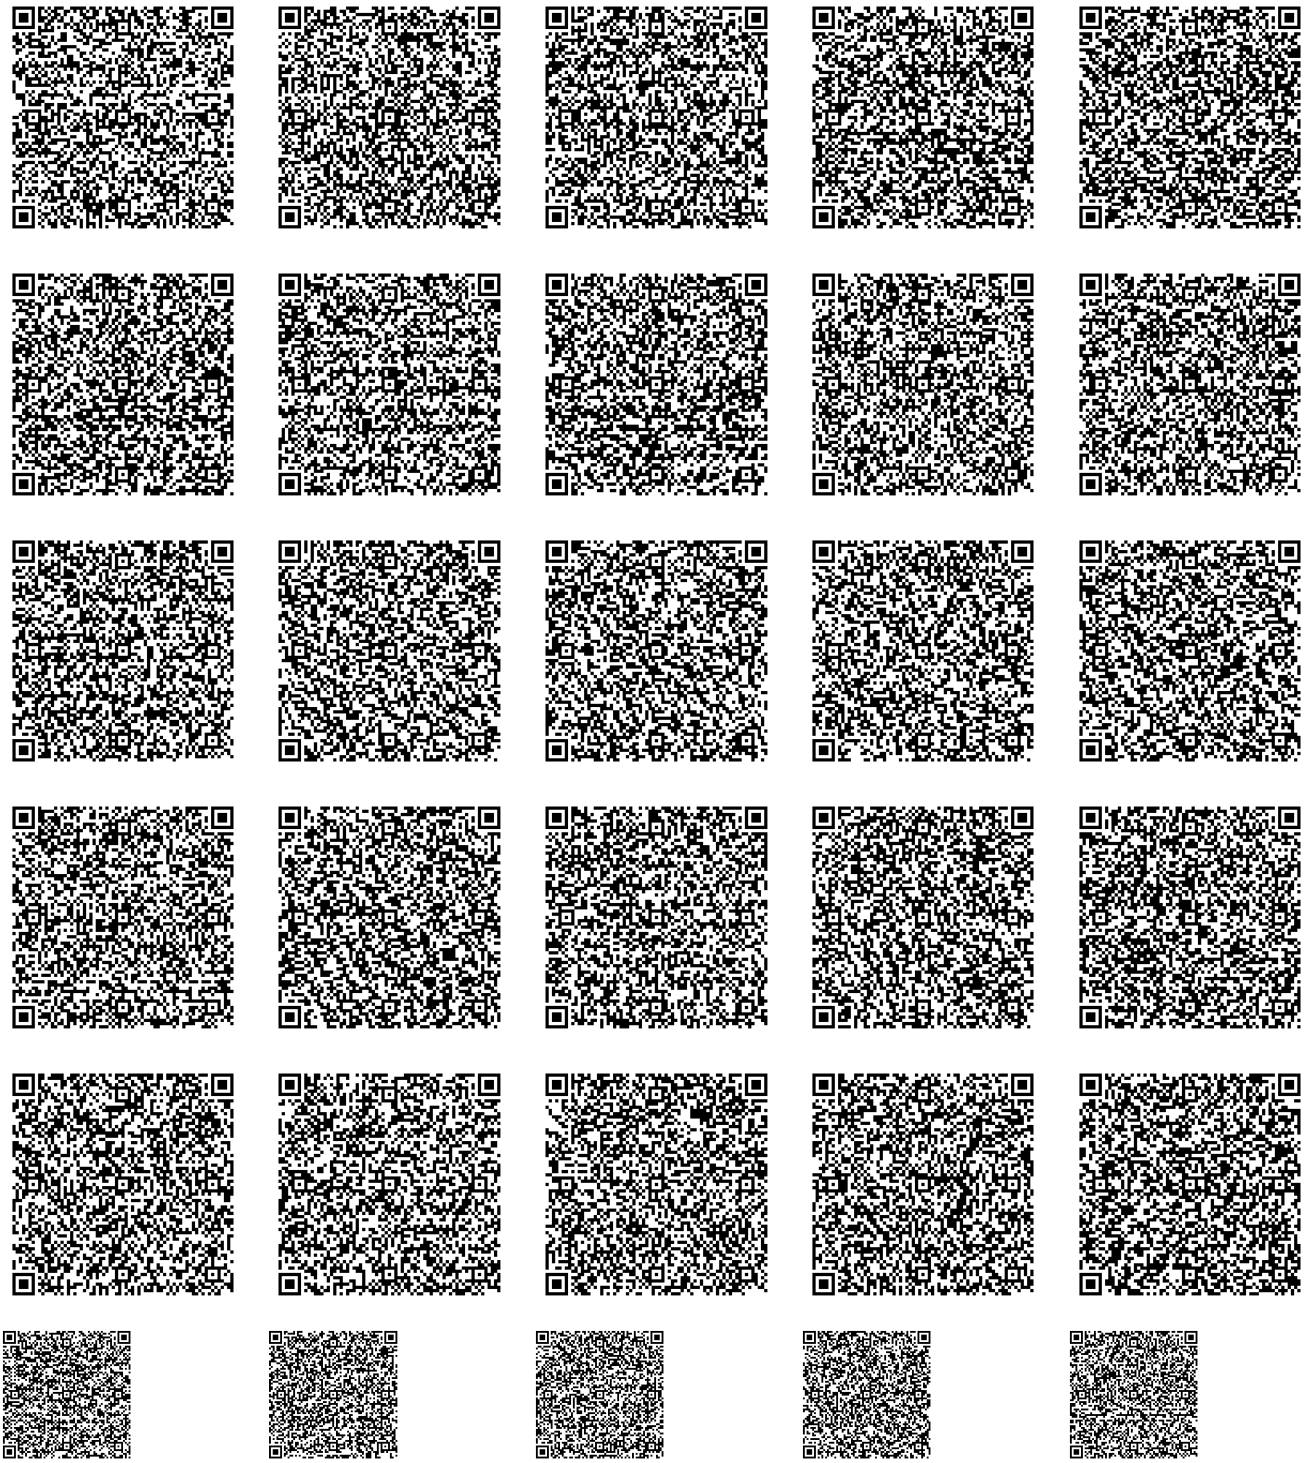
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	01.04.2025 08:51
Представители технического надзора		
871006350537 - ЖАНГУЖИН САЯН АМАНЖОЛОВИЧ	технический надзор	01.04.2025 15:53
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	02.04.2025 10:06
Представители заказчика		
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	07.04.2025 12:47 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	04.04.2025 17:42
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	08.04.2025 10:48
