Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Автоматическая пожарная сигнализация				
			Раздел: Автоматическая пожарная сигнализация				
1	1	6125-1101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6 031	6 031
2	2	521-101-0401005 СпрСЦ 03.2024	Системный блок HP Pavilion Gaming TG01-2087ur (60Q91EA), AMD Ryzen 5 5600G-3.9GHz/16Gb/512GbSSD/RX6600XT,8Gb/DOS	шт.	1	598 125	598 125
3	3	521-101-0401009 СпрСЦ 03.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9 031
4	4	521-101-0411004 СпрСЦ 03.2024	Монитор 27" Dell S2722DGM, Black, VA, 2560x1440x165Hz, 350кд/м2,3000:1, H/V:178, 2ms, 2xHDMI,DP	шт.	1	177 589	177 589
5	5	521-101-0401025 СпрСЦ 03.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47 232	47 232
6	6	СпрСЦ 03.2024	ПО "Microsoft Windows 11 Professional"	шт	1	96 446	96 446
7	7	СпрСЦ 03.2024	ПО "FireSec 3 Оперативная задача"	шт	1	95 570	95 570
8	8	6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	7	17 403	121 821
9	9	248-303-0234 СпрСЦ 03.2024	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ШКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	4	250 112	1 000 448

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	248-303-1101 СпрСЦ 03.2024	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	2	122 969	245 938
11	11	248-303-0802 СпрСЦ 03.2024	Прибор передачи извещений на компьютер модели R3-МС	шт.	1	113 862	113 862
12	12	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	2	29 575	59 150
13	13	248-306-0395 СпрСЦ 03.2024	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х7 БР (К1)	шт.	2	61 767	123 534
14	14	6124-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	4	12 990	51 960
15	15	248-306-0389 СпрСЦ 03.2024	Аккумулятор 12 В, 40 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1240С	шт.	4	128 508	514 032
16	16	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	975	11 010	10 734 750
17	17	248-302-0233 СпрСЦ 03.2024	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции	шт.	777	7 936	6 166 272
18	18	248-302-0234 СпрСЦ 03.2024	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64-R3 W2.02 для подвесного потолка	шт.	240	9 590	2 301 600
19	19	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования(извещатель ручной)	шт.	57	7 150	407 550
20	20	248-302-0536 СпрСЦ 03.2024	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	63	6 564	413 532
21	21	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	16	11 010	176 160
22	22	248-302-0403 СпрСЦ 03.2024	Извещатель пожарный дымовой линейный Модели ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264)	шт.	18	139 505	2 511 090
23	23	6125-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	5	5 484	27 420
24	24	248-302-0127 СпрСЦ 03.2024	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR-R3 W1.02 для несущей конструкции	шт.	5	8 750	43 750

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	83	17 403	1 444 449
26	26	248-310-0111 СпрСЦ 03.2024	УДП 513-11-R3 цвет и надпись по запросу, устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания	шт.	24	8 212	197 088
27	27	248-306-0829 СпрСЦ 03.2024	Модуль контроля и управления РМ-1-R3, модуль релейный	шт.	51	8 749	446 199
28	28	248-306-0831 СпрСЦ 03.2024	Модуль контроля и управления РМ-4-R3, модуль релейный	шт.	8	21 389	171 112
29	29	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	63	9 132	575 316
30	30	248-306-0836 СпрСЦ 03.2024	Модуль контроля и управления МДУ-1-R3 / МДУ-1С-R3 модуль автоматики дымоудаления	шт.	21	28 127	590 667
31	31	247-209-0103 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	21	856	17 976
32	32	247-212-0401 РСНБ РК 2022	Выключатель кнопочный типа ВК-22 ABLF 22 мм 220В	шт.	21	683	14 343
33	33	6125-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	4	5 484	21 936
34	34	248-301-0916 СпрСЦ 03.2024	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание	шт.	4	3 659	14 636
35	35	6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	33	17 403	574 299
36	36	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изолят шлейфа ИЗ-1 прот.R3	шт	33	3 663	120 886
37	37	6124-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	6	102 181	613 086
38	38	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Шкаф управления пожарной задвижкой ШУЗ-R3	шт	2	351 458	702 916
39	39	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Шкаф управления вентилятором подпора воздуха с функцией управления ТЭНами калорифера 0,37/9 кВт ШУВ-0,37-УК15-R3	шт	4	516 885	2 067 541
40	40	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Шкаф управления вентилятором дымоудаления 1,5кВт ШУВ-1,5-03-R3	шт	1	280 009	280 009
			Подраздел: Кабели и провода				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	6460	859	5 549 140
42	42	241-207-1702 СпрСЦ 03.2024	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	6524.6	140	913 444
43	43	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	1500	1 177	1 765 500
44	44	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1515	129	195 435
45	45	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	1500	403	604 500
46	46	243-305-0913 СпрСЦ 03.2024	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	м	236.9	335	79 362
47	47	243-305-0909 СпрСЦ 03.2024	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	м	7725	245	1 892 625
48	48	243-305-1009 СпрСЦ 03.2024	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	м	20.6	274	5 644
49	49	243-304-0135 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52	м	216.3	356	77 003
			Итого по подразделу: Кабели и провода				**11 082 653**
			Итого по разделу: Автоматическая пожарная сигнализация				**44 978 005**
			Итого по локальной смете: Автоматическая пожарная сигнализация				**44 978 005**
			ИТОГО по акту:				**44 978 005**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	40782660.000 x 7.30%	2 977 134
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	44978005.000 + 2977134.258	47 955 139
	Сметная прибыль, (5.00%)	43759794.258 x 5.00%	2 187 990
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	47955139.258 x 5.000%	2 397 757
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		52 540 886
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557	52540885.934 x 1.0557	55 467 413
	НДС (12%)	55467413.280 x 12%	6 656 090
	Итого с НДС	55467413.280 + 6656089.594	62 123 503

Лист согласования
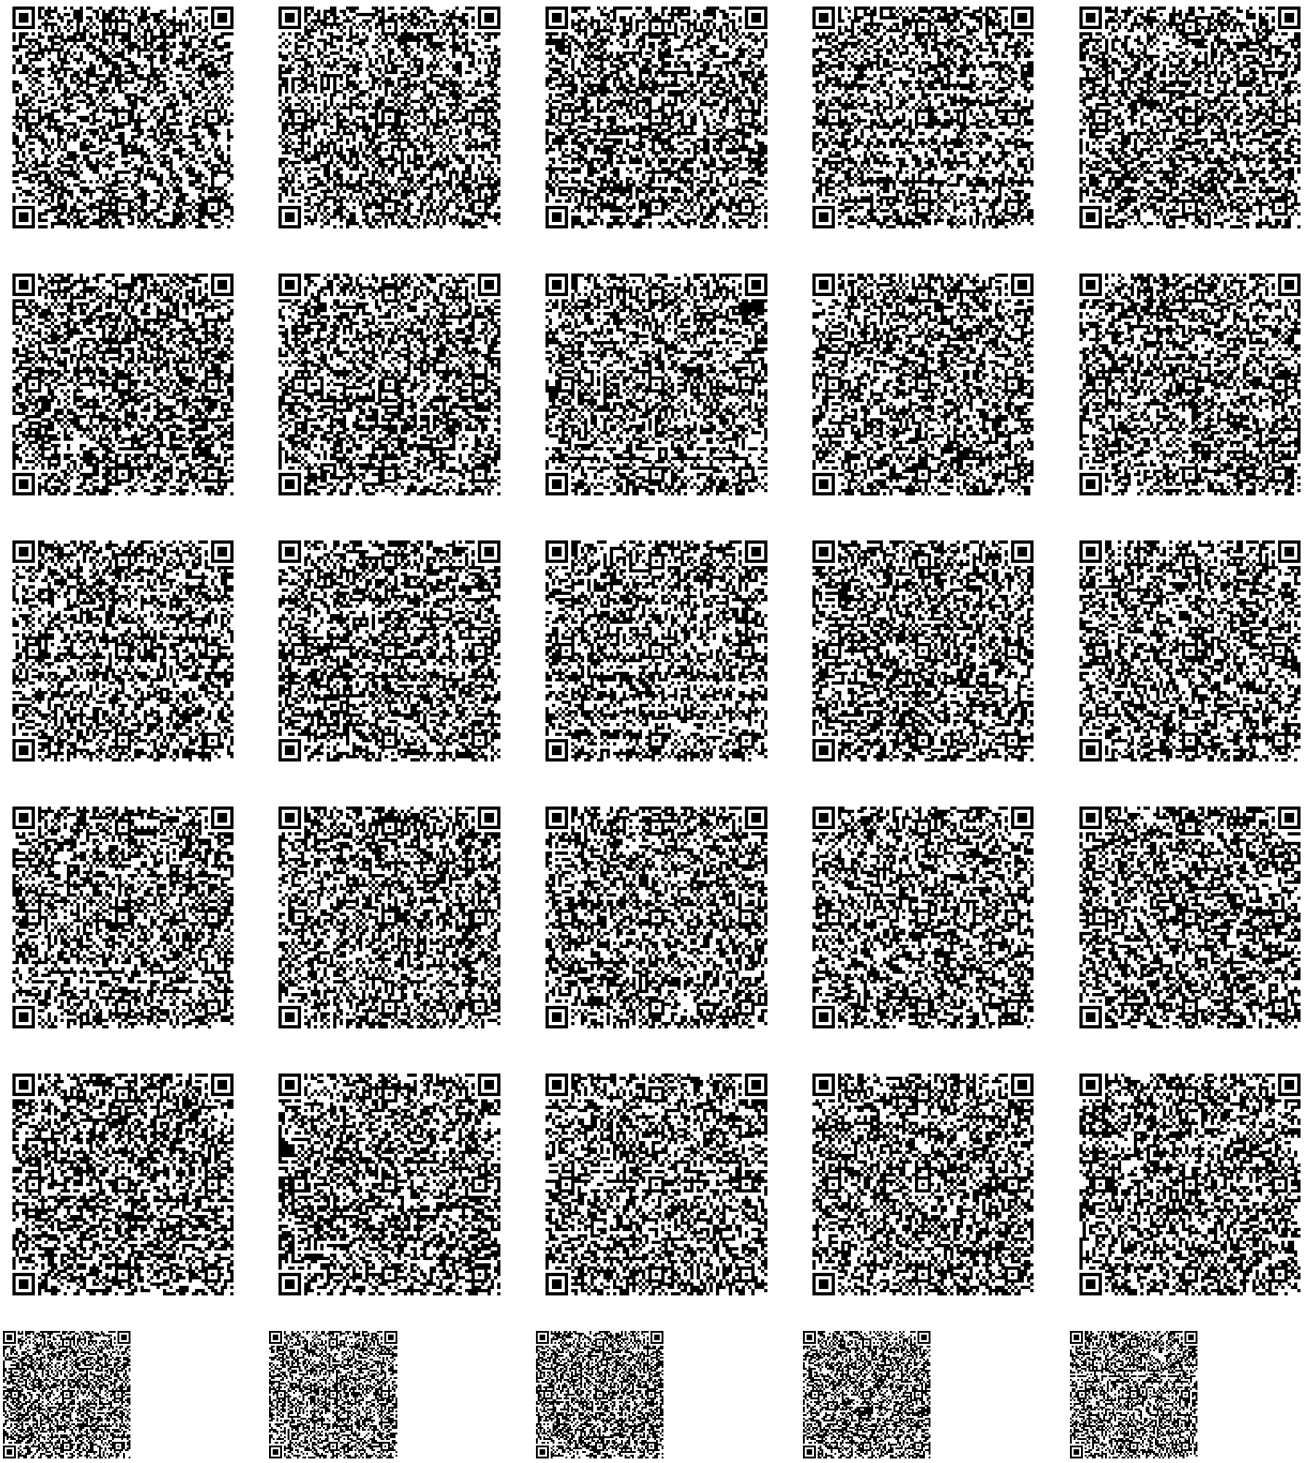
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	01.04.2025 08:52
Представители технического надзора		
871006350537 - ЖАНГУЖИН САЯН АМАНЖОЛОВИЧ	технический надзор	01.04.2025 15:56
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	02.04.2025 10:09
Представители заказчика		
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	04.04.2025 17:54
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	07.04.2025 16:46 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	08.04.2025 11:08
