Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружное освещение				
1	1	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	18.1	9 775	176 927
2	2	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	950	827	785 650
3	3	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	112	254	28 448
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	65.58	4 416	289 601
5	5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12	4 156	49 872
6	6	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	156	571	89 076
7	7	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	160.59	6 376	1 023 922
8	8	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	936	1 131	1 058 616
9	9	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	159	1 077	171 243

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг(в опоре освещения, зарядка светильников)	м	604	1 077	650 508
11	11	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	286	1 001	286 286
12	12	243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	1484.1	568	842 969
13	13	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	540.6	326	176 236
14	14	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1.59	5 671	9 017
15	15	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	37	32 996	1 220 852
16	16	212-101-0704 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	6.29	25 176	158 357
17	17	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	111	143	15 873
18	18	247-306-0412 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	37	82 552	3 054 424
19	19	247-306-0905 РСНБ РК 2022	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	53	8 255	437 515
20	20	247-306-0301 РСНБ РК 2022	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	16	8 469	135 504
21	21	247-306-0921 СпрСЦ 03.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	шт.	37	9 230	341 510
22	22	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	53	17 222	912 766
23	23	247-103-1005 СпрСЦ 03.2024	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 70/10000 ШБ 4К	шт.	53	186 508	9 884 924
24	24	6124-0303-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32 955	32 955

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	247-203-0301 РСНБ РК 2022	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 102	79 102
26	26	6125-0405-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дополнительная на пультах и панелях: кнопки	шт.	2	4 191	8 382
27	27	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	2	2 971	5 942
28	28	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	13	7 750	100 750
29	29	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм /+10 мм/	м	19.5	1 030	20 085
30	30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01794	344 590	6 182
31	31	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	30.1	345	10 384
			Итого по локальной смете: Наружное освещение				**22 063 878**
			ИТОГО по акту:				**22 063 878**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	22063878.468 x 7.30%	1 610 663
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	22063878.468 + 1610663.170	23 674 542
	Сметная прибыль, (5.00%)	23674541.638 x 5.00%	1 183 727
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	23674541.638 x 5.000%	1 183 727
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		26 041 996
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	26041995.802 x 1.0557	27 492 535
	НДС (12%)	27492534.968 x 12%	3 299 104
	Итого с НДС	27492534.968 + 3299104.196	30 791 639

Лист согласования
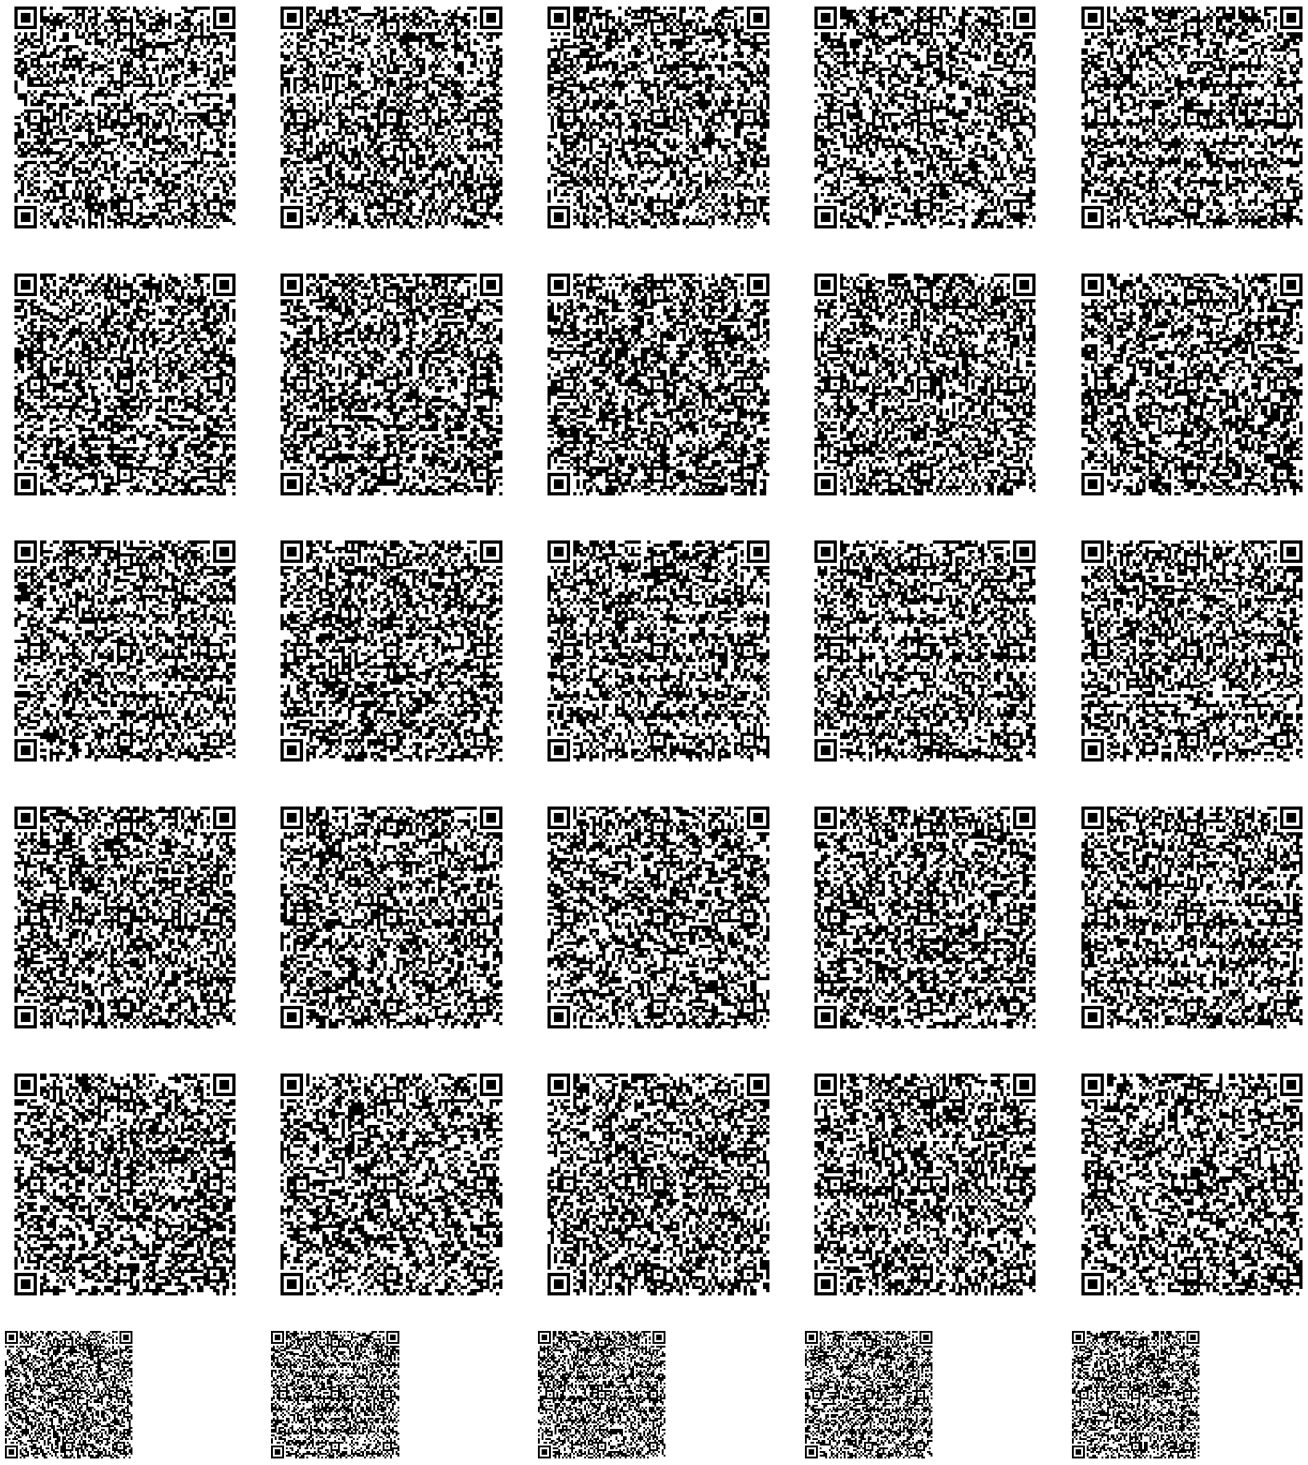
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	01.04.2025 08:52
Представители технического надзора		
871006350537 - ЖАНГУЖИН САЯН АМАНЖОЛОВИЧ	технический надзор	01.04.2025 15:58
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	02.04.2025 10:09
Представители заказчика		
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	04.04.2025 17:54
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	07.04.2025 16:52 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	08.04.2025 11:09
