Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружное электроснабжение				
			Раздел: Кабельная линия КЛ 0,4 кВ				
			Подраздел: Земляные работы				
1	1	6101-0102-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3	285.9075	445	127 229
2	2	6101-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 3.	м3	0.884	13 804	12 203
3	3	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	263	827	217 501
4	4	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1053	254	267 462
5	5	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	98.25	4 416	433 872
6	6	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	196.5	98	19 257
			Итого по подразделу: Земляные работы				**1 077 524**
			Подраздел: Трубы				
7	7	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	270	571	154 170
8	8	6119-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм /+ 110 мм/	м	960	1 814	1 741 440

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	241-207-0405РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1242.3	6 376	7 920 905
			Итого по подразделу: Трубы				**9 816 515**
			Подраздел: Кабель				
10	10	6124-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	1797	2 027	3 642 519
11	11	6124-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	1191.509434	2 566	3 057 413
12	12	243-125-2951РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х240 (мс)-1	м	346.8	6 779	2 350 957
13	13	243-125-2949РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х150 (мс)-1	м	2162.4	4 550	9 838 920
14	14	243-125-2948РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х120 (мс)-1	м	612	3 833	2 345 796
			Итого по подразделу: Кабель				**21 235 605**
			Подраздел: Муфта				
15	15	6124-0201-2812 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2	шт.	24	23 079	553 896
16	16	243-903-2006РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	24	55 876	1 341 024
17	17	6124-0201-2811 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	6	22 000	132 000
18	18	243-903-2005РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	6	47 514	285 084
19	19	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	500	24	12 000
20	20	249-101-0507РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	300	313	93 900
21	21	249-101-0504РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	200	158	31 600
			Итого по подразделу: Муфта				**2 449 504**
			Подраздел: Кабельный колодец				
22	22	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	2	26 924	53 848
23	23	225-201-0103РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10 /+ ККТ-2/	шт.	2	59 012	118 024
			Итого по подразделу: Кабельный колодец				**171 872**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Дизельная электростанция				
24	24	6124-0104-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Преобразователь массой до 3 т. Монтаж оборудования	шкаф	1	325 247	325 247
25	25	515-103-0151РСНБ РК 2022	Дизель-генератор модель TTm 140TS, 140 кВа, 100 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	8 777 870	8 777 870
			Итого по подразделу: Дизельная электростанция				**9 103 117**
			Подраздел: Заземление ДЭС				
26	26	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1.44	7 965	11 470
27	27	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1.44	4 156	5 985
28	28	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	80	1 452	116 160
29	29	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	7 750	62 000
			Итого по подразделу: Заземление ДЭС				**195 614**
			Итого по разделу: Кабельная линия КЛ 0,4 кВ				**44 049 751**
			Раздел: Строительные работы ДЭС (НС.АС-7,8)				
			Подраздел: Фундамент ФМПО-1				
30	30	6101-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м.	м3 грунта	0.227	12 051	2 736
31	31	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1.54	9 546	14 701
32	32	211-201-0606РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.771	3 311	5 864
33	33	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	1.5	10 494	15 741
34	34	212-101-0303РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1.53	21 989	33 643
35	35	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	15.4	4 271	65 773
36	36	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	4.1	14 521	59 536

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	212-101-2102РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	4.1615	24 700	102 789
38	38	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08684	344 590	29 924
39	39	214-210-0301РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0.12204	331 658	40 476
			Итого по подразделу: Фундамент ФМПО-1				**371 183**
			Итого по разделу: Строительные работы ДЭС (НС.АС-7,8)				**371 183**
			Итого по локальной смете: Наружное электроснабжение				**44 420 934**
			ИТОГО по акту:				**44 420 934**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	35643063.549 x 7.30%	2 601 944
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	44420933.549 + 2601943.707	47 022 877
	Сметная прибыль, (5.00%)	38245007.256 x 5.00%	1 912 250
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	47022877.256 x 5.000%	2 351 144
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		51 286 271
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2-2024 года 3 квартал, к = 1.0557	51286271.482 x 1.0557	54 142 917
	НДС (12%)	54142916.803 x 12%	6 497 150
	Итого с НДС	54142916.803 + 6497150.016	60 640 067

Лист согласования
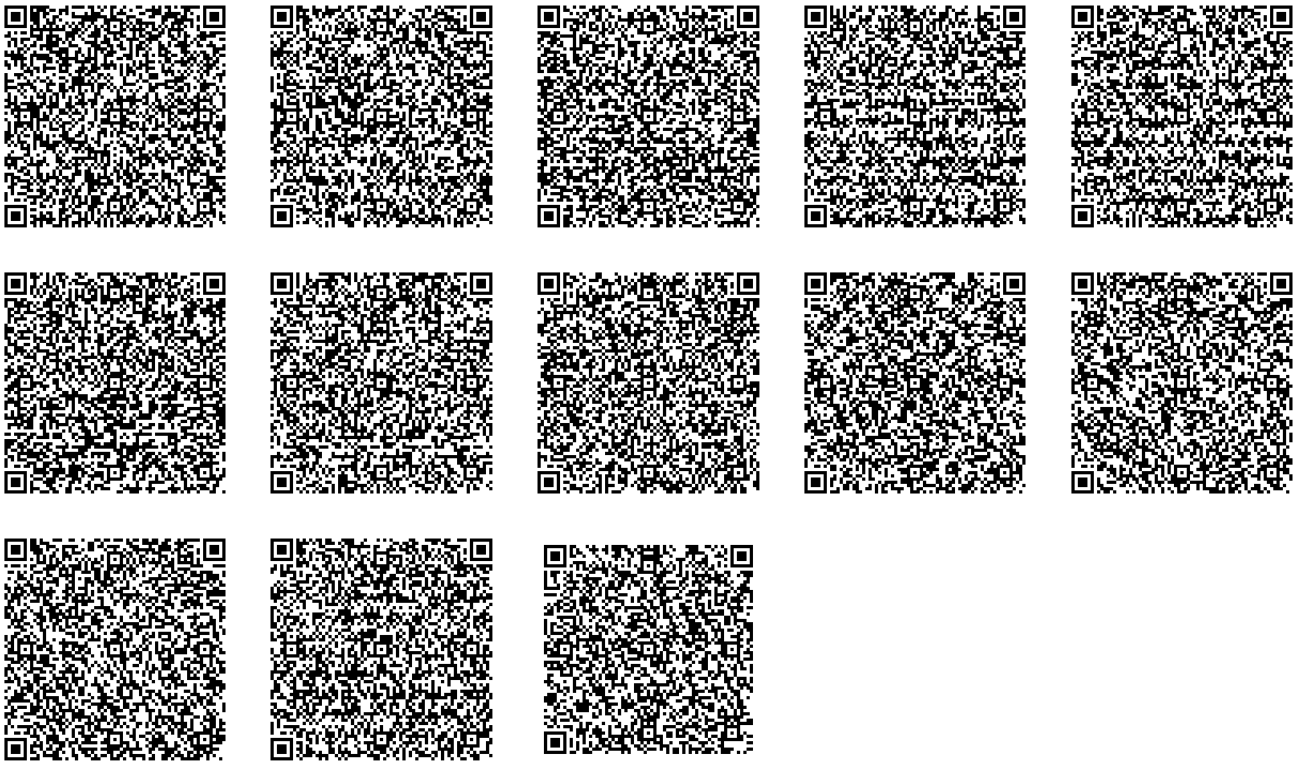
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	02.04.2025 14:01
Представители технического надзора		
871006350537 - ЖАНГУЖИН САЯН АМАНЖОЛОВИЧ	технический надзор	03.04.2025 09:42
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	02.04.2025 14:28
Представители заказчика		
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	12.04.2025 11:32
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	15.04.2025 15:23 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	15.04.2025 16:41
