Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети водопровода и канализации				
			Раздел: Наружный водопровод В1				
			Подраздел: Р Земляные работы (ПОС)				
1	1	6101-0101-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3055.6	546	1 668 358
2	2	6101-0201-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	41.5	15 392	638 768
3	3	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы /песком/	м3	190.76	3 784	721 836
4	4	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /+ засыпка футляров песком/	м3	163.98	84	13 774
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	354.74	4 416	1 566 532
6	6	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2742.36	98	268 751
7	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	822.708	656	539 696
			Итого по подразделу: Р Земляные работы (ПОС)				**5 417 715**
			Подраздел: Лишний грунт учтен в вертикальной планировке				
8	8	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	41.5	10 283	426 744

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Лишний грунт учтен в вертикальной планировке				**426 744**
			Подраздел: Р Трубопроводы				
9	9	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0.24462	1 495 058	365 721
10	10	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	247.0662	2 175	537 369
11	11	6121-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0.1535	1 750 246	268 663
12	12	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	155.035	4 428	686 495
13	13	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.141344	3 884 297	549 022
14	14	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3.6	6 429	23 144
15	15	241-102-0178 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	0.6	3 921	2 353
16	16	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	2.2	13 738	30 224
			Итого по подразделу: Р Трубопроводы				**2 462 991**
			Подраздел: Футляр Д-426х8,0 L-13,7 м (1 шт)				
17	17	6121-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0.0137	7 568 893	103 694
18	18	241-102-0252 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	13.837	38 287	529 777
19	19	6121-0801-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13.7	6 404	87 735
20	20	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	36 591	36 591
21	21	6121-0201-0829 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0.0137	7 240 629	99 197
			Итого по подразделу: Футляр Д-426х8,0 L-13,7 м (1 шт)				**856 994**
			Подраздел: Футляр Д-325х8,0 L-30 м (2 шт)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0.03	5 770 567	173 117
23	23	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	30.3	27 105	821 282
24	24	6121-0801-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	6 404	192 120
25	25	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	29 272	58 544
26	26	6121-0201-0846 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0.03	7 056 578	211 697
			Итого по подразделу: Футляр Д-325х8,0 L-30 м (2 шт)				**1 456 760**
			Подраздел: _____				
27	27	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 479	18 958
28	28	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	106 393	212 786
29	29	6121-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 125 мм	шт.	2	12 360	24 720
30	30	242-101-1206 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	2	150 530	301 060
31	31	6121-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	1	13 815	13 815
32	32	242-101-1207 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	175 748	175 748
33	33	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864	9 728
34	34	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	6	6 642	39 852
35	35	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	8 178	65 424

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	5 139	30 834
37	37	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	7 500	60 000
38	38	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	8 469	101 628
39	39	241-415-0208 РСНБ РК 2022	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	2	5 763	11 526
40	40	241-415-0210 РСНБ РК 2022	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 140 мм	шт.	4	15 041	60 164
41	41	241-415-0211 РСНБ РК 2022	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 160 мм	шт.	6	10 362	62 172
42	42	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751	3 502
43	43	241-214-0110 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	4	3 427	13 708
44	44	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	4 000	24 000
45	45	241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	3 239	6 478
46	46	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных фундаментов-столбов /упор/	м3	0.412	33 515	13 808
47	47	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.42024	21 908	9 207
			Итого по подразделу: _____				**1 259 118**
			Подраздел: Пожарный гидрант				
48	48	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	12 601	25 202
49	49	244-404-0208 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	2	480 527	961 054

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	241-515-0203 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	2	187 216	374 432
			Итого по подразделу: Пожарный гидрант				**1 360 688**
			Подраздел: Спейсер				
51	51	241-229-0405 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 114 мм	шт.	15	8 121	121 815
52	52	241-229-0406 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	7	10 559	73 913
			Итого по подразделу: Спейсер				**195 728**
			Подраздел: Изоляция фасонный частей				
53	53	6111-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м2	3.3	367	1 211
54	54	6111-0501-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-759	м2	3.3	137	452
55	55	236-203-0206 РСНБ РК 2022	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0.000627	1 325 601	831
56	56	248-201-0205 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный шаровый1428-XR/ID	шт.	13	23 946	311 298
			Итого по подразделу: Изоляция фасонный частей				**313 792**
			Подраздел: Указатель пожарных гидрантов				
57	57	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	7	6 281	43 967
58	58	251-201-0702 РСНБ РК 2022	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм	шт.	7	10 466	73 262
			Итого по подразделу: Указатель пожарных гидрантов				**117 229**
			Подраздел: Дополнительные работы				
59	59	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0.24462	280 513	68 619
60	60	6121-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0.1535	345 056	52 966
61	61	6121-0601-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	41 447	82 894

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Дополнительные работы				**204 479**
			Подраздел: Р Колодцы Д=2000мм (1 шт), Д=1500мм (4 шт) (НС.АС-6)				
62	62	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	10.8	131 419	1 419 325
63	63	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	27 442	109 768
64	64	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	55 410	55 410
65	65	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	31 711	253 688
66	66	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	28 823	115 292
67	67	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	36 298	72 596
68	68	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	41 405	41 405
69	69	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 /+3ПП15/	шт.	4	36 482	145 928
70	70	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 /+2ПП20-1/	шт.	1	38 217	38 217
71	71	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4 574	22 870
72	72	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	8 468	50 808
73	73	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	2	108 412	216 824
74	74	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стен приямков и каналов	м3	0.119	36 427	4 335
75	75	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.02856	19 226	549

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.0476	84 824	4 038
77	77	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.1015	1 146 761	116 396
78	78	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	5	63 066	315 330
			Итого по подразделу: Р Колодцы Д=2000мм (1 шт), Д=1500мм (4 шт) (НС.АС-6)				**2 982 779**
			Подраздел: Изоляция колодцев (примечание НВК.АС-6)				
79	79	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	77.46	5 426	420 298
80	80	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	86.7552	322	27 935
81	81	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	77.46	6 129	474 752
82	82	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	173.5104	322	55 870
			Итого по подразделу: Изоляция колодцев (примечание НВК.АС-6)				**978 855**
			Подраздел: Гидротекс				
83	83	6111-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	35.8	3 356	120 145
84	84	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	42.96	2 185	93 868
85	85	6104-0802-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	75.36	442	33 309
86	86	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	90.432	1 571	142 069
			Итого по подразделу: Гидротекс				**389 391**
			Подраздел: Отмостка (НВК.АС-5)				
87	87	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания из щебня	м3	1.41	14 320	20 191
88	88	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.8753	3 232	6 061

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	89	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м2	9.4	1 021	9 597
90	90	212-501-0304 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	0.67116	19 487	13 079
			Итого по подразделу: Отмостка (НВК.АС-5)				**48 928**
			Итого по разделу: Наружный водопровод В1				**18 472 191**
			Раздел: Наружная канализация				
			Подраздел: Р Земляные работы				
91	91	6101-0101-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3670.1	546	2 003 875
92	92	6101-0201-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	62.1	15 392	955 843
93	93	6101-0201-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	86.9	14 751	1 281 862
94	94	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы /песком/	м3	285.5	3 784	1 080 332
95	95	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	285.5	4 416	1 260 768
96	96	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3471.5	98	340 207
97	97	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1041.45	656	683 191
			Итого по подразделу: Р Земляные работы				**7 606 078**
			Подраздел: Лишний грунт учтен в вертикальной планировке				
98	98	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	62.1	10 283	638 574
			Итого по подразделу: Лишний грунт учтен в вертикальной планировке				**638 574**
			Подраздел: Р Трубопроводы и арматура				
99	99	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	308	513	158 004
100	100	241-204-2107 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	314.16	5 400	1 696 464

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	101	241-229-0202 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150	шт.	52	617	32 084
102	102	6122-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	256.4	620	158 968
103	103	241-204-2109 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 209 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	261.528	7 699	2 013 504
104	104	241-229-0203 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200	шт.	43	1 184	50 912
			Итого по подразделу: Р Трубопроводы и арматура				**4 109 936**
			Подраздел: Перепадный колодец				
105	105	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.136974	3 884 297	532 048
106	106	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	3.9	8 607	33 567
107	107	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /+ колено сварное /	м	1.5	8 607	12 910
108	108	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.015	335 421	5 031
109	109	1122-0601-0906 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0054	3 946 894	21 313
			Итого по подразделу: Перепадный колодец				**604 869**
			Подраздел: Р Колодцы Д=1500 (24 шт), Д=1000 (2 шт)				
110	110	6122-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3.64	147 919	538 425
111	111	6122-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	54.635	111 716	6 103 604
112	112	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15 560	31 120
113	113	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	24	27 442	658 608

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	114	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	17 605	35 210
115	115	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	19	31 711	602 509
116	116	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	21	28 823	605 283
117	117	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	24	36 482	875 568
118	118	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	15 037	30 074
119	119	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	26	4 574	118 924
120	120	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	42	8 468	355 656
121	121	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	16	108 412	1 734 592
122	122	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0.51	36 427	18 578
123	123	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.1224	19 226	2 353
124	124	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.204	84 824	17 304
125	125	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.314	1 146 761	360 083
126	126	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	26	40 352	1 049 152
			Итого по подразделу: Р Колодцы Д=1500 (24 шт), Д=1000 (2 шт)				**13 137 043**
			Подраздел: Отмостка (НВК.АС-5)				
127	127	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания из щебня	м3	7.332	14 320	104 994

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	128	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9.75156	3 232	31 517
129	129	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м2	48.88	1 021	49 906
130	130	212-501-0304 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	3.490032	19 487	68 010
			Итого по подразделу: Отмостка (НВК.АС-5)				**254 427**
			Подраздел: Изоляция колодцев (примечание НВК.АС-6)				
131	131	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	169	5 426	916 994
132	132	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	189.28	322	60 948
133	133	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	169	6 129	1 035 801
134	134	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	378.56	322	121 896
			Итого по подразделу: Изоляция колодцев (примечание НВК.АС-6)				**2 135 639**
			Подраздел: Гидротекс				
135	135	6111-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	150.8	3 356	506 085
136	136	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	180.96	2 185	395 398
137	137	6104-0802-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	199.4	442	88 135
138	138	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	239.28	1 571	375 909
			Итого по подразделу: Гидротекс				**1 365 527**
			Подраздел: Дополнительные работы				
139	139	6121-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 150 мм	км	0.308	139 145	42 857
140	140	6121-0301-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0.2564	145 315	37 259

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	141	248-201-0205 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°C до 50°C, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный шаровый1428-XR/ID	шт.	16	23 946	383 136
142	142	6122-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	102 437	102 437
			Итого по подразделу: Дополнительные работы				**565 689**
			Подраздел: Пересечение с инж.коммуникациями (ПОС)				
143	143	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2	м	35.2	13 741	483 683
144	144	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.302368	388 107	117 351
			Итого по подразделу: Пересечение с инж.коммуникациями (ПОС)				**601 034**
			Подраздел: Жироуловитель				
145	145	6122-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка жироуловителя вертикального	шт.	1	35 512	35 512
146	146	244-501-0318 РСНБ РК 2022	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 18 л/с	шт.	1	1 974 501	1 974 501
			Итого по подразделу: Жироуловитель				**2 010 013**
			Итого по разделу: Наружная канализация				**33 028 829**
			Раздел: Канализация К2 (Ливневая канализация)				
			Подраздел: Земляные работы (ПОС)				
147	147	6101-0101-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1228.48	546	670 750
148	148	6101-0201-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	32.5	15 392	500 240
149	149	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	32.5	10 283	334 198
150	150	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	м3	162.5	4 156	675 350
151	151	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1098.48	98	107 651
152	152	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	329.544	656	216 181

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Земляные работы (ПОС)				**2 504 370**
			Подраздел: Трубопровод				
153	153	6122-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	189	620	117 180
154	154	241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	180.744	5 261	950 894
155	155	241-204-2008 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 195 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	12.036	5 500	66 198
156	156	248-201-0205 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°C до 50°C, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный шаровый1428-XR/ID	шт.	10	23 946	239 460
			Итого по подразделу: Трубопровод				**1 373 732**
			Подраздел: Колодцы				
157	157	6122-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона, диаметр 1 м в мокрых грунтах	м3	5.33	130 359	694 813
158	158	244-202-0303 РСНБ РК 2022	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	3	35 324	105 972
159	159	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	15 560	46 680
160	160	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	17 605	52 815
161	161	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	22 052	110 260
162	162	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	15 037	45 111
163	163	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4 574	13 722
164	164	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	13 158	52 632
165	165	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	3	108 412	325 236

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
166	166	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0.051	36 427	1 858
167	167	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.01224	19 226	235
168	168	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.0204	84 824	1 730
169	169	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.0609	1 146 761	69 838
			Итого по подразделу: Колодцы				**1 520 902**
			Подраздел: Отмостка (НВК.АС-1)				
170	170	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания из щебня	м3	0.846	14 320	12 115
171	171	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.12518	3 232	3 637
172	172	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м2	5.64	1 021	5 758
173	173	212-501-0304 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	0.402696	19 487	7 847
			Итого по подразделу: Отмостка (НВК.АС-1)				**29 357**
			Подраздел: Изоляция колодцев (примечание НВК.АС-2, ПОС)				
174	174	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17.4	5 426	94 412
175	175	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	19.488	322	6 275
176	176	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	17.4	6 129	106 645
177	177	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	38.976	322	12 550
			Итого по подразделу: Изоляция колодцев (примечание НВК.АС-2, ПОС)				**219 882**
			Подраздел: Гидротекс				
178	178	6111-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	14.1	3 356	47 320

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
179	179	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	16.92	2 185	36 970
180	180	6104-0802-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	25	442	11 050
181	181	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	30	1 571	47 130
			Итого по подразделу: Гидротекс				**142 470**
			Подраздел: _Лотки_____				
182	182	7101-0301-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	156	13 675	2 133 300
183	183	244-601-0114 РСНБ РК 2022	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП щелевой, класс нагрузки D	комплект	122	43 043	5 251 246
184	184	244-601-0118 РСНБ РК 2022	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП щелевой, класс нагрузки D	комплект	32	51 077	1 634 464
185	185	244-602-0505 РСНБ РК 2022	Пескоуловитель пластиковые сборные серии PolyMax Basic ПУС-20.26.60-ПП с решеткой чугунной щелевой, класс нагрузки D	комплект	2	40 359	80 718
186	186	244-602-0105 РСНБ РК 2022	Заглушка торцевой полимербетонный лоток ЗЛВ-15.21.21-П-П 6721-5D	шт.	2	4 545	9 090
187	187	244-602-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка торцевой полимербетонный лоток ЗЛВ-20.26.21-П-П 6751-4D	шт.	2	5 868	11 736
			Итого по подразделу: _Лотки_____				**9 120 554**
			Подраздел: Р Резервуар				
188	188	1337-0101-0301 РСНБ РК 2022	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м3. Монтаж	шт.	1	72 351	72 351
189	189	244-204-0523 СпрСЦ 03.2024	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 2800, длина 16780, объем 100 м3	шт.	1	19 636 105	19 636 105
190	190	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	10	97 701	977 010
191	191	234-201-0307 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	м3	10.8	51 061	551 459
			Итого по подразделу: Р Резервуар				**21 236 925**
			Подраздел: Строительные работы резервуара				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
192	192	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	7.4	9 546	70 640
193	193	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8.51	3 232	27 504
194	194	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	37.8	14 521	548 894
195	195	212-101-0314 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	38.367	22 618	867 785
196	196	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.19964	336 177	403 291
197	197	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05934	344 590	20 448
198	198	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.31968	1 131 351	361 670
199	199	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы /песком/	м3	19.8	3 784	74 923
200	200	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	21.78	4 416	96 180
201	201	261-102-0264 РСНБ РК 2022	Канат стальной светлый, из проволоки марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, диаметром 17 мм ГОСТ 3241-91 /+ ремень стяжной/	10 м	32	8 505	272 160
			Итого по подразделу: Строительные работы резервуара				**2 743 495**
			Итого по разделу: Канализация К2 (Ливневая канализация)				**38 891 687**
			Итого по локальной смете: Наружные сети водопровода и канализации				**90 392 707**
			ИТОГО по акту:				**90 392 707**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	90392707.000 x 7.30%	6 598 668
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	90392707.000 + 6598667.783	96 991 375
	Сметная прибыль, (5.00%)	96991374.783 x 5.00%	4 849 569
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	96991374.783 x 5.000%	4 849 569
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		106 690 512
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2-2024 год 4 квартал , к = 1.0750	106690512.262 x 1.0750	114 692 301
	НДС (12%)	114692300.681 x 12%	13 763 076

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС				114692300.681 + 13763076.082	128 455 377

Лист согласования
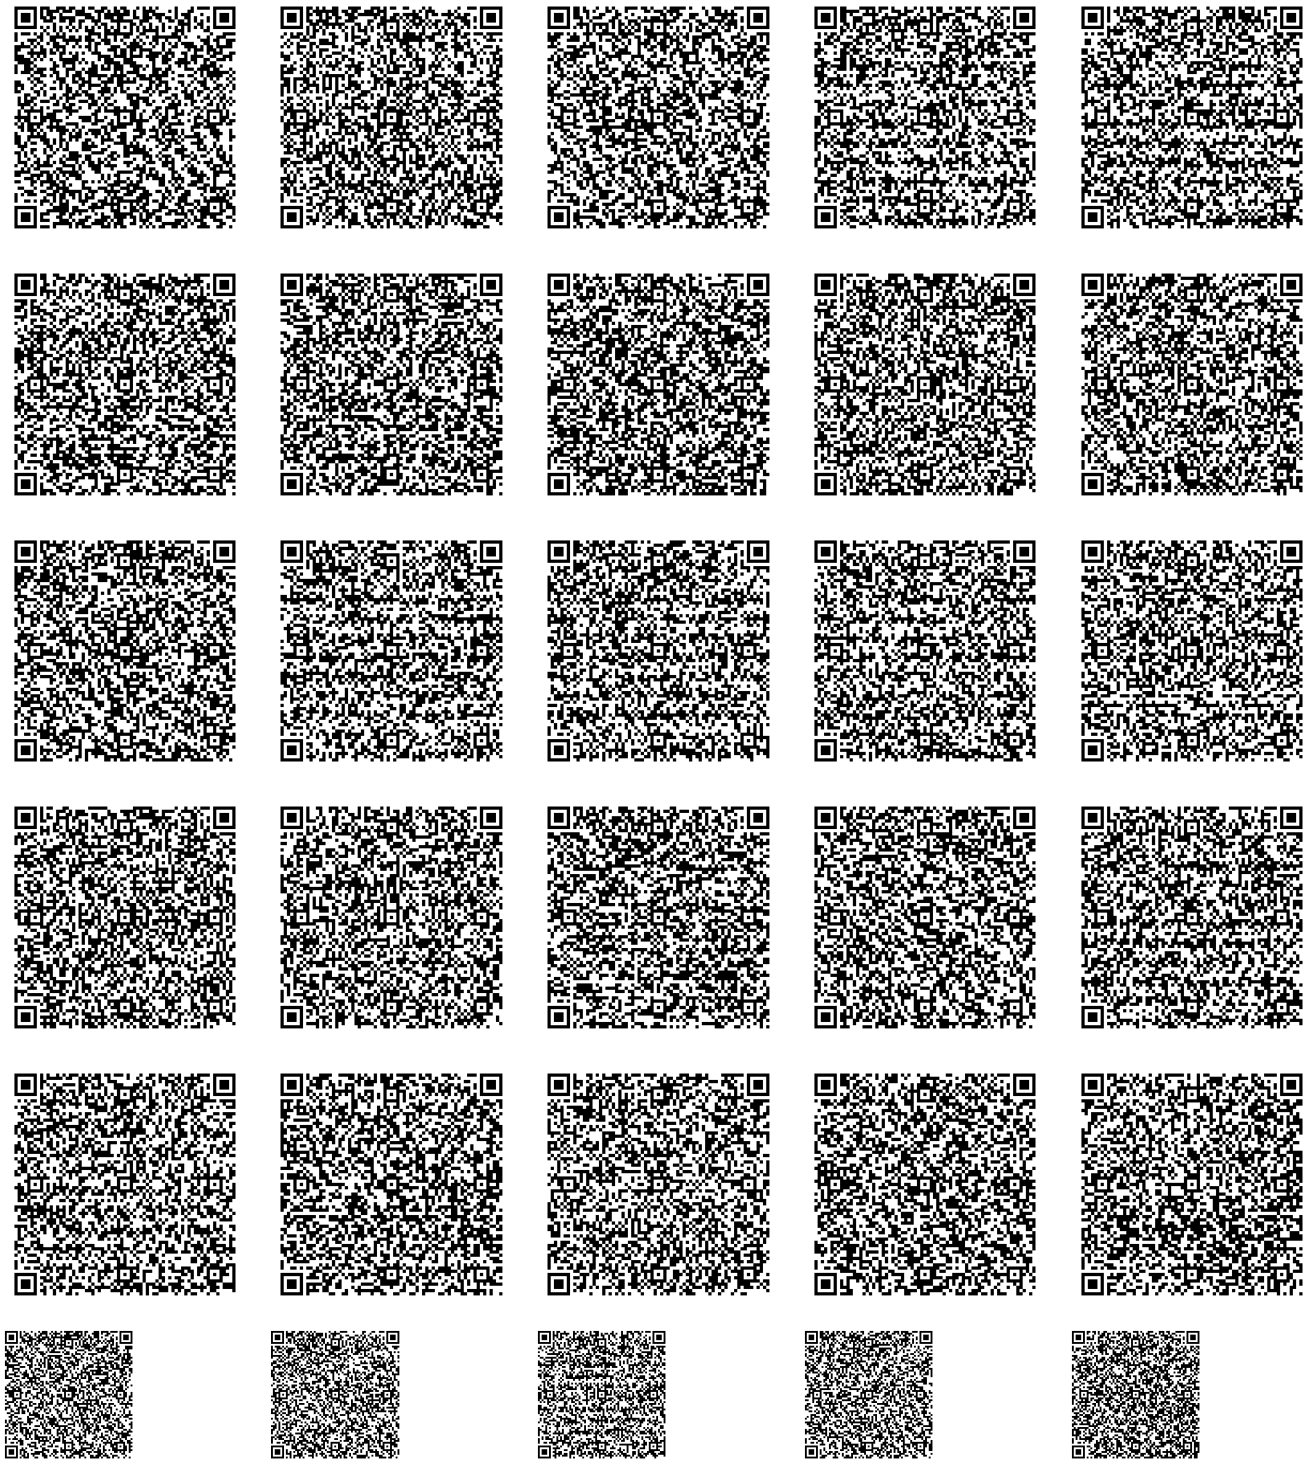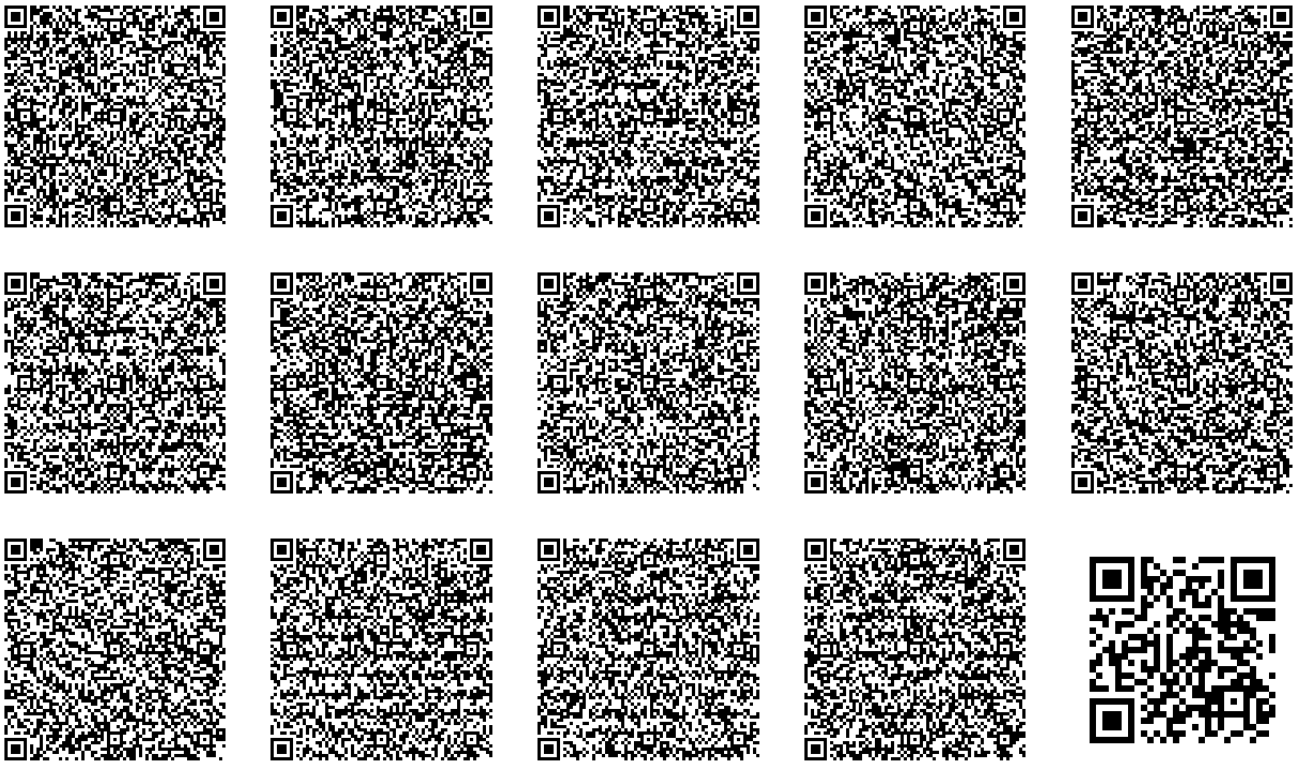
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	17.04.2025 11:49
Представители технического надзора		
871006350537 - ЖАНГУЖИН САЯН АМАНЖОЛОВИЧ	технический надзор	17.04.2025 12:52
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	17.04.2025 11:53
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	25.04.2025 08:23
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	24.04.2025 19:21 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	22.04.2025 20:09
