Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система контроля и управления доступом. Охранная сигнализация				
			Раздел: СКУД				
1	1	6125-0601-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования приемно-контрольного объектового на 2 луча	шт.	61	107 864	6 579 704
2	2	248-405-0137СпрСЦ 03.2024	DS-K2601T, контроллер доступа	шт.	50	192 938	9 646 900
3	3	248-405-0138СпрСЦ 03.2024	DS-K2602T, контроллер доступа	шт.	6	212 426	1 274 556
4	4	248-405-0139СпрСЦ 03.2024	DS-K2604T, контроллер доступа	шт.	5	265 042	1 325 210
5	5	6124-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	61	12 990	792 390
6	6	248-306-0376СпрСЦ 03.2024	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	61	15 941	972 401
7	7	6125-0601-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	85	5 625	478 125
8	8	ЕСЦ РСНБ РК 2023	СМК-Магнитоконтактный датчик DS-PD1-MC-MS	шт	85	2 808	238 709
9	9	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	69	7 150	493 350
10	10	248-405-0530СпрСЦ 03.2024	DS-K7PEB, тревожная кнопка выхода	шт.	69	17 562	1 211 778
11	11	6125-0801-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	комплект	123	4 140	509 220

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	248-405-0369СпрСЦ 03.2024	DS-K1102AM, считыватель карт Mifare1/EM	шт.	95	36 215	3 440 425
13	13	248-405-0368СпрСЦ 03.2024	DS-K1104M, считыватель карт Mifare1/EM	шт.	28	56 515	1 582 420
14	14	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	21	7 150	150 150
15	15	248-405-0526СпрСЦ 03.2024	DS-K7P01, кнопка выхода "EXIT"	шт.	21	17 580	369 180
16	16	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	64	7 150	457 600
17	17	248-401-0307СпрСЦ 03.2024	Замок электромагнитный DS-K4H250S, типа Hikvision	шт.	64	29 509	1 888 576
18	18	248-405-0527СпрСЦ 03.2024	DS-K4H250-LZ, LZ-образное крепление для магнитного замка DS-K4H250S/D	шт.	64	29 288	1 874 432
19	19	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	64	5 885	376 640
20	20	248-405-0528СпрСЦ 03.2024	DS-K4DC104, доводчик для ворот весом 60~85 кг, шириной <± 1100 мм, прочность закрытия: EN4, угол открытия <±180°"	шт.	64	29 292	1 874 688
21	21	248-405-0407РСНБ РК 2022	FM11RF08-M1, бесконтактная смарт-карта Mifare1	шт.	210	448	94 080
22	22	6125-0705-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Программирование и отладка его работы элементов сетевых(мультиплексор, регенератор)	шт.	65	149 918	9 744 670
23	23	ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПО СКУД HikCentral-P-ACS-Base/16Door	шт	1	316 607	316 607
24	24	ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПО СКУД HikCentral-P-ACS-1Door	шт	64	24 988	1 599 257
25	25	6125-0801-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж турникета -трипода напольного	шт.	14	17 021	238 294
26	26	248-405-0824РСНБ РК 2022	Турникет-трипод PERCo-TTR-04.1G	шт.	12	610 029	7 320 348
27	27	РСНБ РК 2022	Калитка полуавтоматическая со створкой ASG-900 WHD-05	шт	2	543 607	1 087 214
28	28	6125-1101-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж пульта, рабочего места масса до 0,3 т	шт.	1	101 053	101 053
29	29	521-101-0401005 СпрСЦ 03.2024	Системный блок HP Pavilion Gaming TG01-2087ur (60Q91EA), AMD Ryzen 5 5600G-3.9GHz/16Gb/512GbSSD/RX6600XT,8Gb/DOS	шт.	1	598 125	598 125

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	521-101-0401009 СпрСЦ 03.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9 031
31	31	521-101-0411004 СпрСЦ 03.2024	Монитор 27" Dell S2722DGM, Black, VA, 2560x1440x165Hz, 350кд/м2,3000:1, H/V:178, 2ms, 2xHDMI,DP	шт.	1	177 589	177 589
32	32	6125-0202-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	66 810	66 810
33	33	521-101-0401026 СпрСЦ 03.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53 563
34	34	6125-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	4	37 751	151 004
35	35	248-404-0702СпрСЦ 03.2024	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI	шт.	4	272 915	1 091 660
36	36	6125-0702-1213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий	шт.	4	304	1 216
37	37	248-102-2503СпрСЦ 03.2024	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	4	3 997	15 988
38	38	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	4	4 748	18 992
39	39	248-102-3701СпрСЦ 03.2024	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)	шт.	4	17 210	68 840
40	40	6125-0706-0603 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж разъемов	шт.	64	1 091	69 824
41	41	243-906-2702СпрСЦ 03.2024	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	64	1 775	113 600
42	42	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	4	4 748	18 992
43	43	248-404-1601РСНБ РК 2022	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный	шт.	4	43 372	173 488
			Подраздел: Кабель				
44	44	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	6570	859	5 643 630
45	45	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	6635.7	54	358 328
46	46	243-304-0137СпрСЦ 03.2024	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	4799.8	485	2 327 903

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	243-107-2301РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1 (ок)-0,66	м	1967.3	241	474 119
48	48	6125-0706-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка (разделка) конца кабеля (ВОК-1) к процессу сварки кабеля волоконно-оптического предконечного абонентского	шт.	2	156	312
49	49	6125-0706-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель волоконно-оптическокий распределительный, оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами Монтаж ВОК в ОРШ	шт.	2	38 594	77 188
50	50	6125-0706-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях на первой длине волны оптической абонентской линии	шт.	2	11 817	23 634
51	51	243-503-0303СпрСЦ 03.2024	Кабель волоконно-оптический для внутренней и внешней прокладки типа Hyperline 9/125 (SMF-28 Ultra), одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка HFLTx	м	112.2	2 152	241 454
			Итого по подразделу: Кабель				**9 146 568**
			Итого по разделу: СКУД				**67 813 267**
			Раздел: Охранная сигнализация				
			Подраздел: Тревожная кнопка				
52	69	6124-0103-2102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6	шт.	4	7 150	28 600
53	70	248-303-1002СпрСЦ 03.2024	IDC Мектеп, тревожная кнопка	шт.	3	632 510	1 897 530
54	71	248-303-1003СпрСЦ 03.2024	IDC SOWA MINI, тревожная кнопка	шт.	1	406 612	406 612
			Итого по подразделу: Тревожная кнопка				**2 332 742**
			Итого по разделу: Охранная сигнализация				**2 332 742**
			Итого по локальной смете: Система контроля и управления доступом. Охранная сигнализация				**70 146 009**
			ИТОГО по акту:				**70 146 009**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.300%)	66065914.000 x 7.30%	4 822 812
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	70146009.000 + 4822811.848	74 968 821
	Сметная прибыль, (5.00%)	70888725.848 x 5.00%	3 544 436
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	74968820.848 x 5.000%	3 748 441
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		82 261 698
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал , к = 1.0750	82261698.183 x 1.0750	88 431 326
	НДС (12%)	88431325.547 x 12%	10 611 759
	Итого с НДС	88431325.547 + 10611759.066	99 043 085

Лист согласования
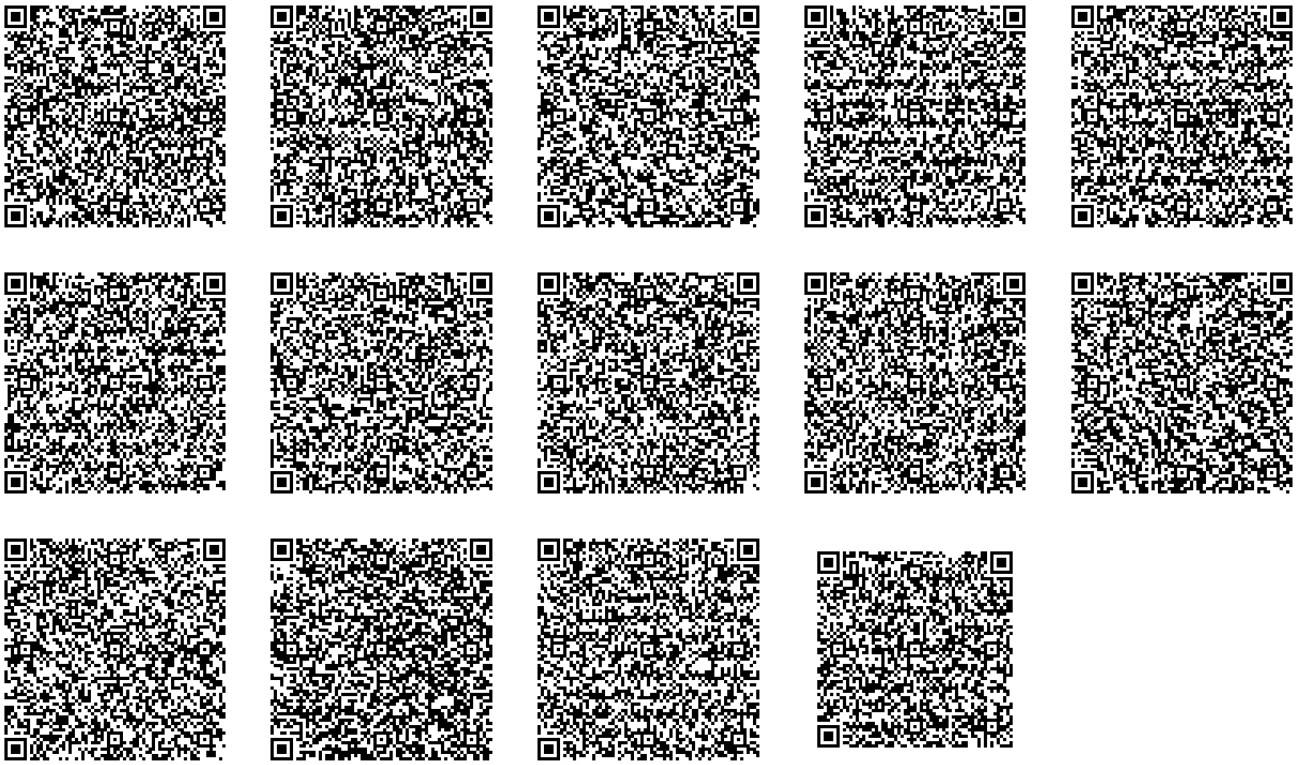
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	24.04.2025 16:01
Представители технического надзора		
871006350537 - ЖАНГУЖИН САЯН АМАНЖОЛОВИЧ	технический надзор	24.04.2025 16:52
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	24.04.2025 16:30
Представители заказчика		
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	25.04.2025 19:56 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	28.04.2025 10:43
901101350591 - ШАХМАНОВ АЗАТ КАНАТОВИЧ	Ведущий специалист	24.04.2025 17:44
