Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Вертикальная планировка				
1	1	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8042.3	97	780 103
2	2	6101-0104-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8042.3	84	675 553
3	3	6101-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8042.3	435	3 498 400
4	4	412-102-0215РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (растительный грунт на вывоз)	т·км	121483.26	34	4 130 431
5	5	412-102-0101РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (растительный грунт на хранение)	т·км	1551.876	276	428 318
6	6	6101-0104-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м ульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м3	6414.48	165	1 058 389
7	7	6101-0104-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0103	м3	6414.48	125	801 810
8	8	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	15980.25	525	8 389 631
9	9	412-102-0215РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	407496.375	34	13 854 877
10	10	6101-0104-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м ульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м3	15980.25	165	2 636 741

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	6101-0104-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0103	м3	15980.25	125	1 997 531
12	12	6101-0107-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	15980.25	182	2 908 406
			Итого по локальной смете: Вертикальная планировка				**41 160 190**
			ИТОГО по акту:				**41 160 190**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.300%)	41160190.000 x 7.30%	3 004 694
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	41160190.000 + 3004693.949	44 164 884
	Сметная прибыль, (5.00%)	44164883.949 x 5.00%	2 208 244
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	44164883.949 x 5.000%	2 208 244
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		48 581 372
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал , к = 1.0750	48581372.343 x 1.0750	52 224 975
	НДС (12%)	52224975.269 x 12%	6 266 997
	Итого с НДС	52224975.269 + 6266997.032	58 491 972

Лист согласования
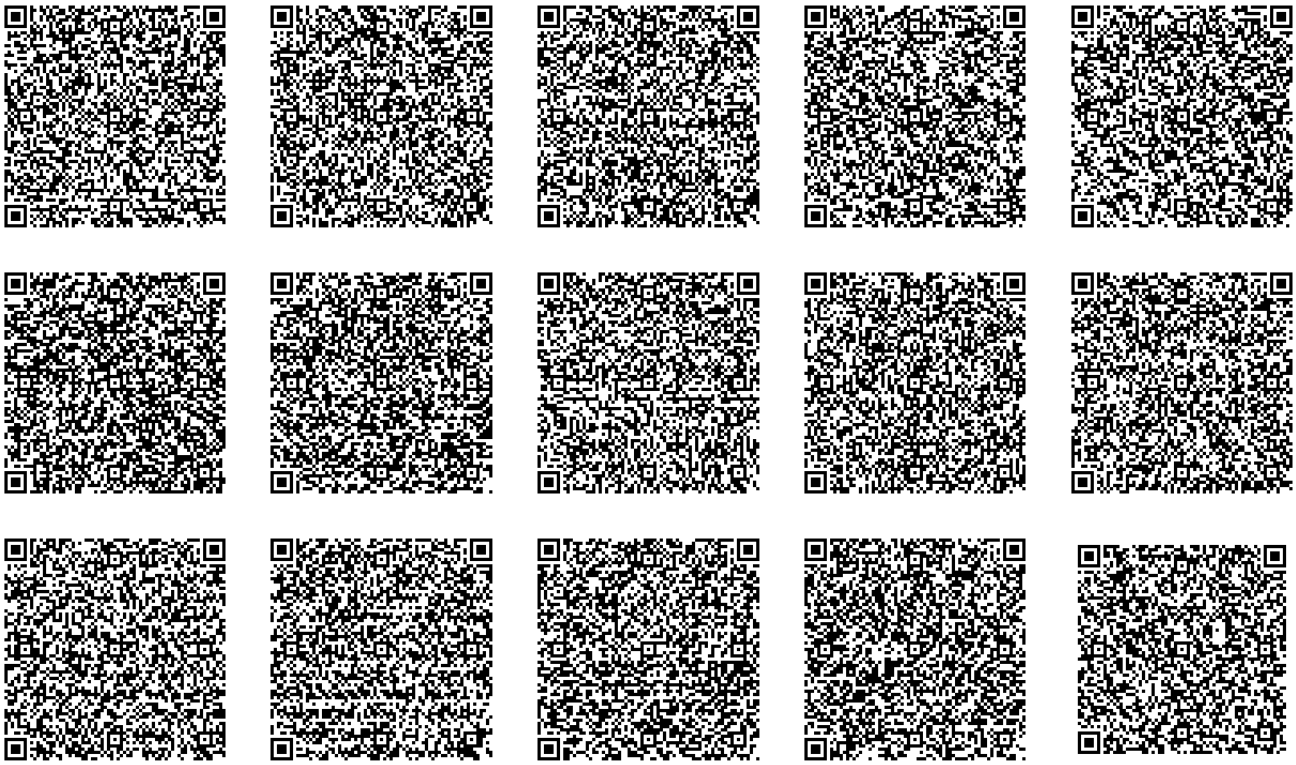
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	28.04.2025 11:57
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	28.04.2025 15:28
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	28.04.2025 12:04
Представители заказчика		
901101350591 - ШАХМАНОВ АЗАТ КАНАТОВИЧ	Ведущий специалист	28.04.2025 19:22
870910303001 - ТАЛДЫБАЕВ АБАЙ ТОРЕКУЛОВИЧ	Ведущий специалист (сметчик)	29.04.2025 12:15 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	29.04.2025 15:13
