Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Лифт				
1	1	1303-0501-0114 РСНБ РК 2022	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	4 011 845	4 011 845
2	2	1303-0501-0115 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	9	-190 527	-1 714 743
3	3	1303-0501-0116 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	30.8	-39 709	-1 223 037
4	4	516-102-0409 РСНБ РК 2022	Лифт грузовой, грузоподъемность 1150 кг, количество остановок 3, скорость подъема 1 м/с, огнестойкость дверей EI-30, система АРД (аварийной эвакуации), отделка кабины и дверей нержавеющая сталь, с диспетчерской связью	комплект	1	11 121 753	11 121 753
5	5	1303-0501-0401 РСНБ РК 2022	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования	лифт	1	3 276 844	3 276 844
6	6	1303-0501-0406 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку более или менее 6	остановка	4	-183 734	-734 936
7	7	1303-0501-0411 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500, 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м	м	17.15	-49 246	-844 569
8	8	РСНБ РК 2022	Лифт на 2 остановки грузоподъемностью 200 кг, скоростью 0,4 м/сек, размер кабины 700x1200x900, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь	комплект	1	4 208 571	4 208 571
			Итого по локальной смете: Лифт				**18 101 728**
			ИТОГО по акту:				**18 101 728**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				2771404.000 x 7.30%	202 312
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				18101728.000 +	18 304 040

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						202312.497	
			Сметная прибыль, (5.00%)			2973716.497 x 5.00%	148 686
			Непредвиденные расходы, (5.000%)			18304040.497 x 5.000%	915 202
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				19 367 928
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал , к = 1.0750			19367928.347 x 1.0750	20 820 523
			НДС (12%)			20820522.973 x 12%	2 498 463
			Итого с НДС			20820522.973 + 2498462.757	23 318 986

Лист согласования
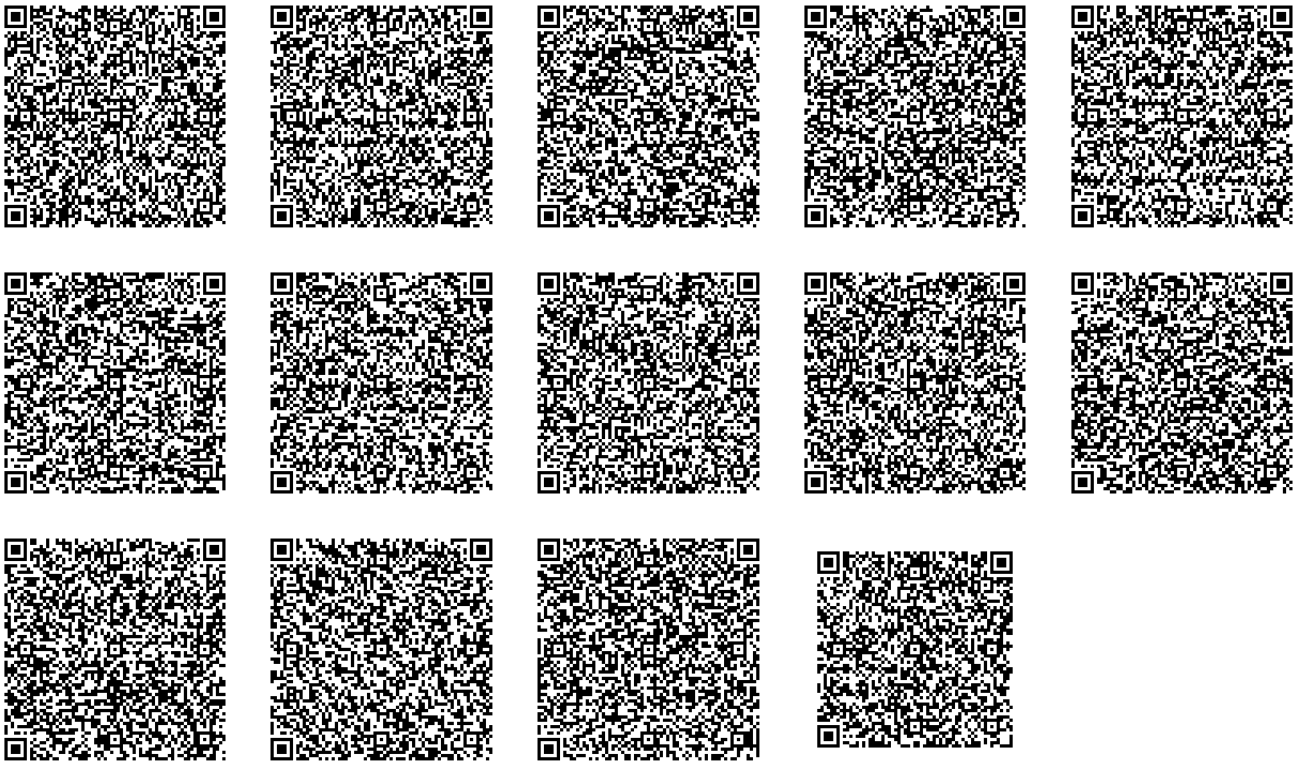
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	28.04.2025 17:10
Представители технического надзора		
871006350537 - ЖАНГУЖИН САЯН АМАНЖОЛОВИЧ	технический надзор	28.04.2025 17:51
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	28.04.2025 17:11
Представители заказчика		
870910303001 - ТАЛДЫБАЕВ АБАЙ ТОРЕКУЛОВИЧ	Ведущий специалист (сметчик)	29.04.2025 12:19 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	29.04.2025 15:02
901101350591 - ШАХМАНОВ АЗАТ КАНАТОВИЧ	Ведущий специалист	28.04.2025 19:31
