Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отделочные работы				
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Доска подоконная				
1	11	6108-0105-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	39.67	5 994	237 782
2	12	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	39.67	2 347	93 105
			Итого по подразделу: Доска подоконная				**330 887**
			Подраздел: Двери алюминиевые противопожарные ДПД				
3	35	6108-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2	м2	0.4	7 052	2 821
4	36	223-205-1902 СпрСЦ 03.2024	Блок дверной из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный с фурнитурой EIWS 60 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	м2	0.4	348 106	139 242
			Итого по подразделу: Двери алюминиевые противопожарные ДПД				**142 063**
			Итого по разделу: Проемы				**472 951**
			Раздел: Внутренняя отделка (АР63-67)				
			Подраздел: Плинтус				
5	128	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	237.47	394	93 563

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	129	233-204-0105 РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	239.8447	1 833	439 635
			Итого по подразделу: Плинтус				**533 198**
			Подраздел: Низ стен и перегородок. 2 этаж				
7	167	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	21.55	1 334	28 748
8	168	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	29.6097	76	2 250
			Итого по подразделу: Низ стен и перегородок. 2 этаж				**30 998**
			Подраздел: Плинтус				
9	173	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	58.14	394	22 907
10	174	233-204-0105 РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	58.7214	1 833	107 636
			Итого по подразделу: Плинтус				**130 543**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка (АР63-67)				**694 739**
			Раздел: Полы (АР-60)				
			Подраздел: Тип 5 S=9,07 м2				
11	269	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9.07	1 590	14 421
12	270	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.185028	25 241	4 670
			Итого по подразделу: Тип 5 S=9,07 м2				**19 091**
			Подраздел: Тип 16, тип 17 S=97,02+21,46 м2				
13	385	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	118.48	1 590	188 383
14	386	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.416992	25 241	61 007
			Итого по подразделу: Тип 16, тип 17 S=97,02+21,46 м2				**249 390**
			Подраздел: Тип 26 S=37,27 м2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	482	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	37.27	7 473	278 519
16	483	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	38.0154	3 083	117 201
			Итого по подразделу: Тип 26 S=37,27 м2				**395 720**
			Подраздел: Р Сцена актового зала (АР-78)				
17	573	6107-0205-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	35	797	27 895
18	574	261-102-0380 РСНБ РК 2022	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	35	355	12 425
19	575	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601	1 202
20	576	223-502-0305 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	1	5 469	5 469
21	577	6109-0201-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки из плит древесноволокнистых	м2	54.98	342	18 803
22	578	215-301-0307 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм	м2	112.1592	7 507	841 979
23	579	6109-0307-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных клеевым способом	м2	54.98	4 908	269 842
24	580	233-201-1005 СпрСЦ 03.2024	Система спортивного паркета трехслойная, общая толщина 28 мм типа GRABO SmartFit	м2	54.98	50 967	2 802 166
			Итого по подразделу: Р Сцена актового зала (АР-78)				**3 979 781**
			Итого по разделу: Полы (АР-60)				**4 643 982**
			Раздел: Прочие конструкции				
			Подраздел: Р Подпольные каналы (АР-10)				
25	581	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	14.73	64 954	956 772

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	582	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14.95095	23 682	354 068
27	583	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.27502	382 476	105 189
			Итого по подразделу: Р Подпольные каналы (АР-10)				**1 416 029**
			Подраздел: Р Подпольные каналы (АР-12)				
28	584	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	7.89	64 954	512 487
29	585	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8.00835	23 682	189 654
30	586	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.14722	382 476	56 308
			Итого по подразделу: Р Подпольные каналы (АР-12)				**758 449**
			Подраздел: Р Отделка фасада- цоколь (АР-32)				
31	587	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 до 4	м2	327.65	28 540	9 351 131
32	588	231-201-0203 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	м2	327.65	21 148	6 929 142
			Итого по подразделу: Р Отделка фасада- цоколь (АР-32)				**16 280 273**
			Подраздел: Р Отмостка S=554,32 м2 (АР-89, ГП-1)				
33	589	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	55.432	19 733	1 093 840
34	590	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	76.49616	3 232	247 236
35	591	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	554.32	5 426	3 007 740
36	592	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.1142343	521 019	59 518

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	593	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	55.432	23 048	1 277 597
38	594	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	56.54064	23 682	1 338 995
39	595	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1.0199488	68 239	69 600
40	596	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.0199488	382 476	390 106
			Итого по подразделу: Р Отмостка S=554,32 м2 (АР-89, ГП-1)				**7 484 632**
			Подраздел: Крыльцо Кр-1, (АР-96)				
41	632	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	13.93	9 546	132 976
42	633	211-201-0102 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	16.0195	4 689	75 115
43	634	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	10.1	14 521	146 662
44	635	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	16.8	31 048	521 606
45	636	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	27.3035	24 252	662 164
46	637	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.6761192	326 417	547 114
47	638	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1.6761192	91 769	153 816
48	639	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	63.3	6 687	423 287

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	640	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	63.3	18 095	1 145 414
50	641	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 до 4	м2	29.63	28 540	845 640
51	642	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	29.63	13 429	397 901
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-1, (АР-96)				**5 051 695**
			Подраздел: Система грязезащиты				
52	643	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.1992	1 454 028	289 642
			Итого по подразделу: Система грязезащиты				**289 642**
			Подраздел: Крыльцо Кр-2 - 1 шт., Кр-3 - 1 шт., Кр-4 - 1 шт., (АР-97)				
53	644	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	6.3	9 546	60 140
54	645	211-201-0102 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	7.245	4 689	33 972
55	646	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	4.8	14 521	69 701
56	647	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	12.05	31 048	374 128
57	648	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	17.10275	24 252	414 776
58	649	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.05225	326 417	343 472
59	650	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1.05225	91 769	96 564
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-2 - 1 шт., Кр-3 - 1 шт., Кр-4 - 1 шт., (АР-97)				**1 392 753**
			Подраздел: Крыльцо Кр-5 - 1 шт., Кр-6 - 1 шт., Кр-7 - 1 шт., (АР-98)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	656	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2.35	9 546	22 433
61	657	211-201-0102 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	2.7025	4 689	12 672
62	658	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1.75	14 521	25 412
63	659	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	4.46	31 048	138 474
64	660	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6.30315	24 252	152 864
65	661	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.38689	326 417	126 287
66	662	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.38689	91 769	35 505
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-5 - 1 шт., Кр-6 - 1 шт., Кр-7 - 1 шт., (АР-98)				**513 647**
			Подраздел: Крыльцо Кр-8 - 1 шт., Кр-9 - 1 шт., Кр-10 - 1 шт., (АР-99)				
67	668	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2.34	9 546	22 338
68	669	211-201-0102 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	2.691	4 689	12 618
69	670	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1.42	14 521	20 620
70	671	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	5.32	31 048	165 175
71	672	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6.8411	24 252	165 910

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	673	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4200266	326 417	137 104
73	674	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.4200266	91 769	38 545
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-8 - 1 шт., Кр-9 - 1 шт., Кр-10 - 1 шт., (АР-99)				**562 310**
			Подраздел: Крыльцо Кр-11 - 1 шт., Кр-12 - 1 шт., Кр-13 - 1 шт., (АР-100)				
74	680	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3.74	9 546	35 702
75	681	211-201-0102 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	4.301	4 689	20 167
76	682	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	2.81	14 521	40 804
77	683	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	7.4	31 048	229 755
78	684	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10.36315	24 252	251 327
79	685	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6362076	326 417	207 669
80	686	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.6362076	91 769	58 384
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-11 - 1 шт., Кр-12 - 1 шт., Кр-13 - 1 шт., (АР-100)				**843 808**
			Подраздел: Крыльцо Кр-14 - 1 шт., Кр-15 - 1 шт., (АР-101)				
81	692	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2.96	9 546	28 256
82	693	211-201-0102 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	3.404	4 689	15 961

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	694	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	2.22	14 521	32 237
84	695	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	6.63	31 048	205 848
85	696	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8.98275	24 252	217 850
86	697	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5512304	326 417	179 931
87	698	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.5512304	91 769	50 586
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-14 - 1 шт., Кр-15 - 1 шт., (АР-101)				**730 669**
			Подраздел: Крыльцо Кр-16, (АР-102)				
88	704	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	15.62	9 546	149 109
89	705	211-201-0102 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	17.963	4 689	84 229
90	706	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	12.37	14 521	179 625
91	707	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	20.61	31 048	639 899
92	708	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	33.4747	24 252	811 828
93	709	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.0547786	326 417	670 715
94	710	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	2.0547786	91 769	188 565

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	711	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	78.12	6 687	522 388
96	712	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	78.12	18 095	1 413 581
97	713	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 до 4	м2	52.07	28 540	1 486 078
98	714	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	52.07	13 429	699 248
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-16, (АР-102)				**6 845 265**
			Подраздел: Система грязезащиты				
99	715	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.1494	1 454 028	217 232
			Итого по подразделу: Система грязезащиты				**217 232**
			Подраздел: Крыльцо Кр-17 - 1 шт., Кр-18 - 1 шт., (АР-103)				
100	716	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	11.77	9 546	112 356
101	717	211-201-0102 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	13.5355	4 689	63 468
102	718	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3.56	14 521	51 695
103	719	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	28.56	31 048	886 731
104	720	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	32.6018	24 252	790 659
105	721	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.0005776	326 417	653 023
106	722	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	2.0005776	91 769	183 591

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-17 - 1 шт., Кр-18 - 1 шт., (АР-103)				**2 741 523**
			Подраздел: Гранит				
107	728	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	49.88	6 687	333 548
108	729	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	49.88	18 095	902 579
109	730	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 до 4	м2	52.5	28 540	1 498 350
110	731	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	52.5	13 429	705 022
111	732	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.0498	1 454 028	72 411
			Итого по подразделу: Гранит				**3 511 910**
			Подраздел: Крыльцо Кр-19 - 1 шт., Кр-20 - 2 шт., (АР-104)				
112	733	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	4.23	9 546	40 380
113	734	211-201-0102 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	4.8645	4 689	22 810
114	735	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3.84	14 521	55 761
115	736	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	12.85	31 048	398 967
116	737	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	16.94035	24 252	410 837
117	738	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.7953218	326 417	259 607
118	739	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.7953218	91 769	72 986

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-19 - 1 шт., Кр-20 - 2 шт., (АР-104)				**1 261 348**
			Подраздел: Крыльцо Кр-21 - 1 шт., Кр-22 - 1 шт., (АР-105)				
119	745	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3.76	9 546	35 893
120	746	211-201-0102 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	4.324	4 689	20 275
121	747	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3.29	14 521	47 774
122	748	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	6.87	31 048	213 300
123	749	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10.3124	24 252	250 096
124	750	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.546994	326 417	178 548
125	751	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.546994	91 769	50 197
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-21 - 1 шт., Кр-22 - 1 шт., (АР-105)				**796 083**
			Подраздел: Крыльцо Кр-23 - 1 шт., Кр-24 - 1 шт., (АР-106)				
126	757	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	4.48	9 546	42 766
127	758	211-201-0102 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	5.152	4 689	24 158
128	759	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	4.5	14 521	65 344
129	760	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	9.59	31 048	297 750

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
130	761	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	14.30135	24 252	346 836
131	762	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.7252966	326 417	236 749
132	763	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.7477246	91 769	68 618
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-23 - 1 шт., Кр-24 - 1 шт., (АР-106)				**1 082 221**
			Подраздел: Крыльцо Кр-25 - 1 шт., Кр-26 - 1 шт., (АР-107)				
133	769	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3.69	9 546	35 225
134	770	211-201-0102 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	4.2435	4 689	19 898
135	771	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3.7	14 521	53 728
136	772	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	8.36	31 048	259 561
137	773	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	12.2409	24 252	296 866
138	774	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6125336	326 417	199 941
139	775	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.6125336	91 769	56 212
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-25 - 1 шт., Кр-26 - 1 шт., (АР-107)				**921 431**
			Подраздел: Крыльцо Кр-27 - 1 шт., (АР-108)				
140	781	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1.68	9 546	16 037
141	782	211-201-0102 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	1.932	4 689	9 059

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
142	783	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1.59	14 521	23 088
143	784	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	3.65	31 048	113 325
144	785	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5.3186	24 252	128 987
145	786	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2644012	326 417	86 305
146	787	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.2644012	91 769	24 264
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-27 - 1 шт., (АР-108)				**401 065**
			Подраздел: Каркас				
147	793	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	516.48	4 895	2 528 170
148	794	222-529-0301 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1328.88	290	385 375
149	795	222-529-0102 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1268.13	224	284 061
			Итого по подразделу: Каркас				**3 197 606**
			Подраздел: Фанера перфорированная для радиаторных решеток				
150	796	215-301-0106 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	м2	159.894	2 732	436 830
151	797	1219-0101-0204 РСНБ РК 2022	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление	отверстие	11993	536	6 428 248
152	798	1219-0101-0205 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0204 на каждые 5 см глубины свыше 20 см	отверстие	11993	-269	-3 226 117
			Итого по подразделу: Фанера перфорированная для радиаторных решеток				**3 638 961**
			Подраздел: Накрывочная фанера для стеновых протекторов и радиаторов				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
153	799	215-301-0106 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	м2	79.59	2 732	217 440
			Итого по подразделу: Накрывочная фанера для стеновых протекторов и радиаторов				**217 440**
			Подраздел: Стеновые протекторы				
154	800	215-303-0201 РСНБ РК 2022	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сорта	100 м2	3.0282	142 476	431 446
155	801	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	288.4	4 796	1 383 166
156	802	234-304-0103 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм /+ поролон/	м2	317.24	3 114	987 885
157	803	261-107-0516 РСНБ РК 2022	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81	1000 м2	0.31724	583 423	185 085
			Итого по подразделу: Стеновые протекторы				**2 987 582**
			Подраздел: Р Световые приямки ТП1-ТП5 (АР-126)				
158	819	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	6.52	9 546	62 240
159	820	211-201-0102 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	7.498	4 689	35 158
160	821	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3.99135	14 521	57 958
161	822	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	20.06865	64 954	1 303 539
162	823	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	24.4209	24 252	592 256
163	824	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.0047744	430 058	432 111
			Итого по подразделу: Р Световые приямки ТП1-ТП5 (АР-126)				**2 483 262**
			Подраздел: Р Навесы приямков (АР-126)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
164	825	6106-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж колонны со связями	т	0.65992	156 069	102 993
165	826	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.65992	1 184 085	781 401
166	827	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	28.70652	414	11 884
167	828	1109-0303-0204 РСНБ РК 2022	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	18.6125	8 505	158 299
168	829	217-206-0107 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 25 мм	м2	18.6125	7 380	137 360
169	830	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	17	601	10 217
170	831	261-107-0723 РСНБ РК 2022	Пластина техническая без тканевых прокладок	т	0.001	966 673	967
			Итого по подразделу: Р Навесы приямков (АР-126)				**1 203 121**
			Подраздел: Р Сетка заградительная (АР-127)				
171	832	1134-0109-0204 РСНБ РК 2022	Экранирование оконных проемов сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство	м2 экранирования	187.16	44 880	8 399 741
172	833	522-101-1091002 СпрСЦ 03.2024	Сетка заградительная, размер ячейки 40х40мм RAC-040	м2	187.16	6 442	1 205 685
173	834	214-212-0101 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 3,6 мм	10 м	28.833	3 633	104 750
174	835	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	46.76	1 590	74 348
			Итого по подразделу: Р Сетка заградительная (АР-127)				**9 784 524**
			Итого по разделу: Прочие конструкции				**76 614 481**
			Раздел: Элементы обеспечения доступности маломобильных групп населения (АР131-133)				
			Подраздел: Поручни в санузлах для МГН, (АР-135)				
175	850	6106-0304-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	39.42	6 481	255 481

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
176	851	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	39.42	26 342	1 038 402
			Итого по подразделу: Поручни в санузлах для МГН, (АР-135)				**1 293 883**
			Итого по разделу: Элементы обеспечения доступности маломобильных групп населения (АР131-133)				**1 293 883**
			Раздел: Ограждение Ог1-Ог3 (АР-140)				
177	861	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	10.45	7 396	77 288
178	862	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	10.45	37 335	390 151
			Итого по разделу: Ограждение Ог1-Ог3 (АР-140)				**467 439**
			Итого по локальной смете: Отделочные работы				**84 187 475**
			ИТОГО по акту:				**84 187 475**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	82981790.137 x 7.30%	6 057 671
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	84187475.137 + 6057670.838	90 245 146
	Сметная прибыль, (5.00%)	89039460.975 x 5.00%	4 451 973
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	90245145.975 x 5.000%	4 512 257
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		99 209 376
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал, к = 1.0750	99209376.323 x 1.0750	106 650 080
	НДС (12%)	106650079.547 x 12%	12 798 010
	Итого с НДС	106650079.547 + 12798009.546	119 448 089

Лист согласования
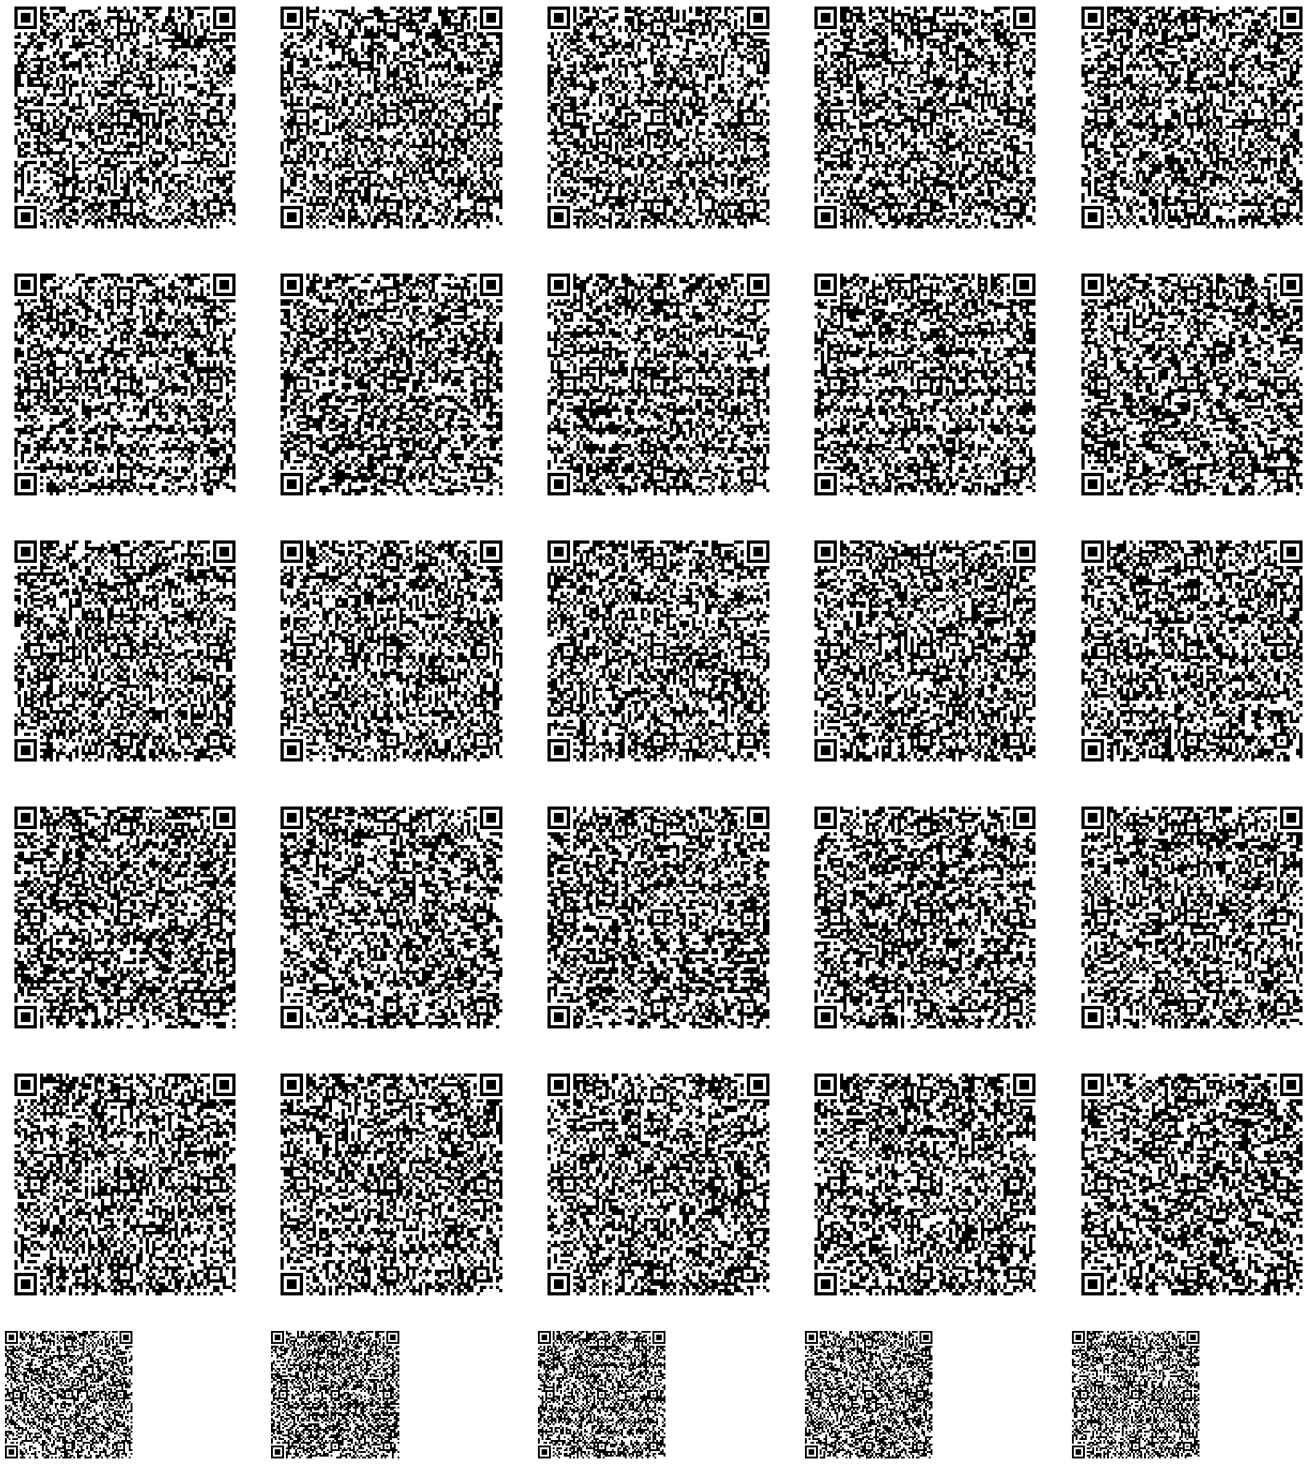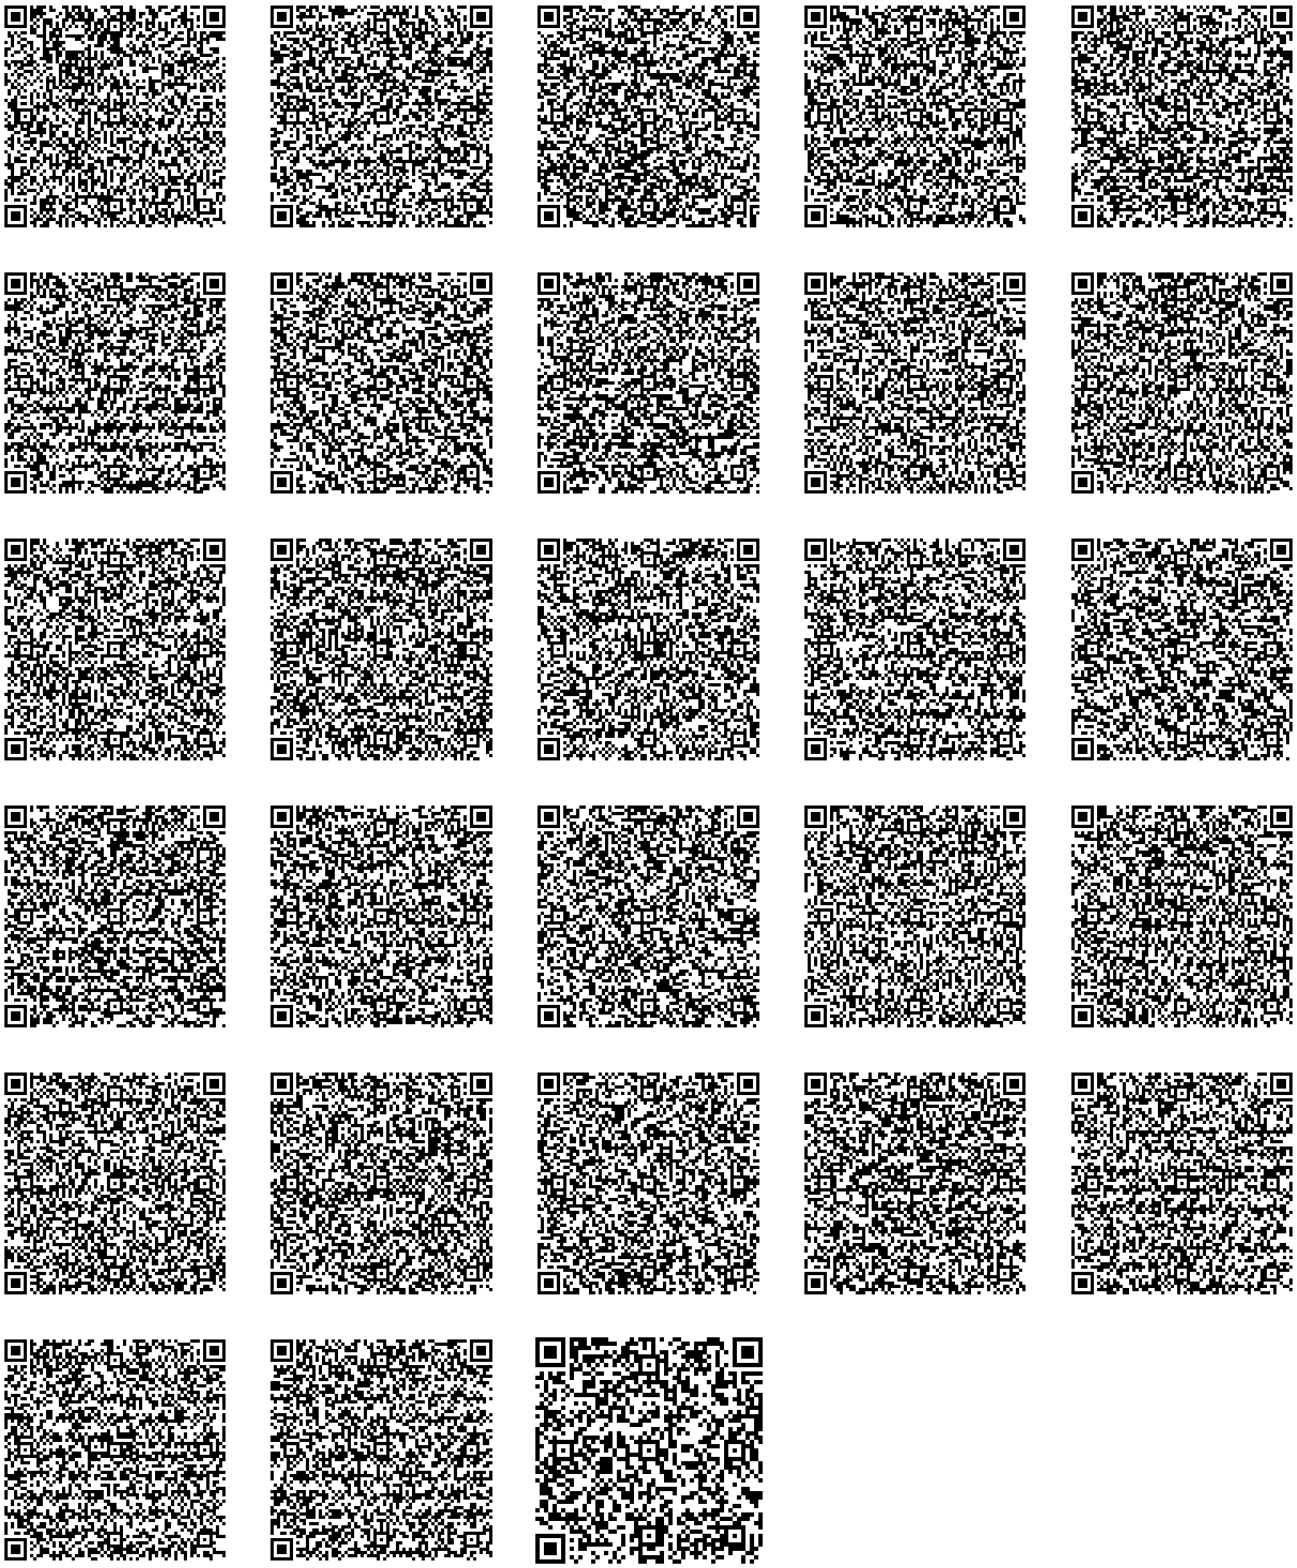
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	30.04.2025 17:28
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	30.04.2025 18:37
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	30.04.2025 18:00
Представители заказчика		
760731400751 - АЙТКУЛОВА ГУЛЬМИРА УСЕРБАЕВНА	Ведущий специалист	30.04.2025 21:11
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	30.04.2025 19:42 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	30.04.2025 19:06
