Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Асфальтобетонное покрытие проездов				
1	1	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	431.4795	8 225	3 548 919
2	2	7101-0403-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	2876.53	1 329	3 822 908
3	3	7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2876.53	485	1 395 117
4	4	216-201-0202РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.0310665	210 723	6 546
5	5	212-501-0104РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	278.448104	22 075	6 146 741
6	6	7101-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	2876.53	36	103 555
7	7	216-201-0202РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.0161086	210 723	3 394
8	8	212-501-0104РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	138.07344	22 075	3 047 971
9	9	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2876.53	499	1 435 388
10	10	216-201-0202РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.0310665	210 723	6 546
11	11	212-501-0203РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	280.749328	24 023	6 744 441
			Итого по локальной смете: Асфальтобетонное покрытие проездов				**26 261 527**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту:				**26 261 527**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.300%)			26261527.272 x 7.30%	1 917 092
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			26261527.272 + 1917091.541	28 178 619
			Сметная прибыль, (5.00%)			28178618.812 x 5.00%	1 408 931
			Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)			28178618.812 x 5.000%	1 408 931
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				30 996 481
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал , к = 1.0182			30996480.694 x 1.0182	31 560 617
			НДС (12%)			31560616.642 x 12%	3 787 274
			Итого с НДС			31560616.642 + 3787273.997	35 347 891

Лист согласования
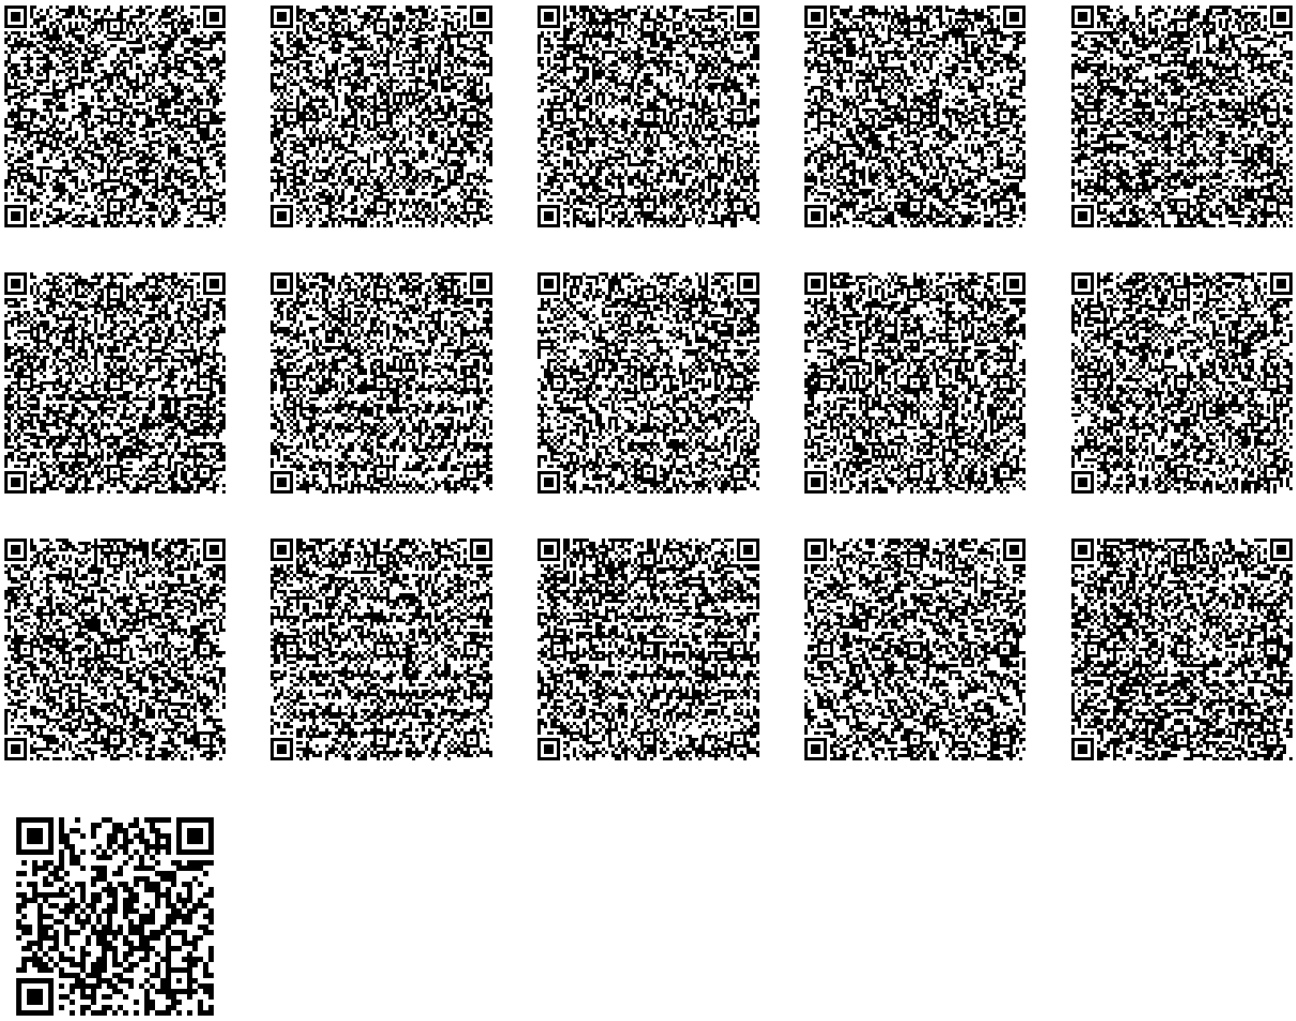
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	30.04.2025 17:47
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	30.04.2025 18:24
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	30.04.2025 18:42
Представители заказчика		
760731400751 - АЙТКУЛОВА ГУЛЬМИРА УСЕРБАЕВНА	Ведущий специалист	30.04.2025 21:16
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	30.04.2025 19:37 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	30.04.2025 18:59
