Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети канализации				
			Раздел: Канализация К3				
1	1	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	12.5	2 008	25 100
2	2	234-303-2305 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000,бст 32 мм диаметром 42 мм	м	13.75	23 255	319 756
			Итого по разделу: Канализация К3				**344 856**
			Раздел: Канализация				
3	3	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	19	26 401	501 619
4	4	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	19.38	5 958	115 466
5	5	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0.1	3 187 876	318 788
6	6	241-207-1007 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	м	100	3 149	314 900
			Итого по разделу: Канализация				**1 250 773**
			Раздел: Колодцы				
			Подраздел: Колодцы канализационные диам.1000мм 9шт /К1 - 7шт,К2 - 2шт/				
7	7	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	22 435	44 870

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	17 760	71 040
9	9	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13 070	26 140
			Итого по подразделу: Колодцы канализационные диам.1000мм 9шт /К1 - 7шт,К2 - 2шт/				**142 050**
			Подраздел: Колодцы канализационные диам.1500мм 13 шт /К1 - 12шт,К3 - 1шт/				
10	10	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	43 426	86 852
11	11	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	34 112	136 448
12	12	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	30 057	60 114
			Итого по подразделу: Колодцы канализационные диам.1500мм 13 шт /К1 - 12шт,К3 - 1шт/				**283 414**
			Подраздел: Колодцы сборные прямоугольные 3000х2000 мм -2шт - замена на круглый				
13	13	6122-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 2 м в сухих грунтах	м3	11.64	86 299	1 004 520
14	14	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	68 415	273 660
15	15	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	12	52 390	628 680
16	16	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	55 789	223 156
17	17	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком,тип Т (С250)	комплект	2	63 066	126 132
			Итого по подразделу: Колодцы сборные прямоугольные 3000х2000 мм -2шт - замена на круглый				**2 256 148**
			Итого по разделу: Колодцы				**2 681 612**
			Итого по локальной смете: Наружные сети канализации				**4 277 241**
			ИТОГО по акту:				**4 277 241**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (9.400%)				4277241.000 x 9.40%	402 061
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4277241.000 + 402060.638	4 679 302
		Сметная прибыль, (5.00%)				4679301.638 x 5.00%	233 965

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				4679301.638 x 5.000%	233 965
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					5 147 232
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал , к = 1.0750				5147231.801 x 1.0750	5 533 274
		НДС (12%)				5533274.187 x 12%	663 993
		Итого с НДС				5533274.187 + 663992.902	6 197 267

Лист согласования
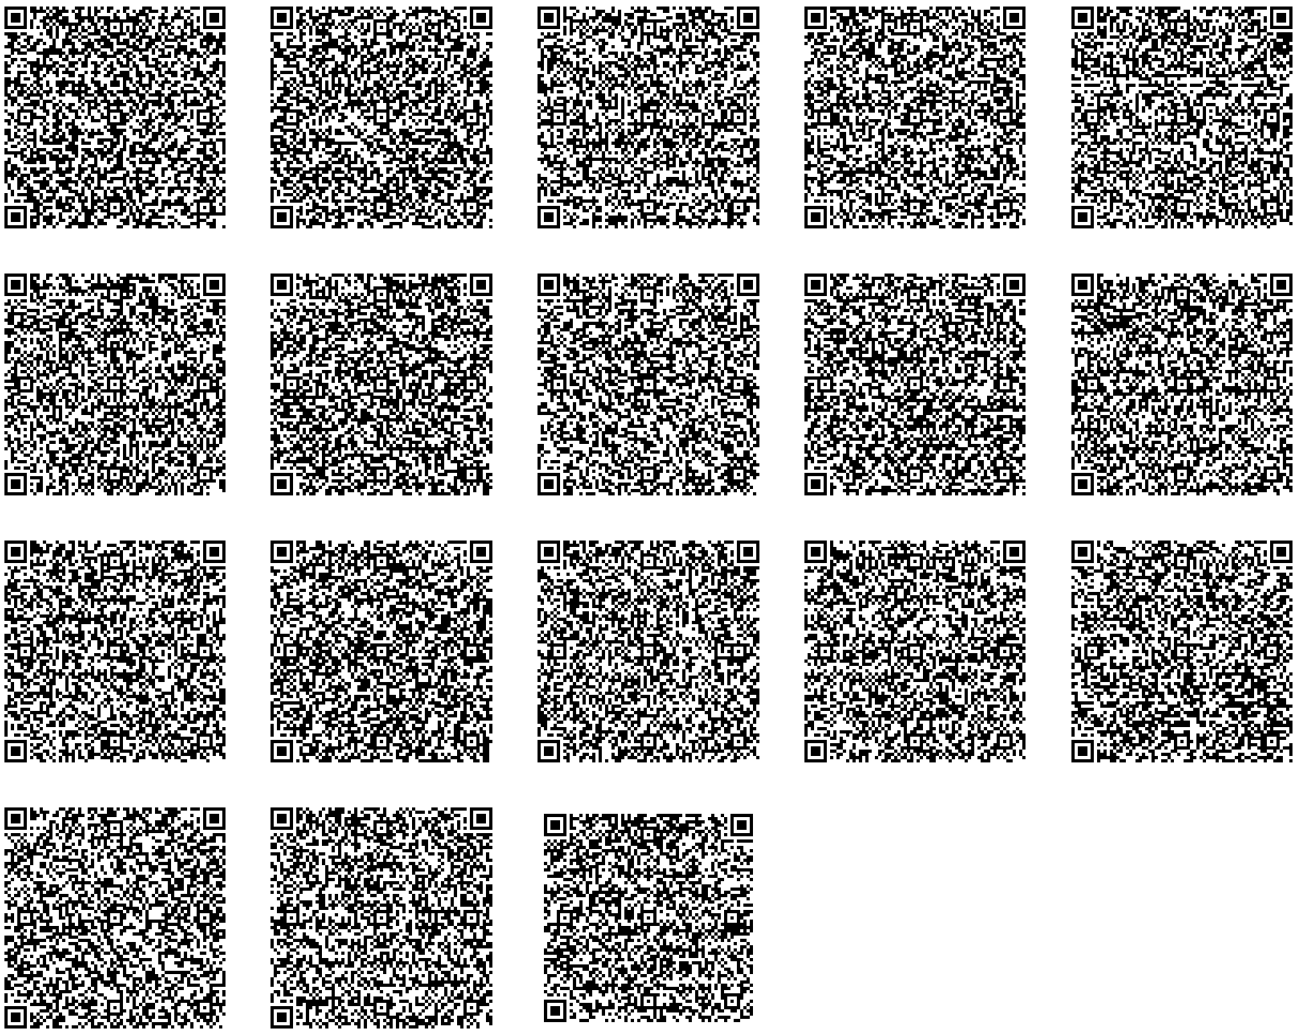
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	08.04.2025 22:57
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	09.04.2025 18:04
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	09.04.2025 17:51
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	09.04.2025 21:57
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	09.04.2025 19:39
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	09.04.2025 20:09 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
