Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				
			Раздел: ПОЛЫ /АР-20/				
			Подраздел: Тип 6				
1	219	6109-0102-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	67.32	31 181	2 099 105
2	220	6111-0403-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	673.2	340	228 888
3	221	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	67.32	23 278	1 567 075
4	222	212-101-0609РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	68.6664	31 055	2 132 435
5	223	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.9570884	68 444	65 507
6	224	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.9570884	306 062	292 928
			Итого по подразделу: Тип 6				**6 385 938**
			Подраздел: Прим. 9				
7	231	1111-0101-0803РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	81.84	21 329	1 745 565
8	232	211-302-0302РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	90.024	20 501	1 845 581
			Итого по подразделу: Прим. 9				**3 591 147**
			Итого по разделу: ПОЛЫ /АР-20/				**9 977 085**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				**9 977 085**
			ИТОГО по акту:				**9 977 085**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				9977085.000 x 7.30%	728 327

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				9977085.000 + 728327.224	10 705 412
		Сметная прибыль, 5.00%				10705412.224 x 5.00%	535 270
		Непредвиденные расходы, 5.000%				10705412.224 x 5.000%	535 270
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					11 775 953
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				11775953.446 x 1.0557	12 431 874
		НДС (12%)				12431874.053 x 12%	1 491 824
		Итого с НДС				12431874.053 + 1491824.886	13 923 698

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	04.11.2024 04:22
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	05.11.2024 11:23
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	05.11.2024 04:04
Представители заказчика		
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ ЗИНАТУЛАУЛЫ	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	11.11.2024 03:50
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	08.11.2024 01:26
841109402370 - КАРИПЖАНОВА САУЛЕ ЗАМАНБЕКОВНА	Ведущий специалист	08.11.2024 05:39
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.11.2024 07:59 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	08.11.2024 16:01 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

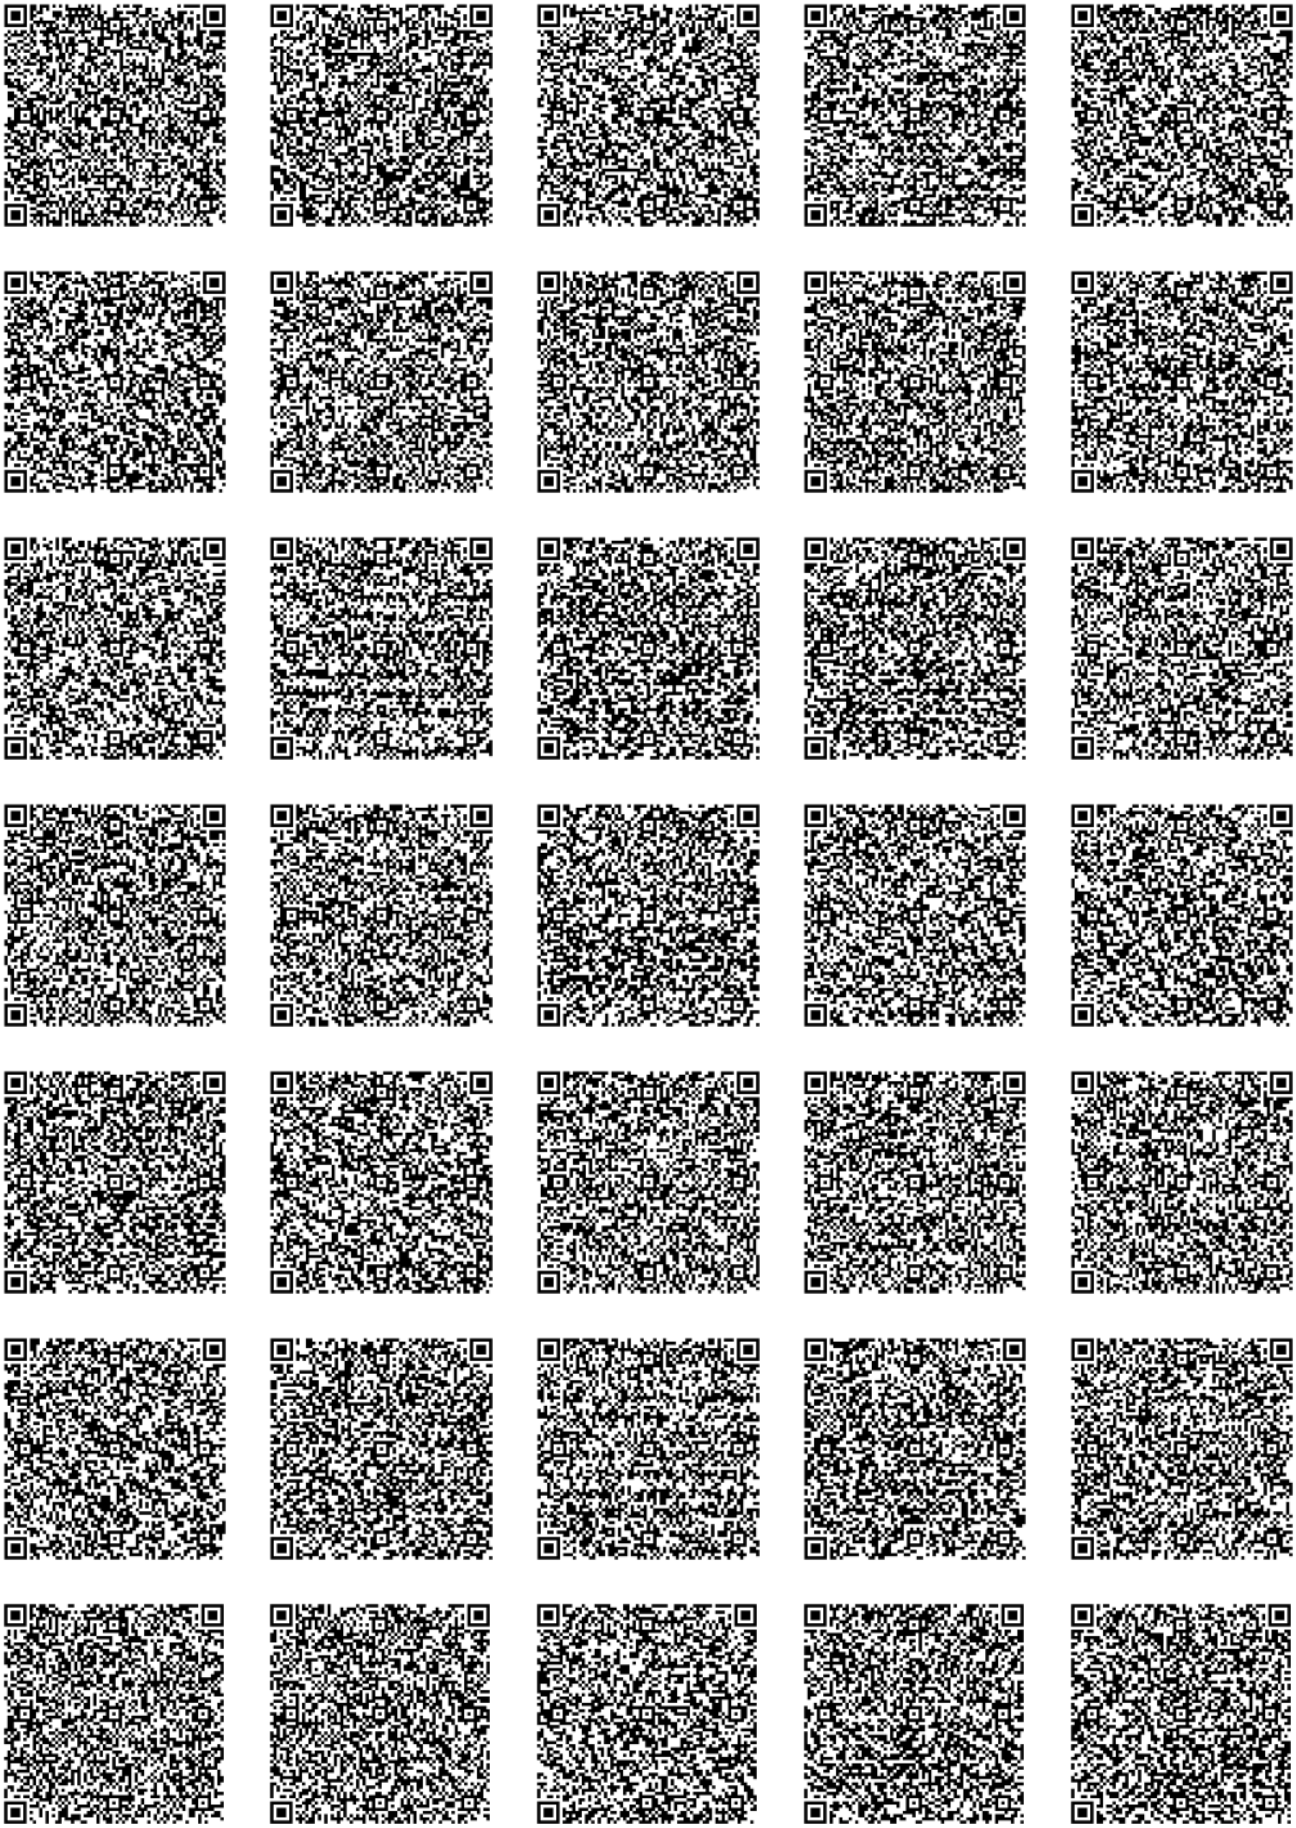

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование (ОВ, ОВ.С)				
			Раздел: Вентиляция лист 6				
			Подраздел: РВентиляция приточная П1				
1	13	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	58.3	15 125	881 788
2	14	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	69	14 378	992 082
3	15	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	81.6	14 806	1 208 170
4	16	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	31.6	13 130	414 908
5	17	6118-0101-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м2	49.4	12 119	598 679
6	18	246-301-0502РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	192	775	148 800
			Итого по подразделу: РВентиляция приточная П1				**4 244 427**
			Подраздел: РВентиляция приточная П2				
7	38	246-301-0502РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	89	775	68 975
8	39	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	9.2	15 125	139 150

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	40	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	31.2	14 378	448 594
10	41	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	26.2	14 806	387 917
11	42	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	112.6	13 130	1 478 438
			Итого по подразделу: РВентиляция приточная П2				**2 523 074**
			Подраздел: РВентиляция приточная П3				
12	60	246-301-0502РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	247	775	191 425
13	61	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	519	5 447	2 826 993
14	62	234-304-0104РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	570.9	3 782	2 159 144
15	63	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	63	15 125	952 875
16	64	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	58	14 378	833 924
17	65	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	48.6	14 806	719 572
18	66	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	158	13 130	2 074 540
19	67	6118-0101-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м2	194.4	12 119	2 355 934
			Итого по подразделу: РВентиляция приточная П3				**12 114 407**
			Подраздел: РВентиляция приточная П5				
20	91	246-301-0502РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	27	775	20 925
21	92	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	15.4	14 378	221 421
22	93	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	26	14 806	384 956
23	96	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	45	5 447	245 115

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	97	234-304-0104РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	49.5	3 782	187 209
			Итого по подразделу: РВентиляция приточная П5				**1 059 626**
			Подраздел: РВентиляция вытяжная В1				
25	106	246-301-0502РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	775	12 400
26	107	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	12.2	15 125	184 525
			Итого по подразделу: РВентиляция вытяжная В1				**196 925**
			Подраздел: РВентиляция вытяжная В2				
27	116	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	2	5 447	10 894
28	117	234-304-0104РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	2.2	3 782	8 320
29	118	246-301-0502РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25	775	19 375
30	119	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	17	15 125	257 125
31	120	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	6	14 378	86 268
			Итого по подразделу: РВентиляция вытяжная В2				**381 982**
			Подраздел: РВентиляция вытяжная В8				
32	201	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	2.4	5 447	13 073
33	202	234-304-0104РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	2.64	3 782	9 984
34	203	246-301-0502РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	775	12 400
35	205	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	18	14 378	258 804
36	206	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	3.6	14 806	53 302
			Итого по подразделу: РВентиляция вытяжная В8				**347 563**
			Итого по разделу: Вентиляция лист 6				**20 868 004**
			Раздел: Система противодымной вентиляции ДУ1, ПДЕ1, ПДЕ2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	268	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	27	13 130	354 510
38	269	246-301-0502РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	90	775	69 750
			Итого по разделу: Система противодымной вентиляции ДУ1, ПДЕ1, ПДЕ2				**424 260**
			Итого по локальной смете: Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование (ОВ, ОВ.С)				**21 292 264**
			ИТОГО по акту:				**21 292 264**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				21292264.000 x 7.30%	1 554 335
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				21292264.000 + 1554335.313	22 846 599
		Сметная прибыль, 5.00%				22846599.313 x 5.00%	1 142 329
		Непредвиденные расходы, 5.000%				22846599.313 x 5.000%	1 142 329
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					25 131 259
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				25131259.244 x 1.0557	26 531 070
		НДС (12%)				26531070.384 x 12%	3 183 728
		Итого с НДС				26531070.384 + 3183728.446	29 714 798

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	04.11.2024 10:52
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	06.11.2024 02:07
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	05.11.2024 03:54
Представители заказчика		
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ ЗИНАТУЛАУЛЫ	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	07.11.2024 16:14
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	07.11.2024 05:11 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	07.11.2024 05:38 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	06.11.2024 10:29
841109402370 - КАРИПЖАНОВА САУЛЕ ЗАМАНБЕКОВНА	Ведущий специалист	06.11.2024 10:40

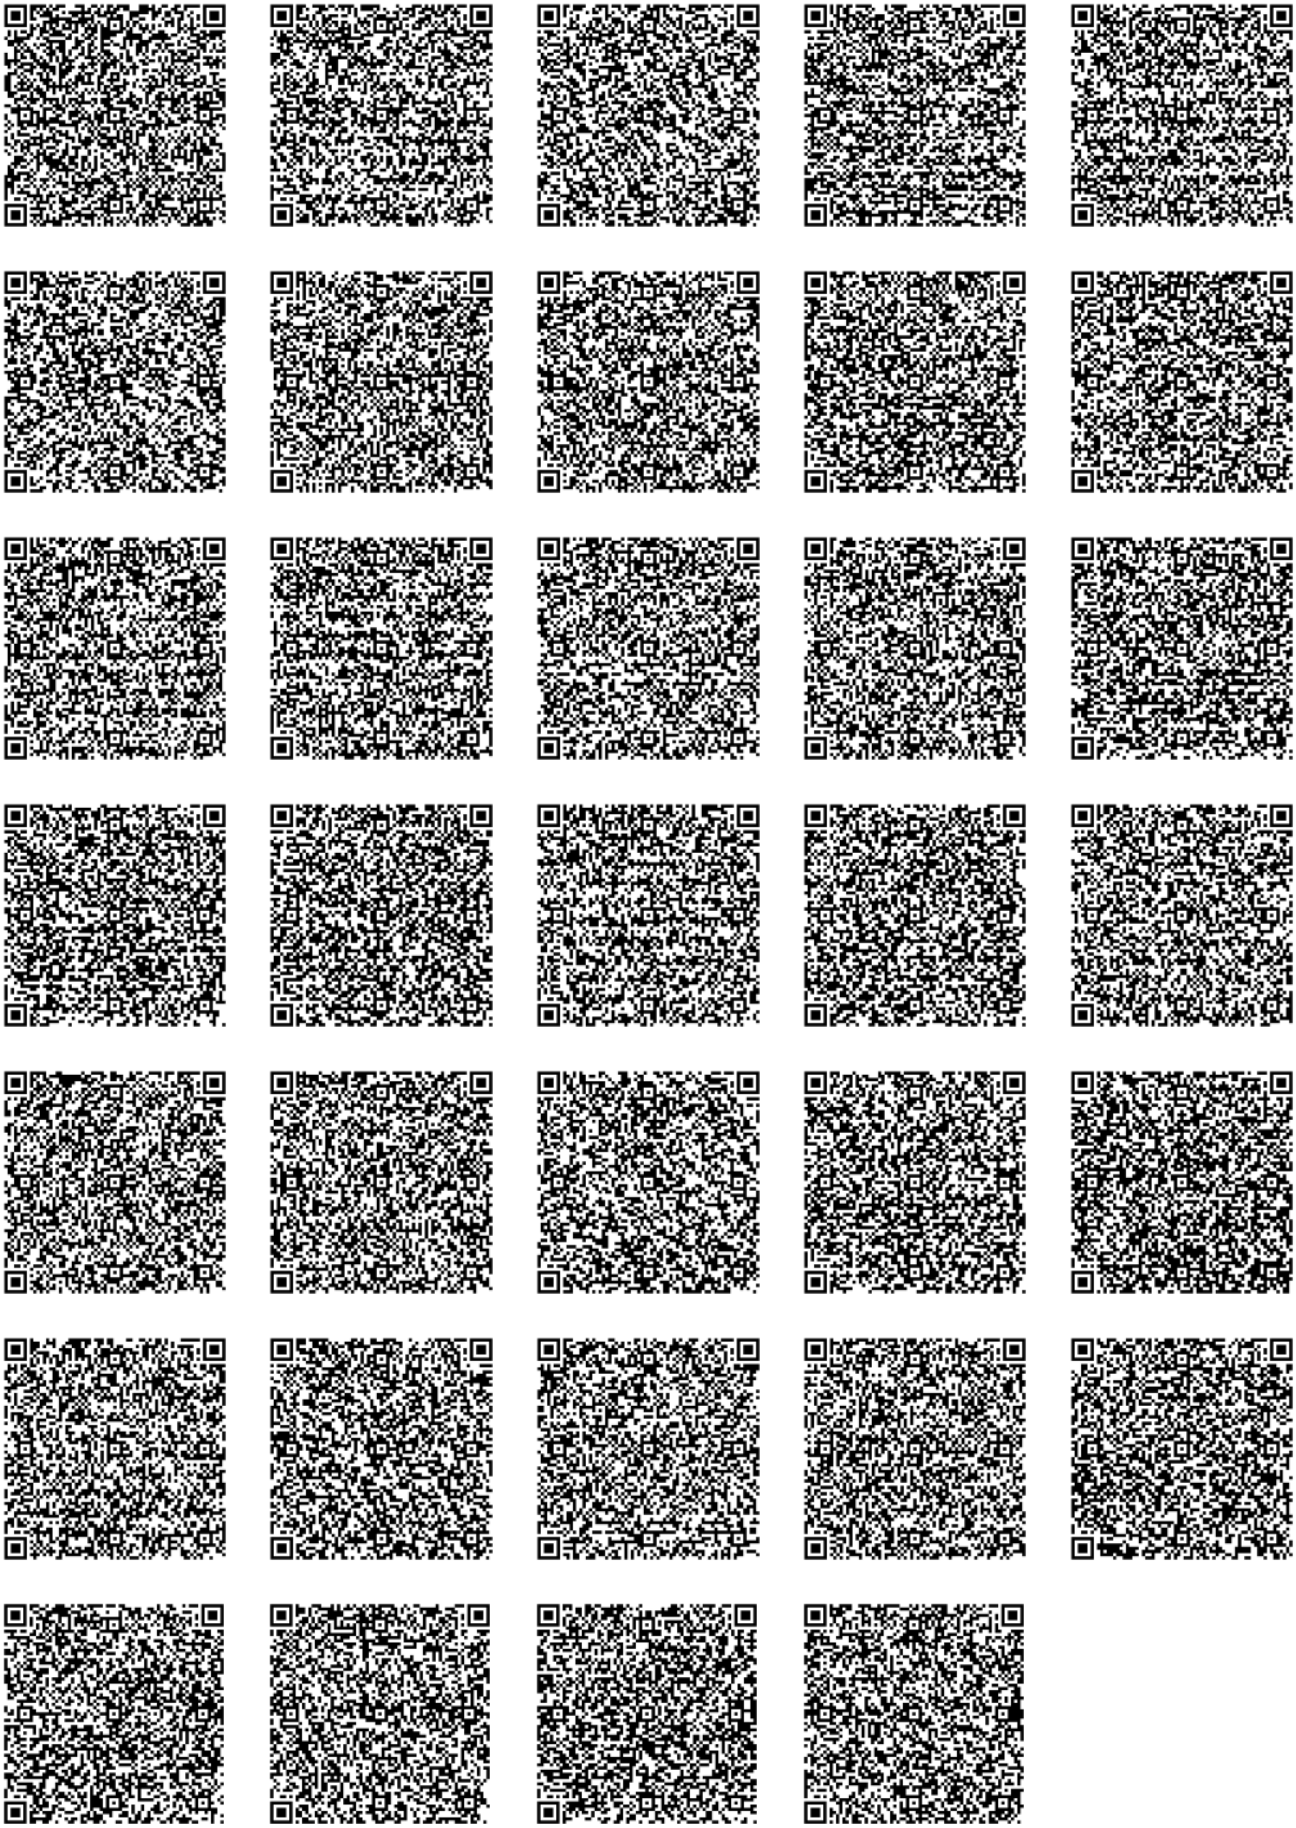

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	207.5165416	475	98 570
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	15.6195246	9 575	149 557
			Итого по разделу: Земляные работы				**248 127**
			Раздел: Конструкции железобетонные				
			Подраздел: РКаналы монолитные				
3	6	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	1.1	40 243	44 267
4	7	1106-1301-0302РСНБ РК 2022	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	2.5	147 858	369 645
5	8	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1848	351 052	64 874
6	9	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.0865	334 939	28 972
7	10	214-203-0202РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0.0865	480 905	41 598
			Итого по подразделу: РКаналы монолитные				**549 356**
			Подраздел: РЛотки сборные				
8	13	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	32.584	37 411	1 219 000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	14	225-203-0103РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	32.584	61 588	2 006 783
			Итого по подразделу: РЛотки сборные				**3 225 783**
			Итого по разделу: Конструкции железобетонные				**3 775 139**
			Раздел: Внутриплощадочные тепловые сети.GP-11/2023-ТС				
			Подраздел: РКанальная прокладка трубопроводов				
10	59	6123-0101-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм	км	0.2	5 550 595	1 110 119
11	60	241-102-0210РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	202	5 279	1 066 358
12	70	222-519-0202РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0.0352	1 126 773	39 662
13	71	222-519-0201РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0.06552	1 126 773	73 826
14	72	241-112-0207РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х5,0 мм	шт.	8	4 964	39 712
15	73	6123-0105-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка компенсаторов П-образных на трубопроводах, диаметр 125 мм	шт.	1	55 159	55 159
16	74	245-405-0405РСНБ РК 2022	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м	шт.	1	125 866	125 866
17	77	6111-0501-0526 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией ОС-51-03	м2	98	1 033	101 234
18	78	6111-0101-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	8.2	119 044	976 161
19	79	234-101-0302РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3	м3	8.856	15 688	138 933
20	80	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2	170	2 131	362 270
21	81	261-105-0190РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.1955	552 642	108 042
			Итого по подразделу: РКанальная прокладка трубопроводов				**4 197 342**
			Итого по разделу: Внутриплощадочные тепловые сети.GP-11/2023-ТС				**4 197 342**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**8 220 608**
			ИТОГО по акту:				**8 220 608**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				8220608.232 x 7.30%	600 104
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				8220608.232 + 600104.417	8 820 712
		Сметная прибыль, 5.00%				8820712.648 x 5.00%	441 035

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные расходы, 5.000%				8820712.648 x 5.000%	441 035
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					9 702 783
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				9702783.913 x 1.0557	10 243 228
		НДС (12%)				10243228.977 x 12%	1 229 187
		Итого с НДС				10243228.977 + 1229187.477	11 472 416

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	05.11.2024 13:52
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	06.11.2024 13:49
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	06.11.2024 09:23
Представители заказчика		
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ ЗИНАТУЛАУЛЫ	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	11.11.2024 03:51
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	08.11.2024 16:03 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	08.11.2024 01:31
841109402370 - КАРИПЖАНОВА САУЛЕ ЗАМАНБЕКОВНА	Ведущий специалист	08.11.2024 05:38
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.11.2024 08:00 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

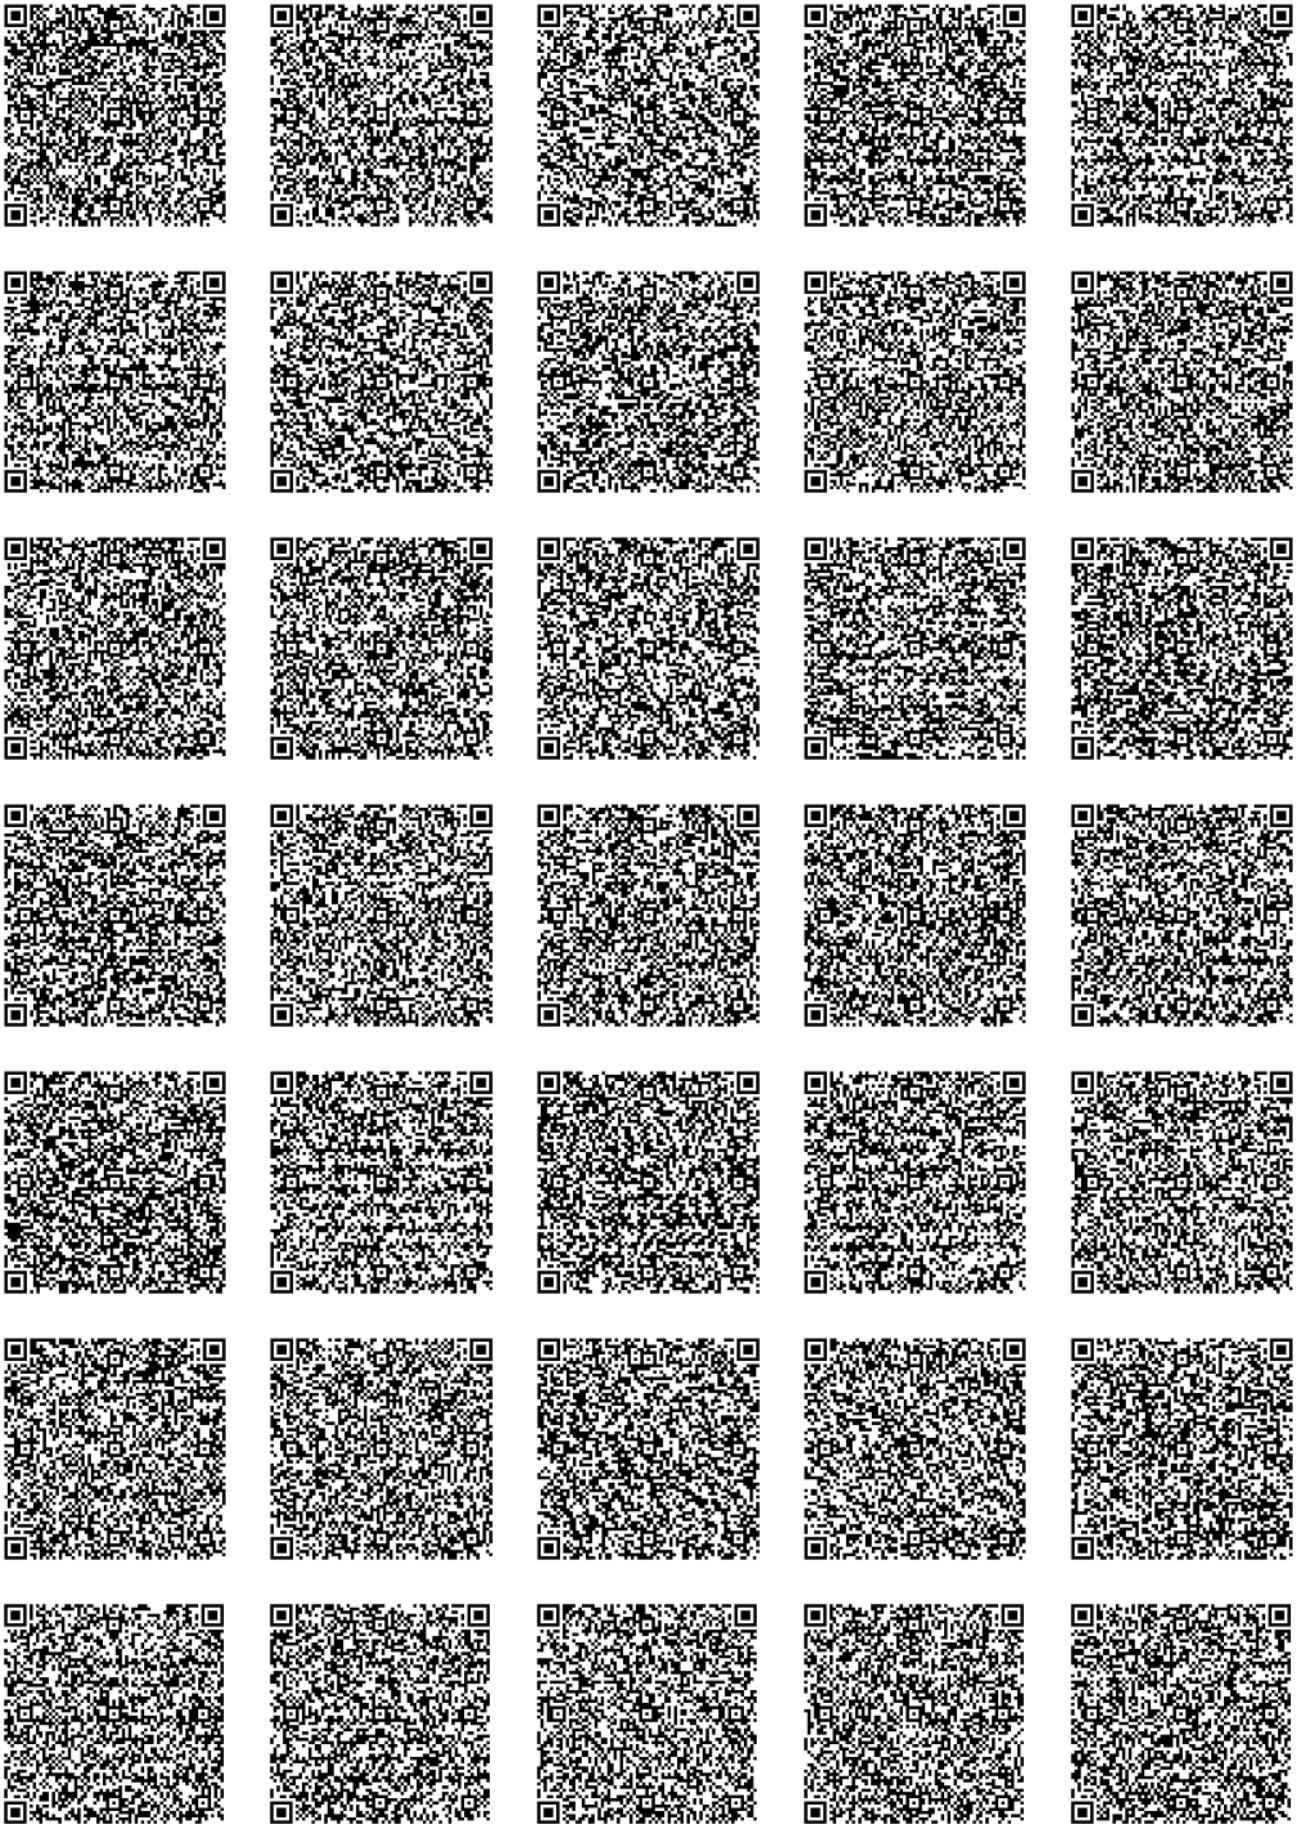

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Подпорная стена П1-ПЗ				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	6101-0101-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2.	м3	469.25	674	316 274
2	2	6101-0201-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	15	9 575	143 624
			Итого по разделу: Земляные работы				**459 899**
			Раздел: Подпорная стена П1-ПЗ л.3-5				
3	7	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	161.04	65 019	10 470 660
4	8	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	163.456	37 216	6 083 178
5	9	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1522	358 976	54 636
6	10	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13.756	351 052	4 829 071
7	11	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	900.95	4 272	3 848 858
			Итого по разделу: Подпорная стена П1-ПЗ л.3-5				**25 286 404**
			Итого по локальной смете: Подпорная стена П1-ПЗ				**25 746 304**
			ИТОГО по акту:				**25 746 304**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				25746304.162 x 7.30%	1 879 480
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				25746304.162 + 1879480.253	27 625 784
		Сметная прибыль, 5.00%				27625784.415 x 5.00%	1 381 289
		Непредвиденные расходы, 5.000%				27625784.415 x 5.000%	1 381 289
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					30 388 362

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				30388362.856 x 1.0557	32 080 994
		НДС (12%)				32080994.667 x 12%	3 849 719
		Итого с НДС				32080994.667 + 3849719.360	35 930 714

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	04.11.2024 05:54
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	05.11.2024 11:28
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	05.11.2024 04:00
Представители заказчика		
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	06.11.2024 10:35
841109402370 - КАРИПЖАНОВА САУЛЕ ЗАМАНБЕКОВНА	Ведущий специалист	06.11.2024 10:40
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	07.11.2024 05:10 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ ЗИНАТУЛАУЛЫ	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	07.11.2024 16:14
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	07.11.2024 05:38 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

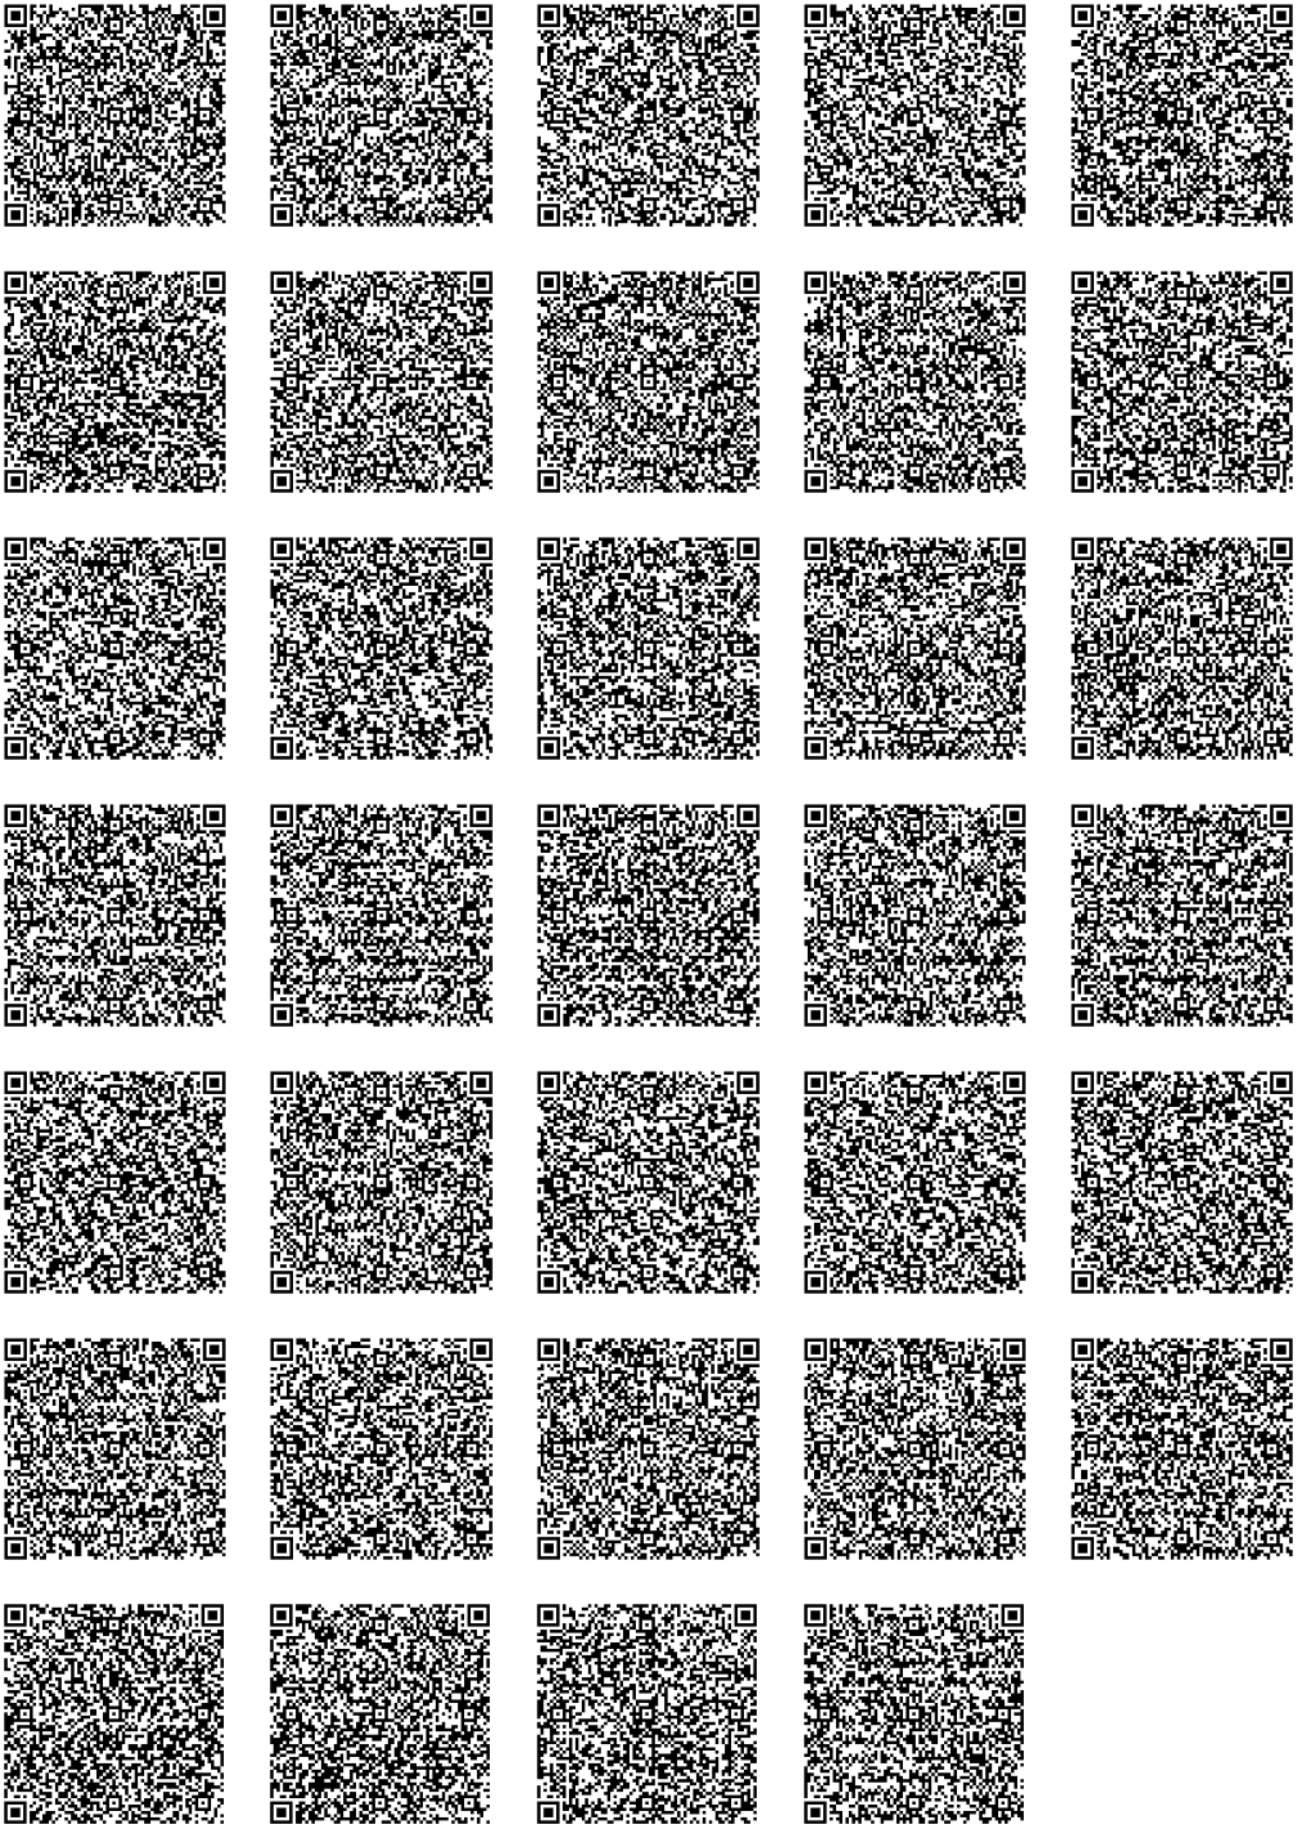

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутренние инженерные системы.Теплоснабжение (ОВ, ОВ.С)				
			Раздел: Отопление				
1	1	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	365.5	3 111	1 137 070
2	2	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	2972	2 302	6 841 544
3	3	261-301-0215 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1	100 шт.	5.8	34 239	198 586
4	4	6114-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	140	1 233	172 620
5	5	245-510-0101 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	140	7 633	1 068 620
6	6	6114-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	140	1 233	172 620
7	7	6114-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	140	816	114 240
8	8	242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	140	331	46 340
9	9	242-303-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	140	4 729	662 060

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Отопление				**10 413 700**
			Раздел: Тепловой пункт				
10	75	6125-1003-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 80 мм	шт.	1	22 611	22 611
11	76	245-706-0527 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65	шт.	1	334 622	334 622
12	77	6116-0602-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка грязевиков на стальных опорах в тепловых пунктах, условный диаметр до 125 мм	шт.	2	245 669	491 338
13	78	6116-0605-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм	шт.	2	25 358	50 716
14	79	242-404-0110 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	2	117 490	234 980
15	80	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	4	6 642	26 568
16	81	6114-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 125 мм	шт.	2	39 629	79 258
17	82	242-202-0508 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	182 046	364 092
18	83	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	12 399	148 788
19	89	6114-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	3 179	3 179
20	90	242-401-2706 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	шт.	1	1 189 800	1 189 800
21	91	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	84 881	84 881
22	92	511-403-0115 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 16,0 м3/ч, Н 10,0 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	352 366	704 732
23	93	1312-1101-0303 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	25 037	25 037

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	94	245-504-0128 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 40,0 м3/ч, DN 50, модель CV 216 GG, типа IMI	шт.	1	160 815	160 815
25	95	245-405-2523 РСНБ РК 2022	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	297 468	297 468
26	98	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	17 196	51 588
27	99	242-304-1104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	109 611	219 222
28	100	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 989	15 956
29	101	242-202-0506 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	83 724	83 724
30	102	6114-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	2	816	1 632
31	103	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8 398	16 796
32	116	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2 866	2 866
33	117	242-312-1406 СпрСЦ 02.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	91 282	91 282
34	118	6116-0603-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса от 100 до 200 кг	шт.	2	11 960	23 920
35	119	513-205-0316 СпрСЦ 02.2024	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), Т1±130°С/Т2±70°С, Т11±80°С/Т21±60°С, PN 16, Tmax 150°С, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss мощностью 225-250 кВт, количество пластин 24, модель XGF№14A-TO 16/24-TK	шт.	2	1 052 738	2 105 476
36	120	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	84 881	84 881
37	121	511-403-0106 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	44 982	89 964
38	122	1312-1101-0303 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	25 037	25 037

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	123	245-505-0139 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 40,0 м3/ч, DN 50, модель CV 316 GG, типа IMI	шт.	1	141 231	141 231
40	124	245-405-2523 РСНБ РК 2022	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	297 468	297 468
41	125	6116-0605-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	6 026	6 026
42	126	6116-0605-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	5 036	5 036
43	127	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557	39 557
44	128	242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	25 388	25 388
45	129	6114-0204-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 50 мм	шт.	2	1 315	2 630
46	130	6114-0204-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	5	1 042	5 210
47	132	242-307-0506 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015 DN 50, PN 18	шт.	1	24 828	24 828
48	133	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	9 106	45 530
49	134	242-202-0504 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	46 292	92 584
50	136	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	5	17 196	85 980
51	137	242-202-0505 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	5	54 481	272 405
52	138	6114-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	3 179	3 179
53	139	242-401-2706 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	шт.	1	1 189 800	1 189 800

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	140	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	17 196	51 588
55	141	242-202-0507 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	3	142 698	428 094
56	142	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	6	4 311	25 866
57	147	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588	11 176
			Итого по разделу: Тепловой пункт				**9 784 805**
			Итого по локальной смете: Внутренние инженерные системы.Теплоснабжение (ОВ, ОВ.С)				**20 198 505**
			ИТОГО по акту:				**20 198 505**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	17298333.281 x 7.30%	1 262 778
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	20198505.281 + 1262778.362	21 461 283
	Сметная прибыль, 5.00%	18561111.643 x 5.00%	928 055
	Непредвиденные расходы, 5.000%	21461283.643 x 5.000%	1 073 064
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		23 462 403
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	23462403.407 x 1.0557	24 769 259
	НДС (12%)	24769259.277 x 12%	2 972 311
	Итого с НДС	24769259.277 + 2972311.113	27 741 570

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	07.11.2024 18:54
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.11.2024 09:01
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	08.11.2024 04:37
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	13.11.2024 13:25 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ ЗИНАТУЛАУЛЫ	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	14.11.2024 12:10
841109402370 - КАРИПЖАНОВА САУЛЕ ЗАМАНБЕКОВНА	Ведущий специалист	13.11.2024 10:00
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	13.11.2024 08:20
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	13.11.2024 11:15 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

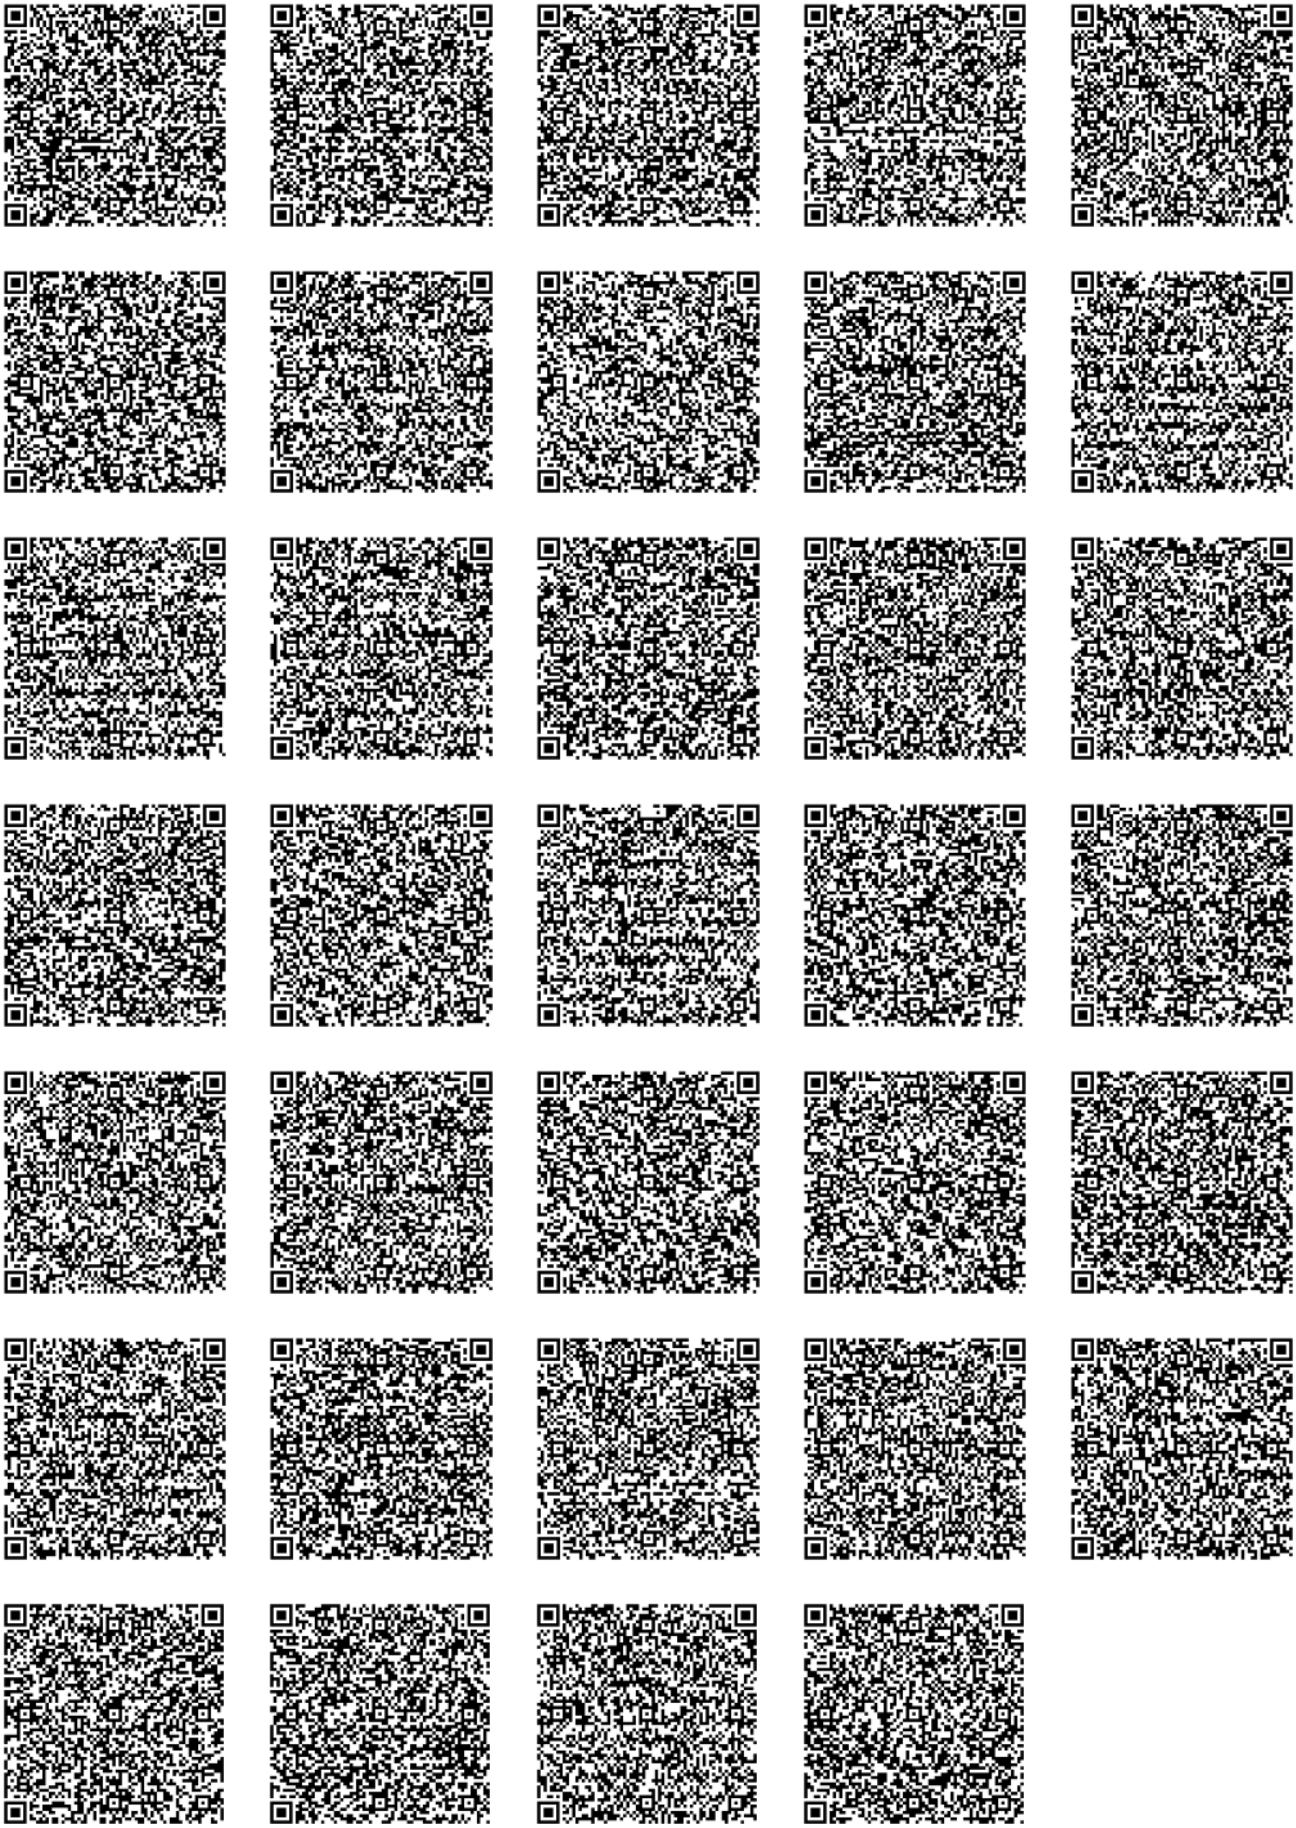

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС1 л.19)				
			Подраздел: Р 2 ЭТАЖ				
1	125	6112-0301-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	1568.29	2 577	4 041 483
			Итого по подразделу: Р 2 ЭТАЖ				**4 041 483**
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС1 л.19)				**4 041 483**
			Раздел: ПОЛЫ /АР-20/				
			Подраздел: Тип 1				
2	181	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 /35/ мм	м2	213.77	2 156	460 888
3	182	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	213.77	523	111 801
4	183	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.2894446	68 444	19 811
5	184	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.2894446	306 062	88 588
			Итого по подразделу: Тип 1				**681 089**
			Подраздел: Тип 2				
6	189	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20/15/ мм	м2	235.48	2 156	507 694
7	190	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	235.48	-175	-41 209
			Итого по подразделу: Тип 2				**466 485**
			Подраздел: Тип 3				
8	197	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20/30/ мм	м2	53.67	2 156	115 712

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	198	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	53.67	349	18 731
10	199	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0726692	68 444	4 974
11	200	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0726692	306 062	22 241
			Итого по подразделу: Тип 3				**161 659**
			Подраздел: Тип 4				
12	204	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 /35/ мм	м2	259.48	2 156	559 439
13	205	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	259.48	523	135 708
14	206	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.3513359	68 444	24 047
15	207	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.3513359	306 062	107 531
			Итого по подразделу: Тип 4				**826 725**
			Подраздел: Тип 5				
16	212	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20/40/ мм	м2	1272.22	2 156	2 742 906
17	213	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	1272.22	697	886 737
18	214	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1.7225859	68 444	117 901
19	215	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.7225859	306 062	527 218
			Итого по подразделу: Тип 5				**4 274 762**
			Подраздел: Тип 6.1				
20	235	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 /40/ мм	м2	20.77	2 156	44 780
21	236	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	20.77	697	14 477
22	237	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0295287	68 444	2 020
23	238	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0295287	306 062	9 038
			Итого по подразделу: Тип 6.1				**70 316**
			Подраздел: Тип 13				
24	245	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 /40/ мм	м2	112.18	2 156	241 859
25	246	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	112.18	697	78 189

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	247	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.1594863	68 444	10 916
27	248	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1594863	306 062	48 813
			Итого по подразделу: Тип 13				**379 778**
			Подраздел: Тип 13хх				
28	255	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 /40/ мм	м2	112.08	2 156	241 644
29	256	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	112.08	697	78 120
			Итого по подразделу: Тип 13хх				**319 764**
			Подраздел: Тип 5х				
30	261	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 /40/ мм	м2	58.39	2 156	125 889
31	262	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	58.39	697	40 698
			Итого по подразделу: Тип 5х				**166 587**
			Подраздел: Тип 7				
32	273	6109-0306-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	60.87	7 488	455 795
33	274	233-202-0104РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	62.0874	2 551	158 385
			Итого по подразделу: Тип 7				**614 180**
			Подраздел: Тип 8				
34	281	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	79.26	6 697	530 804
35	282	231-302-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	80.8452	3 513	284 009
			Итого по подразделу: Тип 8				**814 813**
			Подраздел: Тип 9+				
36	292	6111-0403-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	139.03	1 454	202 150
37	293	234-101-0203РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	4.296027	34 448	147 990
			Итого по подразделу: Тип 9+				**350 140**
			Подраздел: Тип 9++				
38	301	6111-0403-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	61.62	1 454	89 595
39	302	234-101-0203РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	1.904058	34 448	65 591
			Итого по подразделу: Тип 9++				**155 186**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: ПОЛЫ /АР-20/				**9 281 485**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				**13 322 968**
			ИТОГО по акту:				**13 322 968**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)			13322968.000 x 7.30%	972 576
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			13322968.000 + 972576.689	14 295 544
			Сметная прибыль, 5.00%			14295544.689 x 5.00%	714 777
			Непредвиденные расходы, 5.000%			14295544.689 x 5.000%	714 777
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				15 725 099
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557			15725099.158 x 1.0557	16 600 987
			НДС (12%)			16600987.181 x 12%	1 992 118
			Итого с НДС			16600987.181 + 1992118.462	18 593 105

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	13.11.2024 06:00
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	14.11.2024 09:34
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	14.11.2024 04:14
Представители заказчика		
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	15.11.2024 08:58
841109402370 - КАРИПЖАНОВА САУЛЕ ЗАМАНБЕКОВНА	Ведущий специалист	18.11.2024 04:03
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	18.11.2024 05:54 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	18.11.2024 09:40 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ ЗИНАТУЛАУЛЫ	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	20.11.2024 04:10

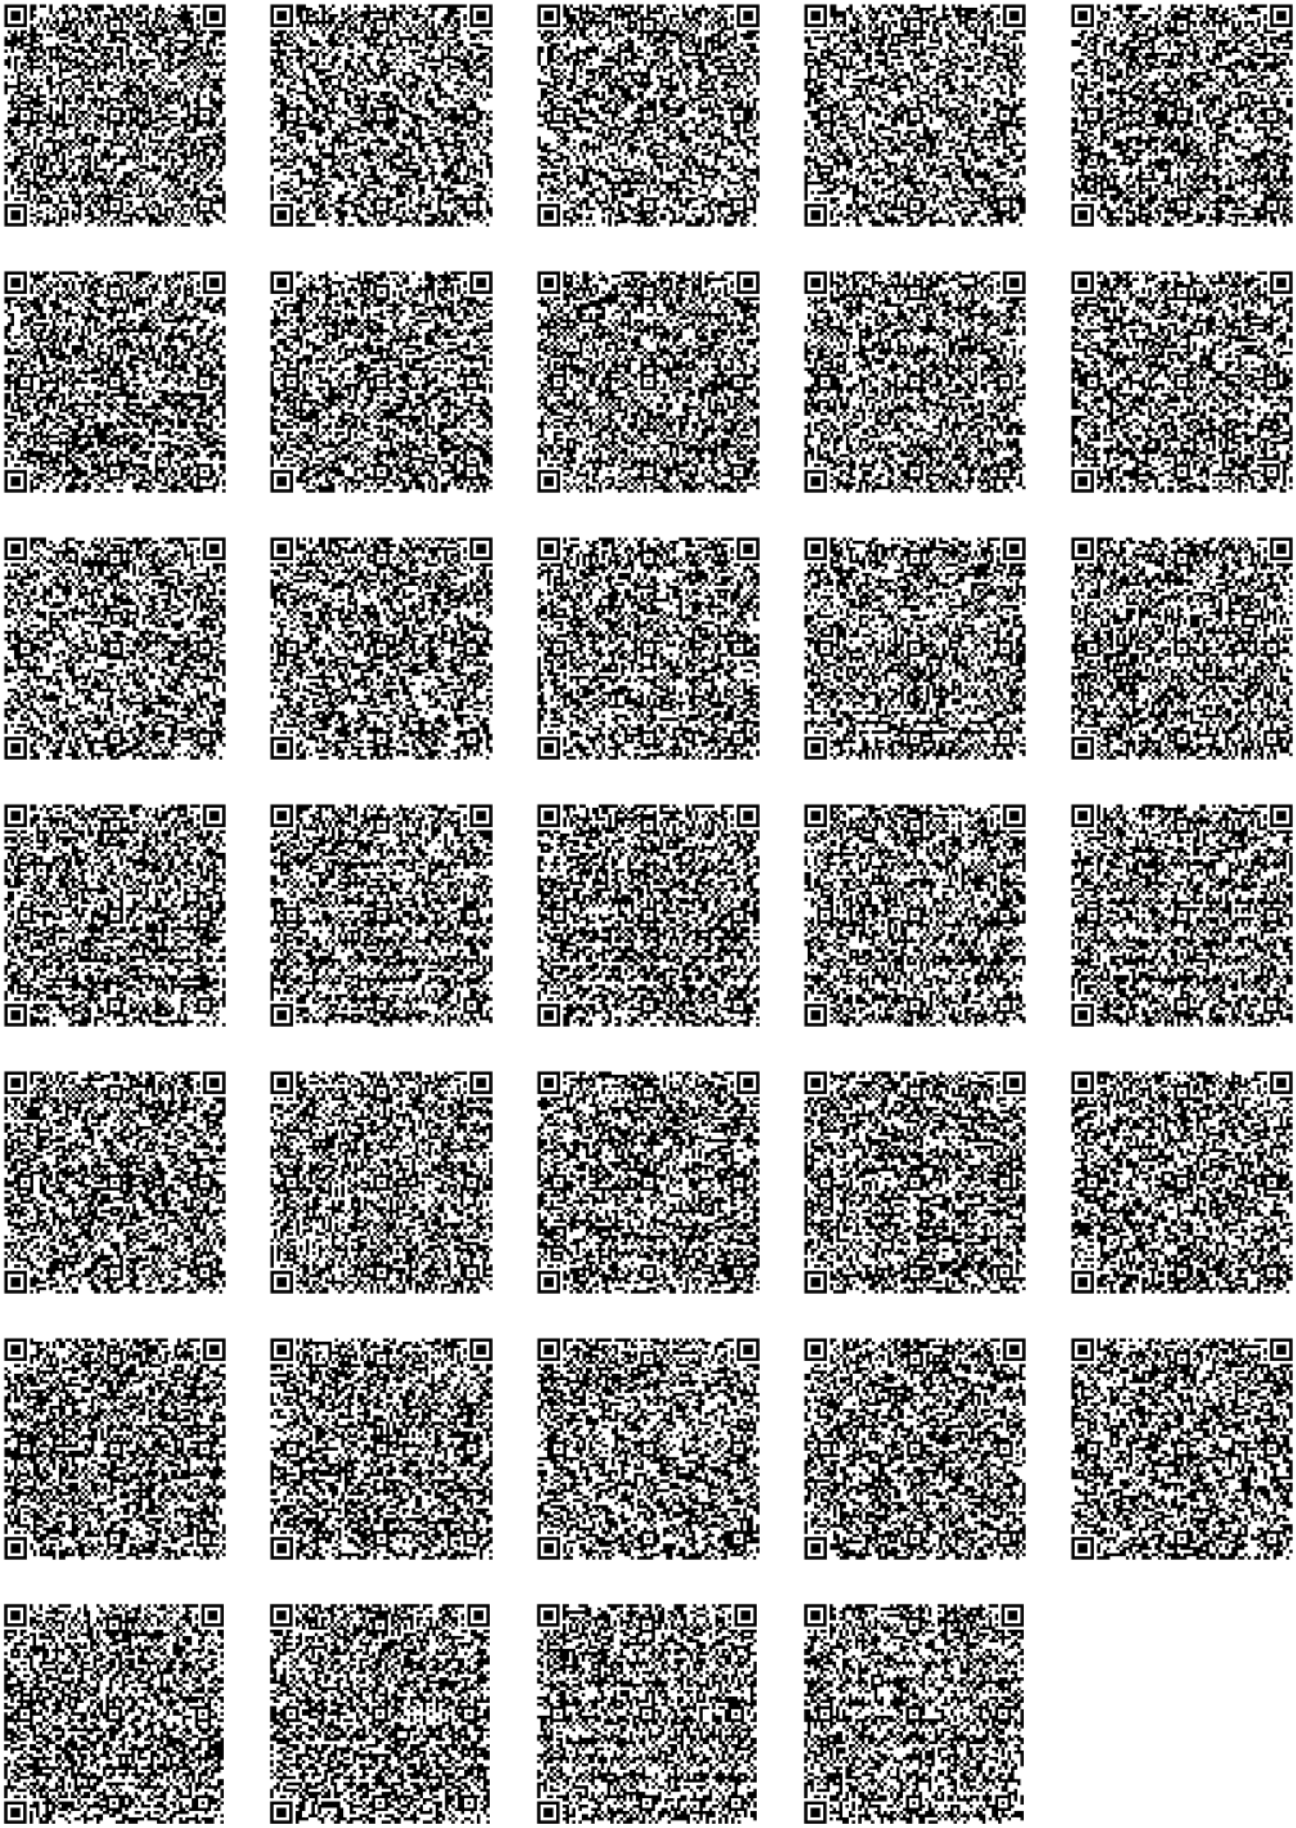

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации НВК				
			Раздел: Система В1				
			Подраздел: Земляные работы				
1	1	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	1512	505	763 560
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	47	9 575	450 025
			Итого по подразделу: Земляные работы				**1 213 585**
			Подраздел: Система В-1				
3	34	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0.3082	1 495 951	461 052
4	35	241-201-0613РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	172.71	2 175	375 644
5	36	241-201-0612РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	52.823	1 456	76 910
6	37	241-201-0608РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	85.749	464	39 788
7	38	6122-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания бетонного	м3	0.5	48 643	24 322
8	40	6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм/Футляр	км	0.014	4 836 062	67 705
9	41	241-201-1213РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	14.14	7 530	106 474

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	42	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	14	5 932	83 048
			Итого по подразделу: Система В-1				**1 234 943**
			Итого по разделу: Система В1				**2 448 528**
			Раздел: Система К1				
			Подраздел: Земляные работы				
11	51	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	1205	505	608 525
12	52	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	37	9 575	354 275
			Итого по подразделу: Земляные работы				**962 800**
			Итого по разделу: Система К1				**962 800**
			Раздел: Жироуловитель л.9				
			Подраздел: Земляные работы				
13	80	6101-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2.	м3	59.42	674	40 049
14	81	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	3	9 575	28 725
15	82	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	52.88	98	5 182
16	83	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м3	52.88	48	2 538
			Итого по подразделу: Земляные работы				**76 494**
			Подраздел: Фундамент ФП1 Том4 Альбом 4.2.2 л.20 GP-11/2023-КЖ2				
17	86	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом/толщ.100 мм	м2	8.7	9 284	80 771
18	87	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	2.3	14 529	33 417
19	88	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.3345	37 216	86 881
20	89	СТТех.частьРСНБ РК 2022	Надбавка водонепроницаемости на W4	М3	2.3345	744	1 738
21	90	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01235	358 976	4 433

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	91	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1481	351 052	51 991
23	92	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.03892	334 939	13 036
24	93	222-509-1003РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.03892	1 179 654	45 912
25	94	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	10.8625	4 272	46 405
26	95	6122-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка жироуловителя вертикального	шт.	1	35 583	35 583
27	96	244-501-0115РСНБ РК 2022	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 6,9 л/с	шт.	1	624 016	624 016
			Итого по подразделу: Фундамент ФП1 Том4 Альбом 4.2.2 л.20 GP-11/2023-КЖ2				**1 024 183**
			Итого по разделу: Жироуловитель л.9				**1 100 677**
			Раздел: Выгреб/Септик л.10				
			Подраздел: Земляные работы				
28	97	6101-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2.	м3	350	674	235 900
29	98	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	11	9 575	105 325
30	99	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	300.57	98	29 455
31	100	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м3	300.57	48	14 427
32	102	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	18	4 166	74 988
			Итого по подразделу: Земляные работы				**460 096**
			Подраздел: Фундамент ФП2 Том4 Альбом 4.2.2 л.20 GP-11/2023-КЖ2				
33	103	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом/толщ.100 мм	м2	33.1	9 284	307 300
34	104	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	8.51	14 529	123 642
35	105	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8.63765	37 216	321 459

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	106	СТТех.частьРСНБ РК 2022	Надбавка водонепроницаемости на W4	М3	8.63765	744	6 429
37	107	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04615	358 976	16 567
38	108	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5551	351 052	194 869
39	109	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0.03324	332 510	11 053
40	110	222-526-0101РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0.03324	997 829	33 168
41	111	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	35.31	4 272	150 844
42	112	1337-0101-0301РСНБ РК 2022	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м3. Монтаж/Септик	шт.	1	72 462	72 462
43	113	РСНБ РК 2022	Емкость накопительная ЛОС-Ем-50С/3,0-7,1/1,91	шт	1	6 612 278	6 612 278
			Итого по подразделу: Фундамент ФП2 Том4 Альбом 4.2.2 л.20 GP-11/2023-КЖ2				**7 850 071**
			Итого по разделу: Выгреб/Септик л.10				**8 310 167**
			Итого по локальной смете: Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации НВК				**12 822 172**
			ИТОГО по акту:				**12 822 172**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	6209894.932 x 7.30%	453 322
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	12822172.932 + 453322.342	13 275 495
	Сметная прибыль, 5.00%	6663217.273 x 5.00%	333 160
	Непредвиденные расходы, 5.000%	13275495.273 x 5.000%	663 774
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		14 272 430
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	14272430.901 x 1.0557	15 067 405
	НДС (12%)	15067405.302 x 12%	1 808 088
	Итого с НДС	15067405.302 + 1808088.636	16 875 493

Лист согласования
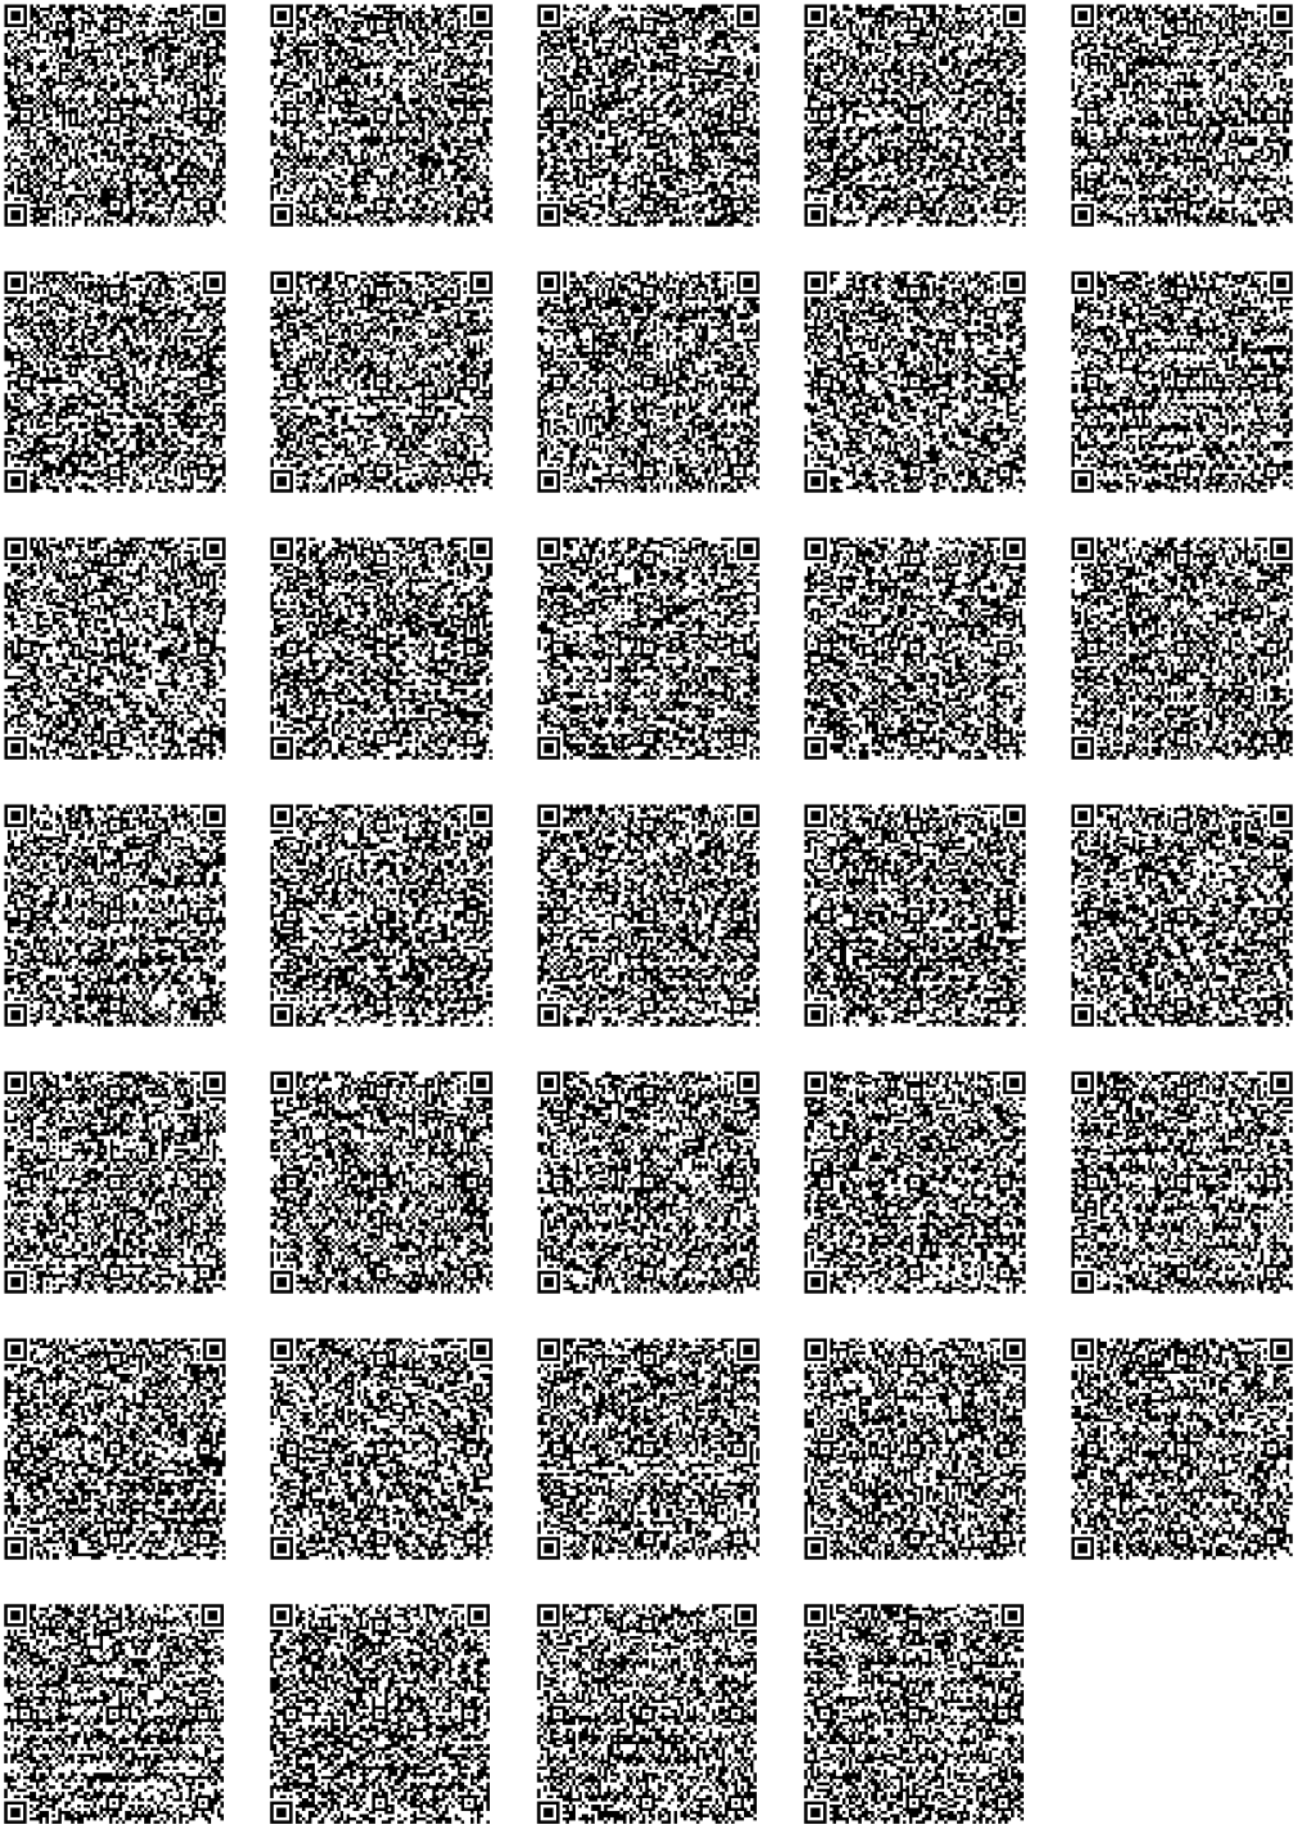
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	25.11.2024 06:24
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	26.11.2024 03:53
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	26.11.2024 03:43
Представители заказчика		
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	26.11.2024 11:27
841109402370 - КАРИПЖАНОВА САУЛЕ ЗАМАНБЕКОВНА	Ведущий специалист	26.11.2024 11:58
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	26.11.2024 12:34 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	26.11.2024 14:08 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ ЗИНАТУЛАУЛЫ	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	28.11.2024 07:45
