Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				
			Раздел: Перегородки Гипсокартонные П-1...П-4 /толщиной 75, 100-125 мм/(АС1 л.13)				
			Подраздел: С111				
1	83	6107-0201-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом	м2	20.62	8 429	173 805
2	84	222-529-0107РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	28.79583	334	9 618
3	85	222-529-0305РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	52.409854	407	21 331
4	86	234-101-0104РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	м3	1.06193	22 190	23 564
			Итого по подразделу: С111				**228 318**
			Подраздел: С112				
5	87	6107-0201-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом /П-5/	м2	112.17	12 447	1 396 180
6	88	222-529-0107РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	84.63	334	28 266
7	89	222-529-0305РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	285.102	407	116 036
8	90	234-101-0104РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	м3	5.78	22 190	128 257
			Итого по подразделу: С112				**1 668 740**
			Итого по разделу: Перегородки Гипсокартонные П-1...П-4 /толщиной 75, 100-125 мм/(АС1 л.13)				**1 897 059**
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС1 л.19)				
			Подраздел: Стены и перегородки				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	122	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	682.65	11 181	7 632 709
			Итого по подразделу: Стены и перегородки				**7 632 709**
			Подраздел: Стены и перегородки				
10	134	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	195.1	11 181	2 181 413
			Итого по подразделу: Стены и перегородки				**2 181 413**
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС1 л.19)				**9 814 122**
			Раздел: ПОЛЫ /АР-20/				
			Подраздел: Тип 1				
11	185	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	213.77	7 916	1 692 203
12	186	233-202-0104РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	218.0454	2 551	556 234
			Итого по подразделу: Тип 1				**2 248 437**
			Подраздел: Тип 2				
13	191	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	235.48	5 903	1 390 038
14	192	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	235.48	3 547	835 248
15	193	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	235.48	7 916	1 864 060
16	194	233-202-0104РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	240.1896	2 551	612 724
			Итого по подразделу: Тип 2				**4 702 070**
			Подраздел: Тип 4				
17	208	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	239.7	6 697	1 605 271
18	209	231-302-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	244.49	3 513	858 893
			Итого по подразделу: Тип 4				**2 464 164**
			Подраздел: Тип 10				
19	334	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20/65/ мм	м2	30.11	2 156	64 917

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	335	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	30.11	1 570	47 273
21	336	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0428074	68 444	2 929
22	337	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0428074	306 062	13 102
23	338	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	30.11	6 697	201 647
24	339	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	30.7122	3 632	111 547
			Итого по подразделу: Тип 10				**441 416**
			Подраздел: Тип 11				
25	340	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20/15/ мм	м2	9.72	2 156	20 955
26	341	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	9.72	-175	-1 701
27	342	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	9.72	6 697	65 095
28	343	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	9.9144	3 632	36 009
			Итого по подразделу: Тип 11				**120 359**
			Подраздел: Тип 12				
29	344	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20/35/ мм	м2	6.31	2 156	13 604
30	345	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	6.31	523	3 300
31	346	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	6.31	6 697	42 258
32	347	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	6.4362	3 632	23 376
			Итого по подразделу: Тип 12				**82 538**
			Подраздел: Тип 10				
33	348	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20/65/ мм	м2	24.7	2 156	53 253

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	349	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	24.7	1 570	38 779
35	350	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.035116	68 444	2 403
36	351	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.035116	306 062	10 748
			Итого по подразделу: Тип 10				**105 183**
			Подраздел: Тип 12				
37	358	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20/35/ мм	м2	17.13	2 156	36 932
38	359	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	17.13	523	8 959
			Итого по подразделу: Тип 12				**45 891**
			Подраздел: Тип 10				
39	362	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20/65/ мм	м2	24.7	2 156	53 253
40	363	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	24.7	1 570	38 779
41	364	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.035116	68 444	2 403
42	365	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.035116	306 062	10 748
43	366	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	24.7	6 697	165 416
44	367	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	25.194	3 632	91 505
			Итого по подразделу: Тип 10				**362 104**
			Подраздел: Тип 11				
45	368	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	24.3	2 156	52 391
46	369	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	24.3	-175	-4 253

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	370	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	24.3	6 697	162 737
48	371	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	24.786	3 632	90 023
			Итого по подразделу: Тип 11				**300 898**
			Подраздел: Тип 12				
49	372	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20/35/ мм	м2	14.36	2 156	30 960
50	373	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	14.36	523	7 510
51	374	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	14.36	6 697	96 169
52	375	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	14.6472	3 632	53 199
			Итого по подразделу: Тип 12				**187 838**
			Подраздел: Тип 10				
53	376	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20/65/ мм	м2	18.07	2 156	38 958
54	377	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	18.07	1 570	28 370
55	378	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0256901	68 444	1 758
56	379	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0256901	306 062	7 863
57	380	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	18.07	6 697	121 015
58	381	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	18.4314	3 632	66 943
			Итого по подразделу: Тип 10				**264 908**
			Подраздел: Тип 11				
59	382	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	10.92	2 156	23 543
60	383	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	10.92	-175	-1 911

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	384	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	10.92	6 697	73 131
62	385	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	11.1384	3 632	40 455
			Итого по подразделу: Тип 11				**135 219**
			Подраздел: Тип 12				
63	386	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20/35/ мм	м2	6.39	2 156	13 777
64	387	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	6.39	523	3 342
65	388	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	6.39	6 697	42 794
66	389	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	6.5178	3 632	23 673
			Итого по подразделу: Тип 12				**83 586**
			Итого по разделу: ПОЛЫ /АР-20/				**11 544 611**
			Раздел: Прочие конструктивные элементы				
			Подраздел: РСтойки СТ-1-9,СТ-2-3, СТ-3-1, СТ-4-2, (АС1 л.40,42)				
67	491	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.426	78 182	33 305
68	492	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.346	1 122 582	388 413
69	493	222-525-0401РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.09	1 131 374	101 823
			Итого по подразделу: РСтойки СТ-1-9,СТ-2-3, СТ-3-1, СТ-4-2, (АС1 л.40,42)				**523 542**
			Подраздел: РБалки металлические Б1-Б40(АС1 л.37-38,42)				
70	497	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1.567	114 656	179 665
71	498	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1.567	50 990	79 901
72	499	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1.577	1 122 582	1 770 311
73	500	222-525-0401РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.399	1 131 374	451 418
			Итого по подразделу: РБалки металлические Б1-Б40(АС1 л.37-38,42)				**2 481 297**
			Итого по разделу: Прочие конструктивные элементы				**3 004 839**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				**26 260 633**
			ИТОГО по акту:				**26 260 633**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				26260633.176 x 7.30%	1 917 026
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				26260633.176 + 1917026.272	28 177 659
		Сметная прибыль, 5.00%				28177659.448 x 5.00%	1 408 882
		Непредвиденные расходы, 5.000%				28177659.448 x 5.000%	1 408 882
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					30 995 425
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				30995425.393 x 1.0557	32 721 870
		НДС (12%)				32721870.588 x 12%	3 926 624
		Итого с НДС				32721870.588 + 3926624.471	36 648 495

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	11.12.2024 08:46
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.12.2024 09:10
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	11.12.2024 10:22
Представители заказчика		
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	11.12.2024 11:57
841109402370 - КАРИПЖАНОВА САУЛЕ ЗАМАНБЕКОВНА	Ведущий специалист	11.12.2024 11:51
880616450648 - ХАРИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	12.12.2024 06:02 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	12.12.2024 16:10 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	исполняющий обязанности директора регионального подразделения Абай, ВКО, Караганда и Улытау	13.12.2024 05:17

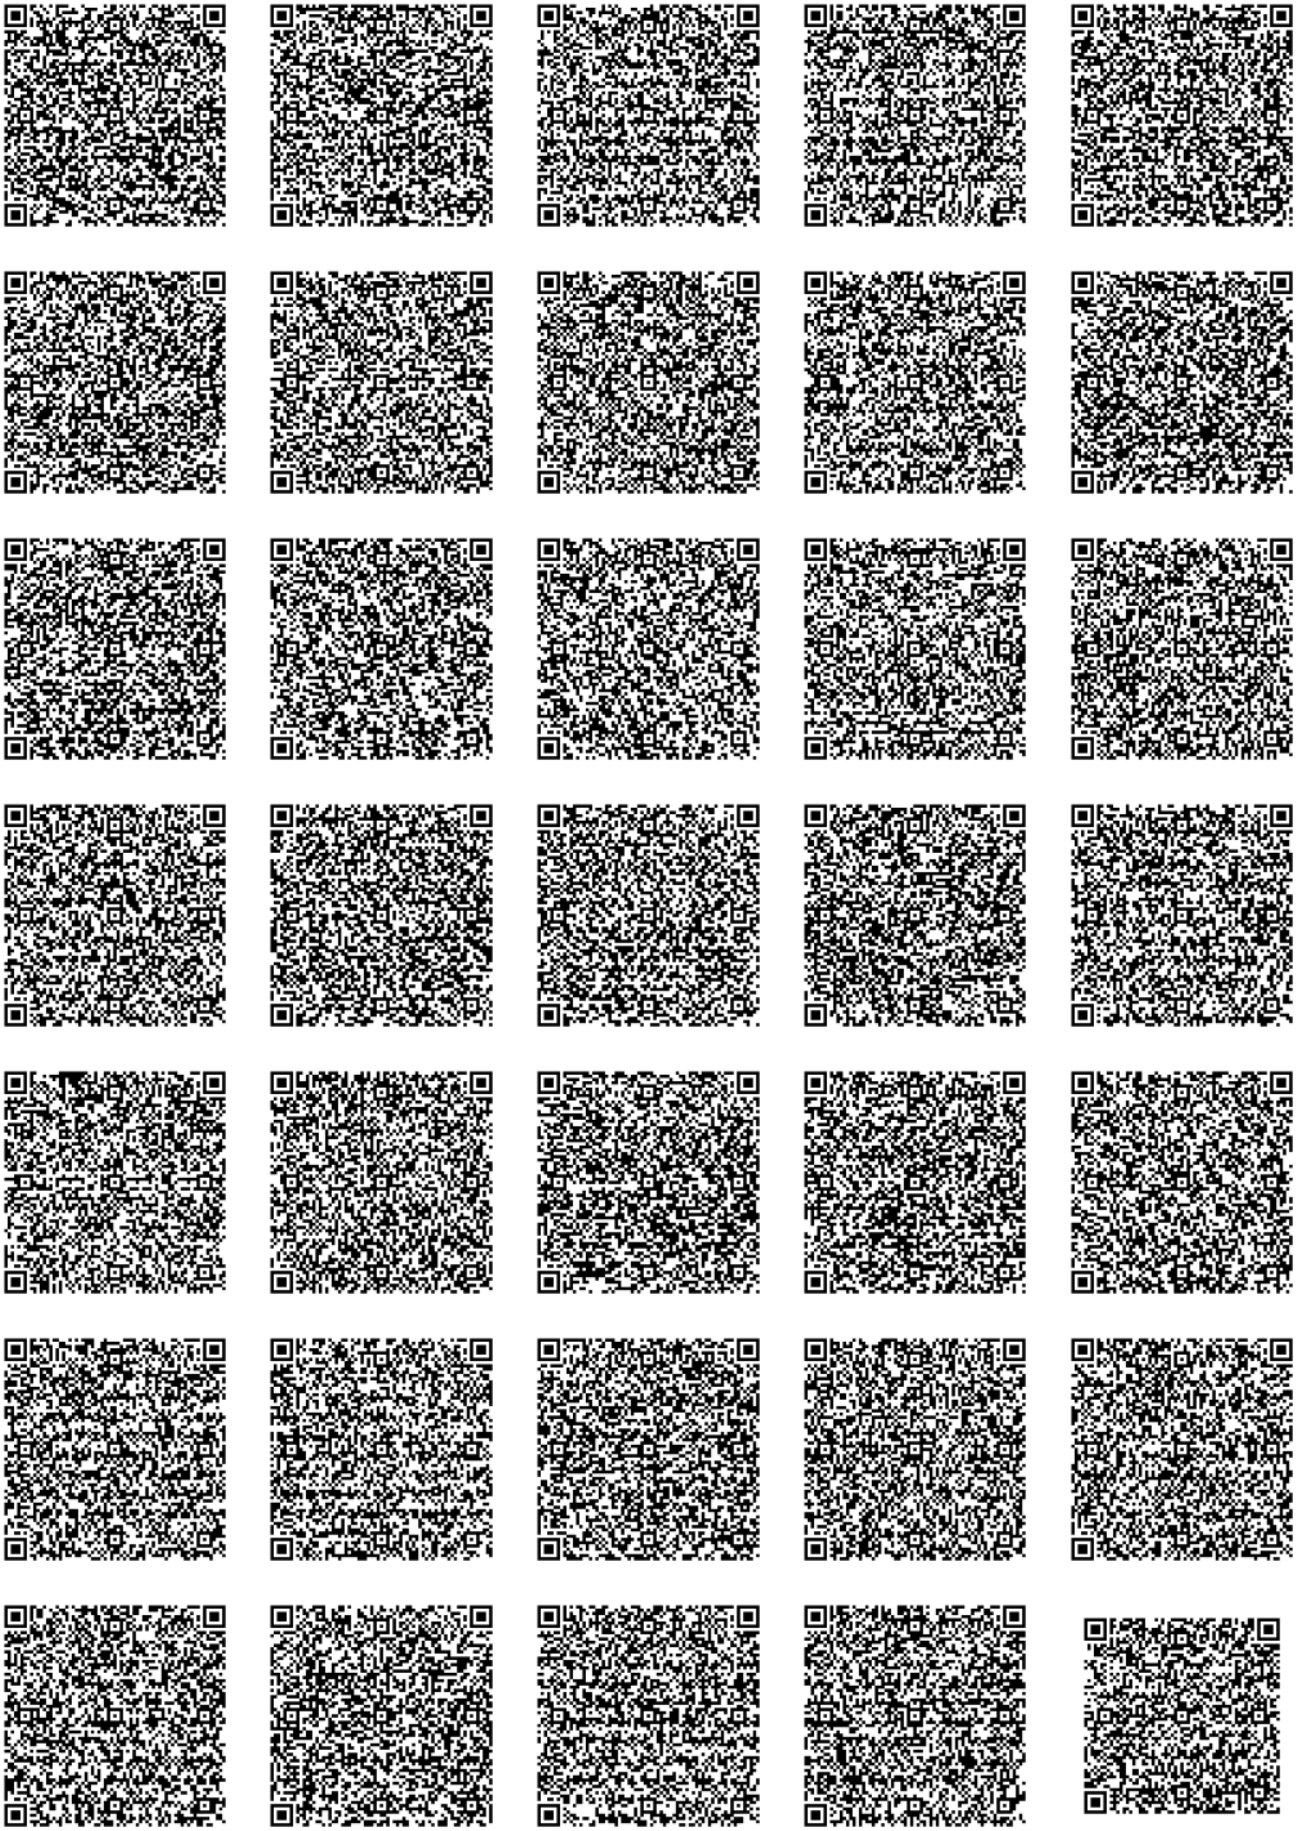

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутреннее инженерное оборудование.Силовое оборудование				
			Раздел: Силовое электрооборудование GP-11/2023-ЭМ				
1	1	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	7	58 990	412 930
2	2	515-301-0301РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1 718 377	1 718 377
3	3	515-301-0301РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1 718 377	1 718 377
4	4	515-301-0553РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3108-21УЗ	шт.	2	638 064	1 276 128
5	5	515-301-0553РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3108-21УЗ	шт.	1	638 064	638 064
6	6	515-301-0305РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	1 576 676	1 576 676
7	7	515-301-0553РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3108-21УЗ	шт.	1	638 064	638 064
			Подраздел: ЩС1.1				
8	8	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
9	9	247-201-0106РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 311	16 311
10	10	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 623	6 623
11	11	247-204-2529РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	2 824	2 824

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6 623	72 853
13	13	247-204-7950РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 50А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	1	9 895	9 895
14	14	247-204-7939РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	1	7 240	7 240
15	15	247-204-7943РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 32А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	1	8 426	8 426
16	16	247-204-7912РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 25А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	2	5 531	11 062
17	17	247-204-7910РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	6	6 239	37 434
			Итого по подразделу: ЩС1.1				**186 724**
			Подраздел: ЩС1.2				
18	18	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
19	19	247-201-0105РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
20	20	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 623	6 623
21	21	247-204-2526РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2 965
22	22	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 623	79 476
23	23	247-204-7939РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	2	7 240	14 480
24	24	247-204-7943РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 32А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	1	8 426	8 426
25	25	247-204-7910РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	7	6 239	43 673
26	26	247-204-0755РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 046	4 092
			Итого по подразделу: ЩС1.2				**187 433**
			Подраздел: ЩС1.3				
27	27	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
28	28	247-201-0205РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 856	14 856

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	16	6 623	105 968
30	30	247-204-2522РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
31	31	247-204-7906РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	15	5 644	84 660
			Итого по подразделу: ЩС1.3				**221 799**
			Подраздел: ЩС1.4				
32	32	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
33	33	247-201-0205РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 856	14 856
34	34	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	17	6 623	112 591
35	35	247-204-2522РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
36	36	247-204-7906РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	16	5 644	90 304
			Итого по подразделу: ЩС1.4				**234 066**
			Подраздел: ЩС1.5				
37	37	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
38	38	247-201-0205РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 856	14 856
39	39	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	13	6 623	86 099
40	40	247-204-2525РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
41	41	247-204-7910РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	10	6 239	62 390
42	42	247-204-0755РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 046	2 046
43	43	247-204-0758РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 151	2 151
			Итого по подразделу: ЩС1.5				**183 857**
			Подраздел: ЩС1.6,7,ЩС2.6				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	3	14 056	42 168
45	45	247-201-0204РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	13 577	40 731
46	46	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	21	6 623	139 083
47	47	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	3	2 259	6 777
48	48	247-204-7910РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	18	6 239	112 302
			Итого по подразделу: ЩС1.6,7,ЩС2.6				**341 061**
			Подраздел: ЩС2.1 ЩС 2.4				
49	49	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	2	14 056	28 112
50	50	247-201-0204РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 577	27 154
51	51	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	16	6 623	105 968
52	52	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	2	2 259	4 518
53	53	247-204-7910РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	14	6 239	87 346
			Итого по подразделу: ЩС2.1 ЩС 2.4				**253 098**
			Подраздел: ЩС2.2				
54	54	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
55	55	247-201-0206РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19 171	19 171
56	56	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	19	6 623	125 837
57	57	247-204-2524РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259
58	58	247-204-7910РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	18	6 239	112 302
			Итого по подразделу: ЩС2.2				**273 625**
			Подраздел: ЩС2.3				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
60	60	247-201-0205РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 856	14 856
61	61	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 623	79 476
62	62	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
63	63	247-204-7910РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	11	6 239	68 629
			Итого по подразделу: ЩС2.3				**179 276**
			Подраздел: ЩС2.5				
64	64	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
65	65	247-201-0204РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 577	13 577
66	66	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 623	59 607
67	67	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
68	68	247-204-7910РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	8	6 239	49 912
			Итого по подразделу: ЩС2.5				**139 411**
			Подраздел: ЩСВ1				
69	69	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
70	70	247-201-0106РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 311	16 311
71	71	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	17	6 623	112 591
72	72	247-204-2526РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2 965
73	73	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	2 016	12 096
74	74	247-204-0758РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	6	2 151	12 906
75	75	247-204-0711РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	647	1 941

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	247-204-3001РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
			Итого по подразделу: ЩСВ1				**178 195**
			Подраздел: ЩСВ2				
77	77	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
78	78	247-201-0104РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
79	79	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 623	33 115
80	80	247-204-0759РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1 964
81	81	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 016	6 048
82	82	247-204-3001РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
			Итого по подразделу: ЩСВ2				**70 980**
			Подраздел: ЩСН				
83	83	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 247	12 247
84	84	247-201-0102РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
85	85	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 623	46 361
86	86	247-204-2522РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
87	87	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1 725
88	88	247-204-7906РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	3	5 644	16 932
			Итого по подразделу: ЩСН				**87 976**
			Итого по разделу: Силовое электрооборудование GP-11/2023-ЭМ				**10 516 117**
			Итого по локальной смете: Внутреннее инженерное оборудование.Силовое оборудование				**10 516 117**
			ИТОГО по акту:				**10 516 117**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				2950431.000 x 7.30%	215 381
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				10516117.000 + 215381.469	10 731 498
		Сметная прибыль, 5.00%				3165812.469 x 5.00%	158 290

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные расходы, 5.000%				10731498.469 x 5.000%	536 574
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					11 426 364
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				11426364.015 x 1.0557	12 062 812
		НДС (12%)				12062812.491 x 12%	1 447 537
		Итого с НДС				12062812.491 + 1447537.499	13 510 349

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	04.12.2024 11:32
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	05.12.2024 08:16
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	04.12.2024 11:55
Представители заказчика		
880616450648 - ХАРИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	12.12.2024 04:41 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	11.12.2024 09:26
841109402370 - КАРИПЖАНОВА САУЛЕ ЗАМАНБЕКОВНА	Ведущий специалист	11.12.2024 11:48
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	12.12.2024 16:08 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	исполняющий обязанности директора регионального подразделения Абай, ВКО, Караганда и Улытау	13.12.2024 04:57

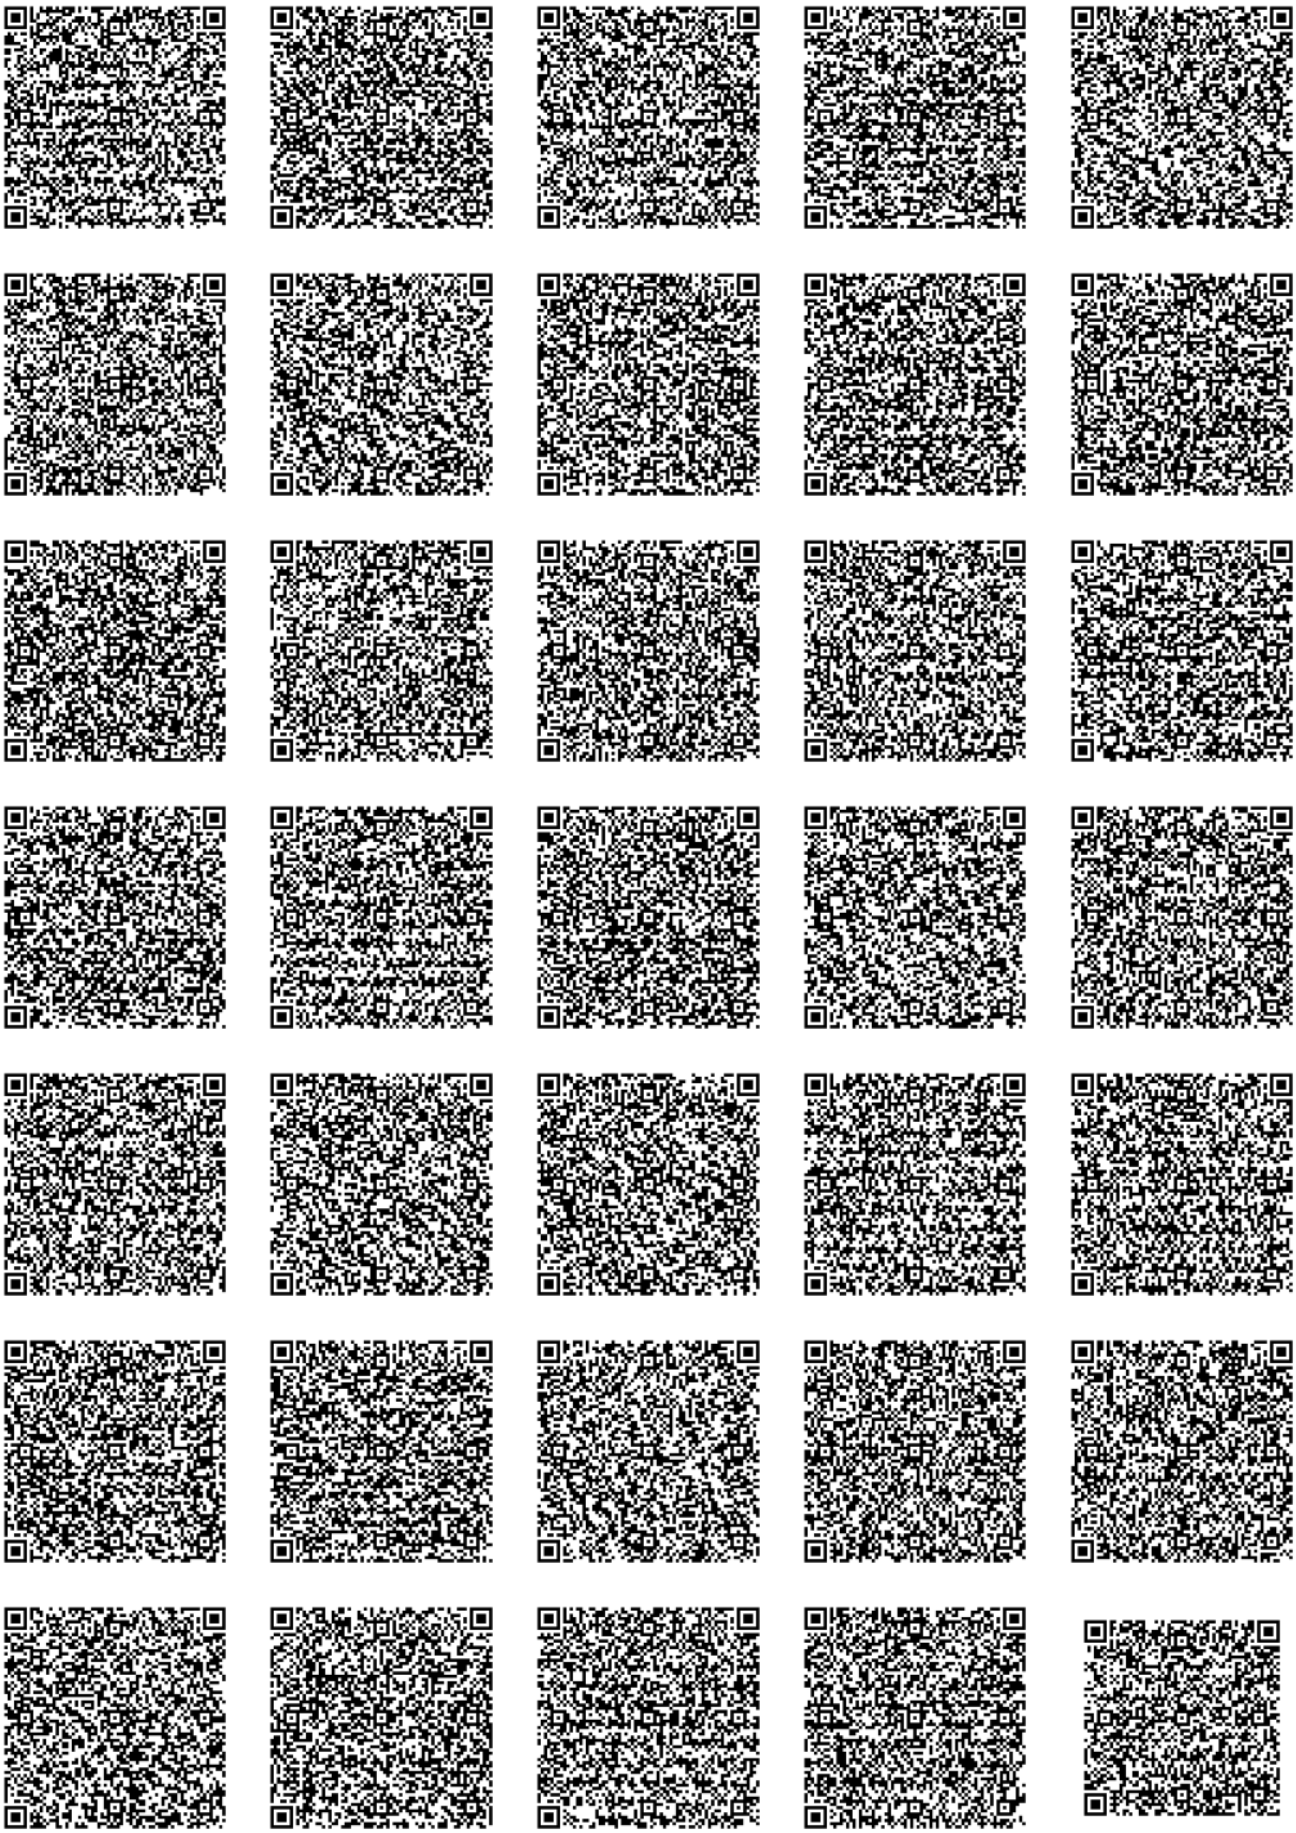

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутреннее инженерное оборудование. Электросвещение				
			Раздел: Силовое электрооборудование GP-11/2023-ЭО.СО				
1	1	6119-0602-0108ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
2	2	247-201-0206РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19 171	19 171
3	3	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 623	6 623
4	4	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
5	5	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	25	6 623	165 575
6	6	247-204-7002РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 1Р 10А "С"	шт.	14	1 360	19 040
7	7	247-204-8208РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63 1Р+N 16А 30 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	8	5 872	46 976
8	8	247-208-1219РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа 2НО 16А 230В	шт.	3	4 624	13 872
9	9	6119-0602-0108ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
10	10	247-201-0206РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19 171	19 171
11	11	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 623	6 623
12	12	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
13	13	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	25	6 623	165 575

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	247-204-7002РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 1Р 10А "С"	шт.	16	1 360	21 760
15	15	247-204-8208РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63 1Р+N 16А 30 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	7	5 872	41 104
16	16	247-208-1219РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа 2НО 16А 230В	шт.	2	4 624	9 248
17	17	6119-0602-0108ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
18	18	247-201-0203РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094	11 094
19	19	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 623	6 623
20	20	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
21	21	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 623	59 607
22	22	247-204-7002РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 1Р 10А "С"	шт.	5	1 360	6 800
23	23	247-204-8208РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63 1Р+N 16А 30 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	4	5 872	23 488
24	24	6119-0602-0108ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
25	25	247-201-0206РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19 171	19 171
26	26	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 623	6 623
27	27	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
28	28	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	28	6 623	185 444
29	29	247-204-7002РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 1Р 10А "С"	шт.	16	1 360	21 760
30	30	247-204-8208РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63 1Р+N 16А 30 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	9	5 872	52 848
31	31	247-208-1219РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа 2НО 16А 230В	шт.	3	4 624	13 872
32	32	6119-0602-0108ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
33	33	247-201-0205РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 856	14 856
34	34	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 623	6 623
35	35	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	23	6 623	152 329
37	37	247-204-7002РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 1Р 10А "С"	шт.	13	1 360	17 680
38	38	247-204-8208РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63 1Р+N 16А 30 мА А 6кА"С" (эл.)	шт.	8	5 872	46 976
39	39	247-208-1219РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа 2НО 16А 230В	шт.	2	4 624	9 248
40	40	6119-0602-0108ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
41	41	247-201-0203РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094	11 094
42	42	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 623	6 623
43	43	247-204-2521РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2 370
44	44	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	13	6 623	86 099
45	45	247-204-7002РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 1Р 10А "С"	шт.	9	1 360	12 240
46	46	247-208-1219РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа 2НО 16А 230В	шт.	4	4 624	18 496
47	47	6119-0602-0108ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14 056	14 056
48	48	247-201-0203РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094	11 094
49	49	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 623	6 623
50	50	247-204-2521РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2 370
51	51	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	13	6 623	86 099
52	52	247-204-7002РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 1Р 10А "С"	шт.	9	1 360	12 240
53	53	247-208-1219РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа 2НО 16А 230В	шт.	4	4 624	18 496
			Итого по разделу: Силовое электрооборудование GP-11/2023-ЭО.СО				**1 573 311**
			Итого по локальной смете: Внутреннее инженерное оборудование. Электросвещение				**1 573 311**
			ИТОГО по акту:				**1 573 311**

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	1573311.000 x 7.30%	114 851
Итого с затратами на организацию и управление СМР	1573311.000 + 114851.706	1 688 162
Сметная прибыль, 5.00%	1688162.706 x 5.00%	84 408
Непредвиденные расходы, 5.000%	1688162.706 x 5.000%	84 408

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					1 856 978
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				1856978.977 x 1.0557	1 960 412
		НДС (12%)				1960412.706 x 12%	235 249
		Итого с НДС				1960412.706 + 235249.525	2 195 662

Лист согласования
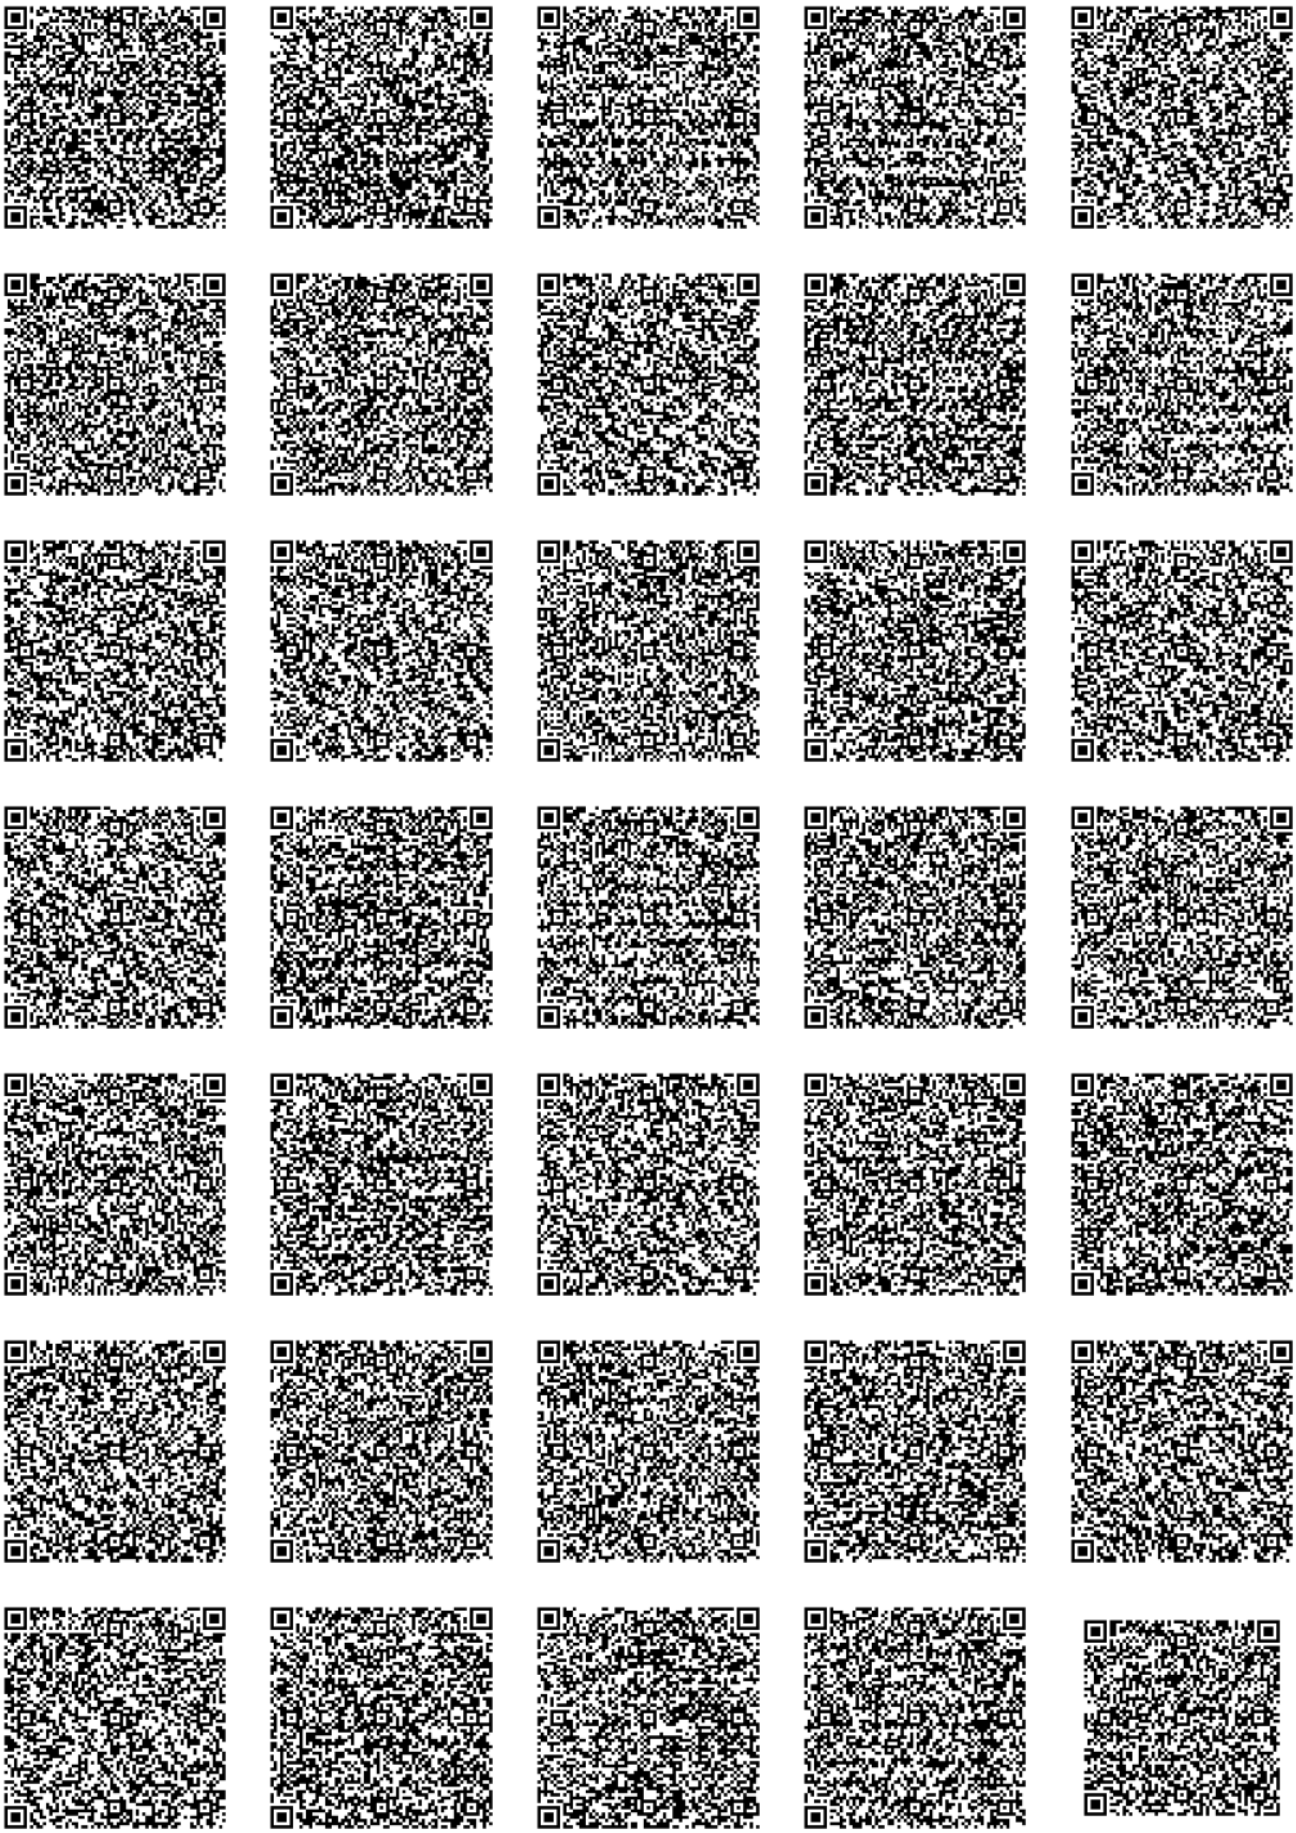
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	11.12.2024 14:06
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	12.12.2024 04:07
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	11.12.2024 14:21
Представители заказчика		
880616450648 - ХАРИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	12.12.2024 09:38 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	13.12.2024 07:45 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	исполняющий обязанности директора регионального подразделения Абай, ВКО, Караганда и Улытау	13.12.2024 07:51
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	12.12.2024 05:20
841109402370 - КАРИПЖАНОВА САУЛЕ ЗАМАНБЕКОВНА	Ведущий специалист	12.12.2024 06:49
