Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "Samruk-Kazyna Construction"**

Подрядчик: **050440003532 - ТОО BI Urban Construction**

Стройка: **Строительство наружных инженерных сетей для здания школы на 2000 ученических мест по адресу мкр. "Самгау" Алатауского района города Алматы**

Договор подряда (контракт) №: **34 от 18.03.2024 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: наружные сети водопровода и канализации				
			Раздел: Противопожарный хоз-питьевой водопровод В1				
			Подраздел: Р Земляные работы				
1	1	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2036.078	530	1 079 121
2	3	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3 (погрузка)	м3 грунта	279.2220037	530	147 988
3	5	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2132.039175	79	168 431
4	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под трубы)	м3 уплотненного грунта	593	660	391 380
5	9	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1500.4056	97	145 539
6	10	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1500.4056	660	990 267
7	11	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	264.7775	3 838	1 016 216
8	12	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	100.7964	10 062	1 014 213
			Итого по подразделу: Р Земляные работы				**4 953 156**
			Подраздел: Р Трубопроводы и арматура				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	13	6121-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0.977	1 749 005	1 708 778
10	14	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	987	3 817	3 767 379
11	15	6121-0301-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм	км	0.977	384 792	375 941
12	16	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0.00663	1 495 927	9 917
13	17	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	6.63	1 227	8 134
14	18	6121-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0.00663	284 177	1 884
15	19	6121-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	5	13 966	69 830
16	20	242-101-2507 СпрСЦ 04.2024	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 150	шт.	5	312 632	1 563 160
17	21	6121-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	3	9 361	28 083
18	22	242-101-2504 СпрСЦ 04.2024	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 80	шт.	3	160 600	481 800
19	23	6121-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	14	8 154	114 156
20	24	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	14	6 996	97 944
21	25	6121-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	3	4 111	12 333
22	26	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	3 152	9 456
			Итого по подразделу: Р Трубопроводы и арматура				**8 248 797**
			Подраздел: Р Установка вантуза в колодце комп.-3шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	35	241-208-0904 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	4 300	12 900
24	36	241-208-1209 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	6 677	6 677
25	40	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	12	4 000	48 000
26	41	241-214-0107 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	3	1 166	3 498
			Итого по подразделу: Р Установка вантуза в колодце комп.-3шт				**71 075**
			Подраздел: Р Футляры				
27	42	6121-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0.229	7 674 100	1 757 369
28	43	241-102-0246 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	229	29 440	6 741 760
29	44	6121-0201-0128 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0.229	14 027 981	3 212 407
30	45	6121-0801-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	229	6 478	1 483 462
			Итого по подразделу: Р Футляры				**13 194 998**
			Подраздел: Р Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 1500 /7 шт/				
31	52	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Колодцы круглые из сборного железобетона д-1500 мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7.908	81 022	640 722
32	54	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	46 395	278 370
33	55	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	17 515	140 120
34	56	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	25 622	204 976
35	57	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	40 815	163 260

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	58	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	3 227	16 135
37	59	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	40 352	242 112
38	60	6104-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0.295747	258 333	76 401
39	61	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.295747	1 197 980	354 299
40	62	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	т	0.15498	1 146 761	177 725
41	64	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20.28	277	5 617
42	65	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20.28	419	8 497
43	66	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57.79	4 286	247 687
			Итого по подразделу: Р Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 1500 /7 шт/				**2 555 924**
			Подраздел: Р Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 1000 /4 шт/				
44	67	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Колодцы круглые из сборного железобетона д-2000 мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3.68	81 022	298 161
45	69	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	23 834	95 336
46	70	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	12	11 469	137 628
47	71	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	16 451	49 353
48	72	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	4	14 787	59 148
49	73	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	40 352	161 408

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	74	6104-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0.20288	258 333	52 411
51	75	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.05072	1 197 980	60 761
52	76	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	т	0.11022	1 146 761	126 396
53	78	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14.0895	277	3 903
54	80	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38.6848	4 286	165 803
			Итого по подразделу: Р Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 1000 /4 шт/				**1 210 309**
			Подраздел: Р Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 2000 /1 шт/				
55	81	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Колодцы круглые из сборного железобетона д-2000 мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.771	81 919	145 078
56	82	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	115 588	115 588
57	83	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	29 677	29 677
58	84	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	82 374	82 374
59	85	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352	40 352
60	86	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	т	0.02674	1 146 761	30 664
61	87	6104-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0.0172	258 333	4 443
62	88	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0172	1 197 980	20 605
63	89	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.074825	277	297
			Итого по подразделу: Р Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 2000 /1 шт/				**469 079**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Р Упоры по трассе				
64	102	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	938.79	92	86 368
65	103	6121-0601-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм	шт.	2	41 539	83 078
			Итого по подразделу: Р Упоры по трассе				**169 446**
			Итого по разделу: Противопожарный хоз-питьевой водопровод В1				**30 872 788**
			Раздел: Канализация бытовая К1				
			Подраздел: Р Земляные работы				
66	109	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	73.144	530	38 766
67	111	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3 (погрузка)	м3 грунта	2.26	530	1 197
68	113	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	75.406	79	5 957
69	114	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под трубы)	м3 уплотненного грунта	11.35	660	7 491
70	117	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	47.15	97	4 573
71	118	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	47.15	660	31 118
72	119	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8.32	3 838	31 932
73	120	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3.5572	10 062	35 792
			Итого по подразделу: Р Земляные работы				**156 829**
			Подраздел: Р Трубопроводы и арматура				
74	121	6122-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм	км	0.01907	2 489 865	47 481
75	122	241-701-0103 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	19.07	6 195	118 138

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	123	6121-0301-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 200 мм	км	0.01907	160 312	3 056
			Итого по подразделу: Р Трубопроводы и арматура				**168 676**
			Подраздел: Р Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 1500 /1 шт/				
77	124	6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3.869	93 461	361 601
78	125	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	46 395	46 395
79	126	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25 622	51 244
80	127	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	40 815	40 815
81	128	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23 039
82	129	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.0195	1 146 761	22 362
83	130	6104-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0.0484	258 333	12 503
84	131	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0484	1 197 980	57 981
85	132	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3.0555	277	845
86	134	6121-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0.008	7 674 100	61 393
87	135	241-102-0246 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	8	29 440	235 520
88	136	6121-0201-0128 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0.008	14 027 981	112 224
89	137	6121-0801-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 150 мм	м	8	6 478	51 824
			Итого по подразделу: Р Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 1500 /1 шт/				**1 077 748**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Р Перепад в колодце				
90	145	6122-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	1	101 911	101 911
			Итого по подразделу: Р Перепад в колодце				**101 911**
			Подраздел: Вскрытие и восстановления существующего асфальтового покрытия				
91	146	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	0.708	11 441	8 100
92	148	7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 /6/см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	17.7	2 298	40 675
93	149	7101-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	17.7	37	655
94	150	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	17.7	2 349	41 577
			Итого по подразделу: Вскрытие и восстановления существующего асфальтового покрытия				**91 007**
			Итого по разделу: Канализация бытовая К1				**1 596 173**
			Итого по локальной смете: наружные сети водопровода и канализации				**32 468 961**
			ИТОГО по акту:				**32 468 961**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.600%)	32468961.382 x 6.60%	2 142 951
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	32468961.382 + 2142951.420	34 611 912
	Сметная прибыль, 5.00%	34611912.802 x 5.00%	1 730 595
	Непредвиденные расходы, 5.000%	34611912.802 x 5.000%	1 730 595
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		38 073 104
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 3 кв 2024, к = 1.0557	38073104.082 x 1.0557	40 193 775
	НДС (12%)	40193775.980 x 12%	4 823 253
	Итого с НДС	40193775.980 + 4823253.118	45 017 029

Лист согласования
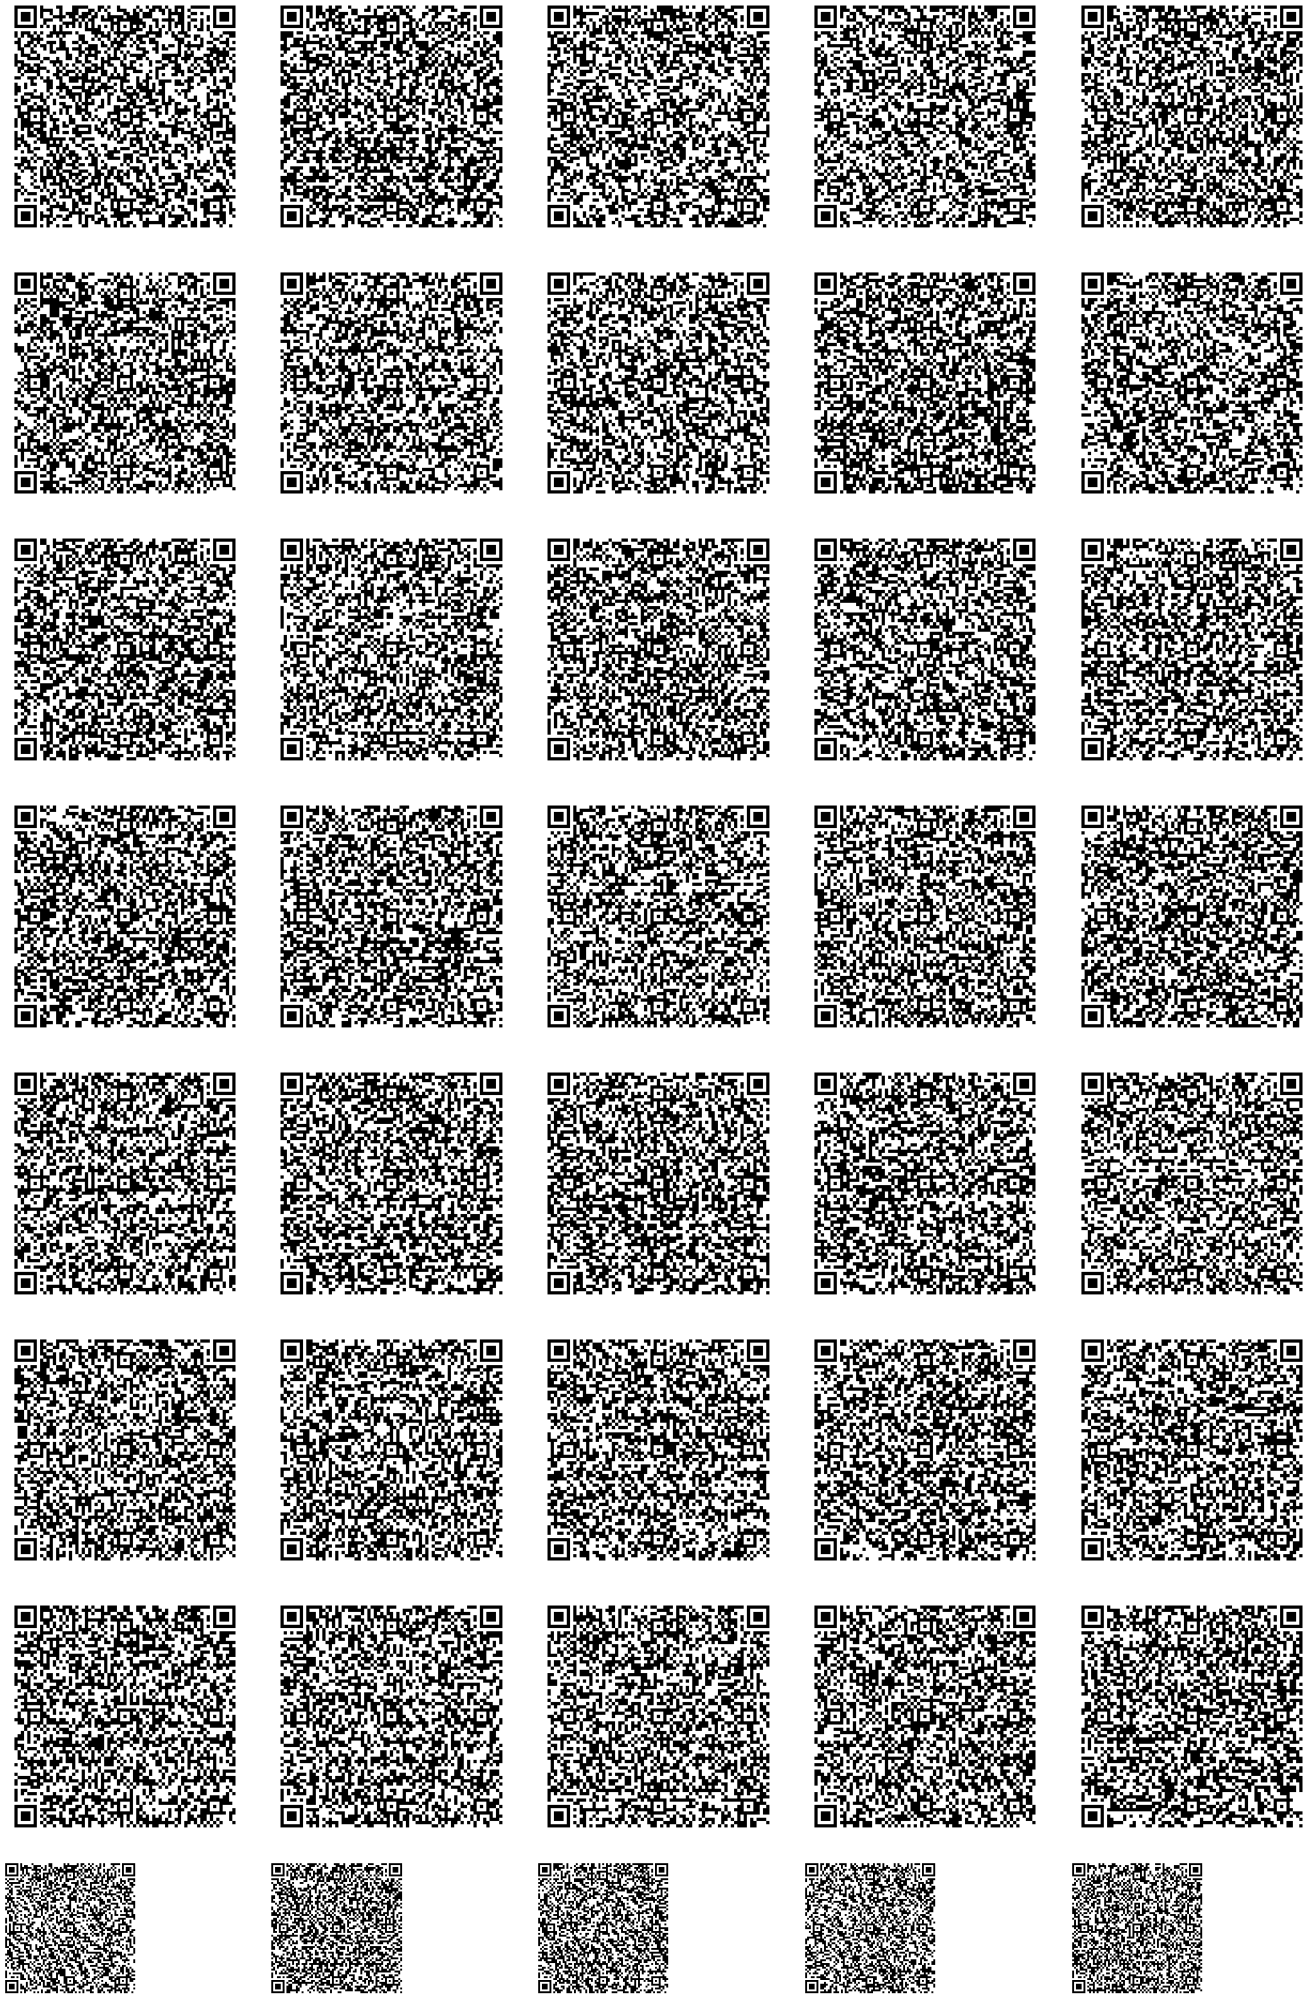
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860720301675 - САГАНДЫКОВ АСКАР АШИМХАНОВИЧ	Руководитель Проекта	23.01.2025 07:10
Представители технического надзора		
900531300352 - РЫСКЕЛЬДИЕВ АБАЙ КУАНЫШБАЙУЛЫ	Эксперт технического надзора	29.01.2025 14:26
Представители авторского надзора		
530104300322 - АХМЕДОВ РАХЫМБЕК АХМЕДОВИЧ	Специалист авторского надзора	27.01.2025 07:57
Представители заказчика		
820617400814 - КОЛОМИЕЦ АННА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист ПТО	31.01.2025 05:59
790519401613 - ДАУТОВА ДИНА АПЛОТОНОВНА	Ведущий специалист сметчик	31.01.2025 12:00 Комментарий: Расценки верны
601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ ТУРСУНОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Жамбылской, Кызылординской областям и городу Алматы	31.01.2025 12:01
940811301835 - ОСПАНОВ ОЛЖАС ЖАНАТОВИЧ	Ведущий специалист	31.01.2025 05:51
780629403041 - ИСАКОЖА СААДАТ НУСИПОВНА	Ведущий эксперт	31.01.2025 06:07 Комментарий: Расценки верны
890331300418 - ҚОЖАТАЙ БЕРІК ҚУАНДЫҚҰЛЫ	Руководитель регионального подразделения по г.Алматы	31.01.2025 10:48
