*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Июль 2024 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Земляные работы,фундаменты** | | | | |
| | | | **Отдел: Блок №1** | | | | |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | |
| | | | **Подраздел: Блоки** | | | | |
| 1 | 22 | 6104-0202-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т | шт. | 37 | 5 338 | 197 506 |
| 2 | 23 | 6104-0202-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т | шт. | 31 | 5 853 | 181 443 |
| 3 | 24 | 6104-0202-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т | шт. | 158 | 7 869 | 1 243 302 |
| 4 | 25 | 221-102-0101РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 101.224 | 57 613 | 5 831 818 |
| 5 | 26 | СТРСНБ РК 2022 | Надбавка на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе | м3 | 101.224 | 284 | 28 747 |
| 6 | 27 | СТССЦРСНБ РК 2022 | Надбавка к стоимости бетонных блоков из тяжелого бетона класса В7,5 на водонепронмцаемость W4 | м3 | 101.224 | 405 | 41 038 |
| | | | **Итого по подразделу: Блоки** | | | | **7 523 855** |
| | | | **Подраздел: Монолитный пояс** | | | | |
| 7 | 32 | 6103-0401-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 65.6 | 10 606 | 695 753 |
| 8 | 33 | 6103-0401-0202ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Армирование армированного пояса железобетонного | т | 0.86523 | 96 263 | 83 289 |
| 9 | 34 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.72203 | 326 417 | 235 682 |
| 10 | 35 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1432 | 344 590 | 49 345 |
| 11 | 36 | 6103-0401-0203ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья" | м3 | 13.12 | 11 862 | 155 629 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 37 | 212-101-2003РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W4 | м3 | 13.3168 | 23 373 | 311 253 |
| 13 | 38 | 6103-0401-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 65.6 | 6 646 | 435 977 |
| | | | **Итого по подразделу: Монолитный пояс** | | | | **1 966 931** |
| | | | **Итого по разделу: Фундаменты** | | | | **9 490 787** |
| | | | **Итого по отделу: Блок №1** | | | | **9 490 787** |
| | | | **Отдел: Блок №2** | | | | |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | |
| | | | **Подраздел: Блоки** | | | | |
| 14 | 145 | 6104-0202-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т | шт. | 23 | 5 338 | 122 774 |
| 15 | 146 | 6104-0202-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т | шт. | 31 | 7 869 | 243 939 |
| 16 | 147 | 221-102-0101РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 21.318 | 57 613 | 1 228 193 |
| 17 | 148 | СТРСНБ РК 2022 | Надбавка на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе | м3 | 21.318 | 284 | 6 054 |
| 18 | 149 | СТССЦРСНБ РК 2022 | Надбавка к стоимости бетонных блоков из тяжелого бетона класса В7,5 на водонепронмцаемость W4 | м3 | 21.318 | 405 | 8 642 |
| | | | **Итого по подразделу: Блоки** | | | | **1 609 603** |
| | | | **Итого по разделу: Фундаменты** | | | | **1 609 603** |
| | | | **Итого по отделу: Блок №2** | | | | **1 609 603** |
| | | | **Отдел: Блок №3** | | | | |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | |
| | | | **Подраздел: Блоки** | | | | |
| 19 | 196 | 6104-0202-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т | шт. | 97 | 5 338 | 517 786 |
| 20 | 197 | 6104-0202-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т | шт. | 51 | 5 853 | 298 503 |
| 21 | 198 | 6104-0202-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т | шт. | 127 | 7 869 | 999 363 |
| 22 | 199 | 221-102-0101РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 101.391 | 57 613 | 5 841 439 |
| 23 | 200 | СТРСНБ РК 2022 | Надбавка на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе | м3 | 101.391 | 284 | 28 795 |
| 24 | 201 | СТССЦРСНБ РК 2022 | Надбавка к стоимости бетонных блоков из тяжелого бетона класса В7,5 на водонепронмцаемость W4 | м3 | 101.391 | 405 | 41 105 |
| | | | **Итого по подразделу: Блоки** | | | | **7 726 992** |
| | | | **Подраздел: Монолитный пояс** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | 206 | 6103-0401-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 65.85 | 10 606 | 698 405 |
| 26 | 207 | 6103-0401-0202ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Армирование армированного пояса железобетонного | т | 0.62776 | 96 263 | 60 430 |
| 27 | 208 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.48301 | 326 417 | 157 662 |
| 28 | 209 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.14475 | 344 590 | 49 879 |
| 29 | 210 | 6103-0401-0203ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья" | м3 | 13.17 | 11 862 | 156 222 |
| 30 | 211 | 212-101-2003РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W4 | м3 | 13.36755 | 23 373 | 312 439 |
| 31 | 212 | 6103-0401-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 65.85 | 6 646 | 437 639 |
| | | | **Итого по подразделу: Монолитный пояс** | | | | **1 872 678** |
| | | | **Итого по разделу: Фундаменты** | | | | **9 599 671** |
| | | | **Итого по отделу: Блок №3** | | | | **9 599 671** |
| | | | **Отдел: Блок №4** | | | | |
| | | | **Раздел: Земляные работы** | | | | |
| | | | **Подраздел: Блоки** | | | | |
| 32 | 274 | 6104-0202-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т | шт. | 51 | 5 338 | 272 238 |
| 33 | 275 | 6104-0202-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т | шт. | 51 | 5 853 | 298 503 |
| 34 | 276 | 6104-0202-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т | шт. | 191 | 7 869 | 1 502 979 |
| 35 | 277 | 221-102-0101РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 127.173 | 57 613 | 7 326 818 |
| 36 | 278 | СТРСНБ РК 2022 | Надбавка на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе | м3 | 127.173 | 284 | 36 117 |
| 37 | 279 | СТССЦРСНБ РК 2022 | Надбавка к стоимости бетонных блоков из тяжелого бетона класса В7,5 на водонепронмцаемость W4 | м3 | 127.173 | 405 | 51 558 |
| | | | **Итого по подразделу: Блоки** | | | | **9 488 213** |
| | | | **Подраздел: Монолитный пояс** | | | | |
| 38 | 284 | 6103-0401-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 88.3 | 10 606 | 936 509 |
| 39 | 285 | 6103-0401-0202ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Армирование армированного пояса железобетонного | т | 0.84321 | 96 263 | 81 169 |
| 40 | 286 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.65221 | 326 417 | 212 892 |
| 41 | 287 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.191 | 344 590 | 65 816 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42 | 288 | 6103-0401-0203ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья" | м3 | 17.66 | 11 862 | 209 482 |
| 43 | 289 | 212-101-2003РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W4 | м3 | 17.9249 | 23 373 | 418 958 |
| 44 | 290 | 6103-0401-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 88.3 | 6 646 | 586 841 |
| | | | **Итого по подразделу: Монолитный пояс** | | | | **2 511 672** |
| | | | **Итого по разделу: Земляные работы** | | | | **11 999 885** |
| | | | **Итого по отделу: Блок №4** | | | | **11 999 885** |
| | | | **Отдел: Блок №5** | | | | |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | |
| | | | **Подраздел: Блоки** | | | | |
| 45 | 407 | 6104-0202-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т | шт. | 88 | 5 338 | 469 744 |
| 46 | 408 | 6104-0202-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т | шт. | 56 | 5 853 | 327 768 |
| 47 | 409 | 6104-0202-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т | шт. | 117 | 7 869 | 920 673 |
| 48 | 410 | 221-102-0101РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 95.531 | 57 613 | 5 503 827 |
| 49 | 411 | СТРСНБ РК 2022 | Надбавка на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе | м3 | 95.531 | 284 | 27 130 |
| 50 | 412 | СТССЦРСНБ РК 2022 | Надбавка к стоимости бетонных блоков из тяжелого бетона класса В7,5 на водонепроницаемость W4 | м3 | 95.531 | 405 | 38 730 |
| | | | **Итого по подразделу: Блоки** | | | | **7 287 873** |
| | | | **Подраздел: Монолитный пояс** | | | | |
| 51 | 417 | 6103-0401-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 67.85 | 10 606 | 719 617 |
| 52 | 418 | 6103-0401-0202ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Армирование армированного пояса железобетонного | т | 0.91021 | 96 263 | 87 619 |
| 53 | 419 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.74121 | 326 417 | 241 943 |
| 54 | 420 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.169 | 344 590 | 58 235 |
| 55 | 421 | 6103-0401-0203ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья" | м3 | 13.57 | 11 862 | 160 967 |
| 56 | 422 | 212-101-2003РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W4 | м3 | 13.77355 | 23 373 | 321 929 |
| 57 | 423 | 6103-0401-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 67.85 | 6 646 | 450 931 |
| | | | **Итого по подразделу: Монолитный пояс** | | | | **2 041 243** |
| | | | **Итого по разделу: Фундаменты** | | | | **9 329 117** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по отделу: Блок №5** | | | | **9 329 117** |
| | | | **Отдел: Блок №6** | | | | |
| | | | **Раздел: Земляные работы** | | | | |
| | | | **Подраздел: Блоки** | | | | |
| 58 | 477 | 6104-0202-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т | шт. | 101 | 5 338 | 539 138 |
| 59 | 478 | 6104-0202-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т | шт. | 54 | 5 853 | 316 062 |
| 60 | 479 | 6104-0202-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т | шт. | 153 | 7 869 | 1 203 957 |
| 61 | 480 | 221-102-0101РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 117.084 | 57 613 | 6 745 560 |
| 62 | 481 | СТРСНБ РК 2022 | Надбавка на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе | м3 | 117.084 | 284 | 33 251 |
| 63 | 482 | СТССЦРСНБ РК 2022 | Надбавка к стоимости бетонных блоков из тяжелого бетона класса В7,5 на водонепронмцаемость W4 | м3 | 117.084 | 405 | 47 468 |
| | | | **Итого по подразделу: Блоки** | | | | **8 885 437** |
| | | | **Подраздел: Монолитный пояс** | | | | |
| 64 | 487 | 6103-0401-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 81.25 | 10 606 | 861 737 |
| 65 | 488 | 6103-0401-0202ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Армирование армированного пояса железобетонного | т | 1.11747 | 96 263 | 107 571 |
| 66 | 489 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.9027 | 326 417 | 294 656 |
| 67 | 490 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.21477 | 344 590 | 74 007 |
| 68 | 491 | 6103-0401-0203ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья" | м3 | 16.25 | 11 862 | 192 757 |
| 69 | 492 | 212-101-2003РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W4 | м3 | 16.49375 | 23 373 | 385 508 |
| 70 | 493 | 6103-0401-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 81.25 | 6 646 | 539 987 |
| | | | **Итого по подразделу: Монолитный пояс** | | | | **2 456 226** |
| | | | **Итого по разделу: Земляные работы** | | | | **11 341 663** |
| | | | **Итого по отделу: Блок №6** | | | | **11 341 663** |
| | | | **Отдел: Блок №7** | | | | |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | |
| | | | **Подраздел: Блоки** | | | | |
| 71 | 650 | 6104-0202-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т | шт. | 41 | 5 338 | 218 858 |
| 72 | 651 | 6104-0202-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т | шт. | 49 | 7 869 | 385 581 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73 | 652 | 221-102-0101РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 34.602 | 57 613 | 1 993 525 |
| 74 | 653 | СТРСНБ РК 2022 | Надбавка на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе | м3 | 34.602 | 284 | 9 826 |
| 75 | 654 | СТРСНБ РК 2022 | Надбавка к стоимости бетонных блоков из тяжелого бетона класса В7,5 на водонепронмцаемость W4 | м3 | 34.602 | 405 | 14 028 |
| | | | **Итого по подразделу: Блоки** | | | | **2 621 819** |
| | | | **Итого по разделу: Фундаменты** | | | | **2 621 819** |
| | | | **Итого по отделу: Блок №7** | | | | **2 621 819** |
| | | | **Отдел: Блок №9** | | | | |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | |
| | | | **Подраздел: Блоки** | | | | |
| 76 | 787 | 6104-0202-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т | шт. | 67 | 5 338 | 357 646 |
| 77 | 788 | 6104-0202-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т | шт. | 36 | 5 853 | 210 708 |
| 78 | 789 | 6104-0202-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т | шт. | 116 | 7 869 | 912 804 |
| 79 | 790 | 221-102-0101РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 85.593 | 57 613 | 4 931 269 |
| 80 | 791 | СТРСНБ РК 2022 | Надбавка на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе | м3 | 85.593 | 284 | 24 308 |
| 81 | 792 | СТССЦРСНБ РК 2022 | Надбавка к стоимости бетонных блоков из тяжелого бетона класса В7,5 на водонепронмцаемость W4 | м3 | 85.593 | 405 | 34 701 |
| | | | **Итого по подразделу: Блоки** | | | | **6 471 437** |
| | | | **Подраздел: Монолитный пояс** | | | | |
| 82 | 797 | 6103-0401-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 56.3 | 10 606 | 597 117 |
| 83 | 798 | 6103-0401-0202ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Армирование армированного пояса железобетонного | т | 0.63465 | 96 263 | 61 093 |
| 84 | 799 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.4396 | 326 417 | 143 492 |
| 85 | 800 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.19505 | 344 590 | 67 212 |
| 86 | 801 | 6103-0401-0203ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья" | м3 | 11.26 | 11 862 | 133 566 |
| 87 | 802 | 212-101-2003РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W4 | м3 | 11.4289 | 23 373 | 267 127 |
| 88 | 803 | 6103-0401-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 56.3 | 6 646 | 374 169 |
| | | | **Итого по подразделу: Монолитный пояс** | | | | **1 643 779** |
| | | | **Итого по разделу: Фундаменты** | | | | **8 115 216** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по отделу: Блок №9** | | | | **8 115 216** |
| | | | **Отдел: Блок №10** | | | | |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | |
| | | | **Подраздел: Блоки** | | | | |
| 89 | 884 | 6104-0202-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т | шт. | 92 | 5 338 | 491 096 |
| 90 | 885 | 6104-0202-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т | шт. | 50 | 5 853 | 292 650 |
| 91 | 886 | 6104-0202-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т | шт. | 132 | 7 869 | 1 038 708 |
| 92 | 887 | 221-102-0101РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 102.866 | 57 613 | 5 926 418 |
| 93 | 888 | СТРСНБ РК 2022 | Надбавка на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе | м3 | 102.866 | 284 | 29 213 |
| 94 | 889 | СТССЦРСНБ РК 2022 | Надбавка к стоимости бетонных блоков из тяжелого бетона класса В7,5 на водонепронмцаемость W4 | м3 | 102.866 | 405 | 41 703 |
| | | | **Итого по подразделу: Блоки** | | | | **7 819 790** |
| | | | **Подраздел: Монолитный пояс** | | | | |
| 95 | 894 | 6103-0401-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 66.7 | 10 606 | 707 420 |
| 96 | 895 | 6103-0401-0202ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Армирование армированного пояса железобетонного | т | 0.64248 | 96 263 | 61 847 |
| 97 | 896 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.48698 | 326 417 | 158 958 |
| 98 | 897 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1455 | 344 590 | 50 137 |
| 99 | 898 | 6103-0401-0203ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья" | м3 | 13.94 | 11 862 | 165 356 |
| 100 | 899 | 212-101-2003РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W4 | м3 | 14.1491 | 23 373 | 330 706 |
| 101 | 900 | 6103-0401-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 66.7 | 6 646 | 443 288 |
| | | | **Итого по подразделу: Монолитный пояс** | | | | **1 917 715** |
| | | | **Итого по разделу: Фундаменты** | | | | **9 737 505** |
| | | | **Итого по отделу: Блок №10** | | | | **9 737 505** |
| | | | **Итого по локальной смете: Земляные работы,фундаменты** | | | | **73 845 271** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **73 845 271** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%) | 73845271.112 x 9.40% | 6 941 455 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 73845271.112 + 6941455.203 | 80 786 726 |
| | Сметная прибыль, 5.00% | 80786726.315 x 5.00% | 4 039 336 |
| | Непредвиденные расходы, 5.000% | 80786726.315 x 5.000% | 4 039 336 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | | | | 88 865 398 |
| | | НДС (12%) | | | | 88865398.946 x 12% | 10 663 847 |
| | | **Итого с НДС** | | | | 88865398.946 + 10663847.874 | 99 529 246 |

**Лист согласования**
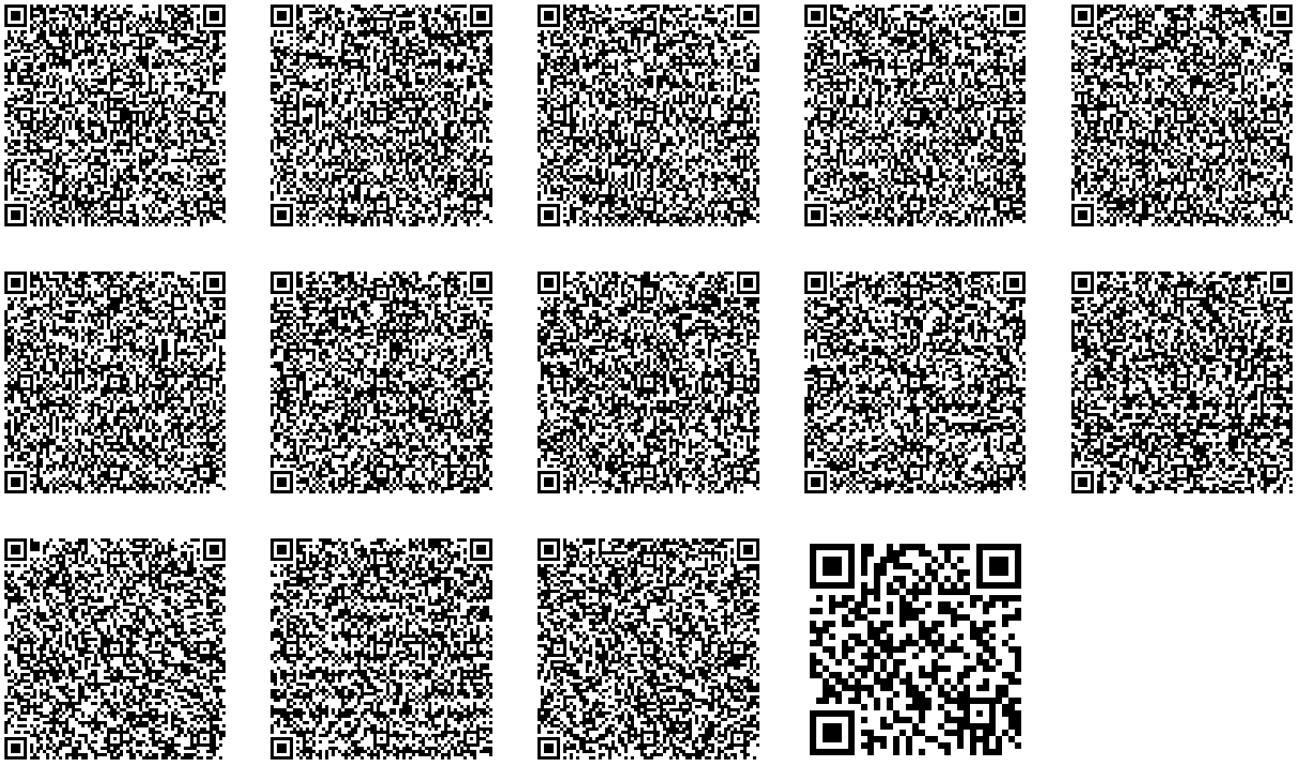
| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ | Генеральный директор | 19.07.2024 08:16:55 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ | Технический надзор | 19.07.2024 08:24:33 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ | Авторский надзор | 19.07.2024 08:28:17 |
| **Представители заказчика** | | |
| 630828300151 - ЖАСАҒАНБЕРГЕН СӘРСЕНБАЙ ӘЛІМҰЛЫ | Региональный руководитель | 19.07.2024 11:08:21 |
| 720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ | Директор регионального подразделения | 19.07.2024 13:38:29 |
| 950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ | Ведущий специалист | 19.07.2024 09:51:45 |
| 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА | Начальник отдела смет и ценообразования | 19.07.2024 12:21:43 |
| 561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА | сметчик | 19.07.2024 10:29:07 |
