Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Блочно модульная трансорматорная подстанция				
			Раздел: Архитектурно-строительная часть				
			Подраздел: Земляные работы				
1	1	6101-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м3,группа грунта 2	м3	35.7245213	393	14 040
2	2	6101-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами,группа грунта 2	м3	3.9693913	5 828	23 134
3	5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м3	3.9693913	4 156	16 497
4	6	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	35.7245213	67	2 394
5	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м3	35.7245213	656	23 434
			Итого по подразделу: Земляные работы				**79 500**
			Подраздел: Монолитная плита основания				
6	8	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщиной 200мм	м2	18.9	18 128	342 619
7	9	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	70.225	5 467	383 920
8	10	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	22.6	14 521	328 175

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	11	212-101-2304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W10	м3	22.939	27 807	637 865
10	12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.6667	326 417	544 039
11	13	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0.37774	87 149	32 920
12	14	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.37774	338 700	127 941
			Итого по подразделу: Монолитная плита основания				**2 397 479**
			Подраздел: Блоки бетонные				
13	15	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	39	5 853	228 267
14	16	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	50	5 338	266 900
15	17	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	24.727	57 613	1 424 597
16	18	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	1.17	21 305	24 927
17	19	212-101-2304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W10	м3	1.18755	27 807	33 022
			Итого по подразделу: Блоки бетонные				**1 977 713**
			Итого по разделу: Архитектурно-строительная часть				**4 454 692**
			Раздел: Комплектное оборудование				
18	32	6124-0101-1401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий,мощность трансформатора до 6300 кВ·А	шт.	1	6 896 742	6 896 742
19	33	515-102-1408 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная двухтрансформаторная блочного типа,в составе силовые масляные трансформаторы,класс напряжения 10 (6) кВ типа 2БКТП 1000/6(10)-0,4кВ,номинальная мощность 1000 кВА,ток электродинамической стойкости 51 кА	комплект	1	100 173 945	100 173 945
20	34	6124-0301-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка электрической машины переменного или постоянного тока,с подшипниками стояковыми,с горизонтальным валом,поступающей в собранном виде,масса до 3 т	шт.	1	299 940	299 940
21	35	515-103-0114 СпрСЦ 04.2024	Дизель-генератор модель GEN SD 132,марка Generg,с АВР в кожухе,мощность 132 кВа/105 кВт,50 Гц/4Р	шт.	1	11 668 311	11 668 311
			Итого по разделу: Комплектное оборудование				**119 038 938**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по локальной смете: Блочно модульная трансорматорная подстанция				**123 493 630**
			ИТОГО по акту:				**123 493 630**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)				11651374.000 x 9.40%	1 095 229
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				123493630.000 + 1095229.112	124 588 859
		Сметная прибыль, 5.00%				124588859.112 x 5.00%	637 330
		Непредвиденные расходы, 5.000%				124588859.112 x 5.000%	6 229 442
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					131 455 632
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368				131455632.223 x 1.0368	136 293 199
		НДС (12%)				136293199.489 x 12%	16 355 183
		Итого с НДС				136293199.489 + 16355183.939	152 648 383

Лист согласования
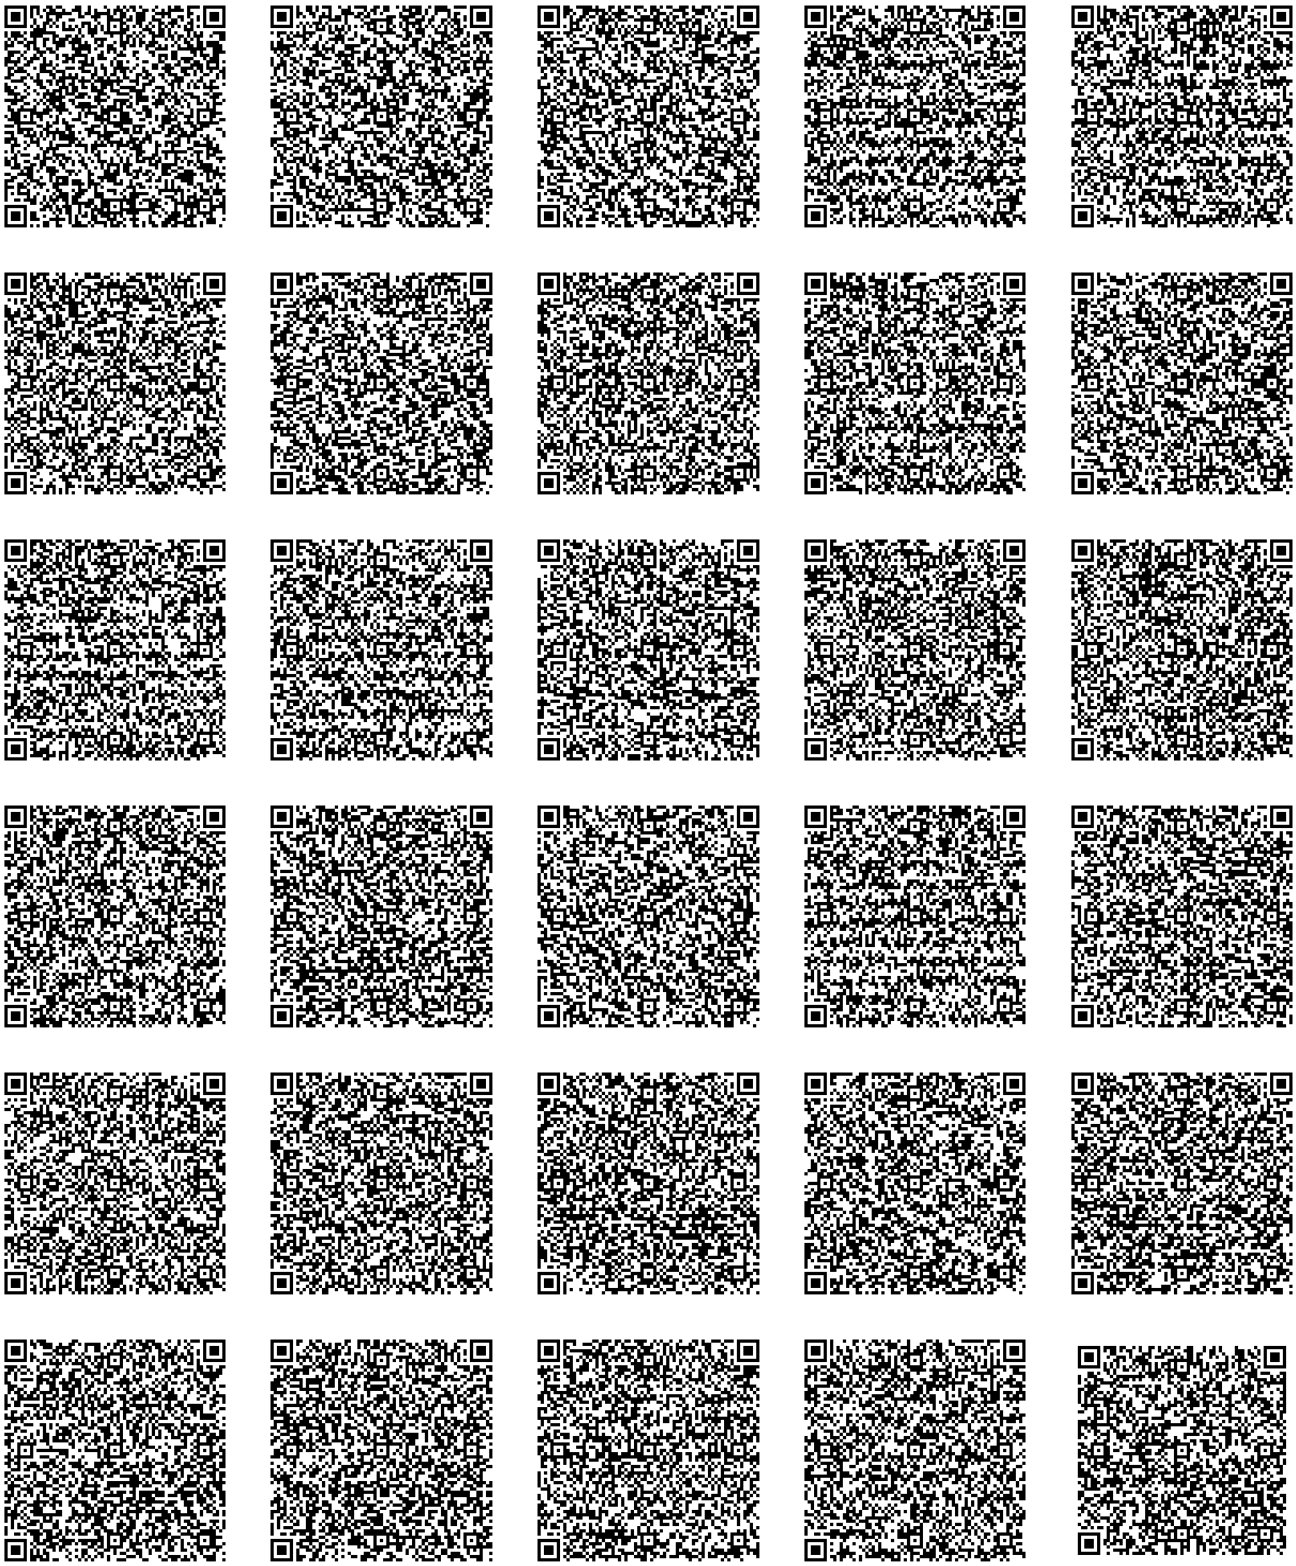
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	31.07.2024 03:19:28
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	31.07.2024 05:23:26
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	31.07.2024 06:11:11
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	31.07.2024 09:07:08
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	31.07.2024 07:15:50
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	31.07.2024 06:51:09
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	31.07.2024 10:10:32
