Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания АР				
			Раздел: Кровля				
			Подраздел: Р Тип кровли №1 /АР 10/				
1	55	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	3668.21	403	1 478 289
2	56	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	4035.031	120	484 204
3	57	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	476.8673	45 368	21 634 516
4	58	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	3668.21	403	1 478 289
5	59	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	4035.031	120	484 204
6	60	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм	м2	3668.21	1 761	6 459 718
7	61	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	3668.21	993	3 642 533
8	62	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	6.4193675	68 239	438 050

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	63	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6.4193675	382 476	2 455 254
10	64	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	3668.21	3 671	13 465 999
11	65	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	755.65126	63 122	47 698 219
12	66	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	3668.21	2 336	8 568 939
13	67	224-103-1201 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3668.21	8 166	29 954 603
14	68	6110-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных/цементно-стружечных листов	м2	3668.21	2 900	10 637 809
15	69	232-104-0102 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	м2	7483.1484	2 170	16 238 431
16	70	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	м2	3668.21	1 025	3 759 915
17	71	235-103-0401 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	4218.4415	1 657	6 989 958
18	72	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя,марки ЭКП-5,2	м2	4218.4415	2 858	12 056 306
			Итого по подразделу: Р Тип кровли №1 /АР 10/				**187 925 238**
			Подраздел: Р Тип кровли №2				
19	73	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	157.18	403	63 344
20	74	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	172.898	120	20 748
21	75	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	157.18	3 671	577 008
22	76	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	32.37908	63 122	2 043 832

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	77	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	20.4334	45 368	927 022
24	78	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм	м2	157.18	1 761	276 794
25	79	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	157.18	993	156 080
26	80	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.275065	68 239	18 770
27	81	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.275065	382 476	105 206
28	82	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	м2	157.18	1 025	161 110
29	83	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	157.18	798	125 430
30	84	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0,полиэстер,пленка/пленка	м2	542.271	1 210	656 148
31	85	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя,марки ЭКП-5,2	м2	180.757	2 858	516 604
			Итого по подразделу: Р Тип кровли №2				**5 648 096**
			Итого по разделу: Кровля				**193 573 334**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания АР				**193 573 334**
			ИТОГО по акту:				**193 573 334**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)	193573334.000 x 9.40%	18 195 892
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	193573334.000 + 18195892.658	211 769 226
	Сметная прибыль, 5.00%	211769226.658 x 5.00%	10 588 461
	Непредвиденные расходы, 5.000%	211769226.658 x 5.000%	10 588 461
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		232 946 149
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	232946149.323 x 1.0368	241 518 567
	НДС (12%)	241518567.618 x 12%	28 982 228
	Итого с НДС	241518567.618 + 28982228.114	270 500 795

Лист согласования
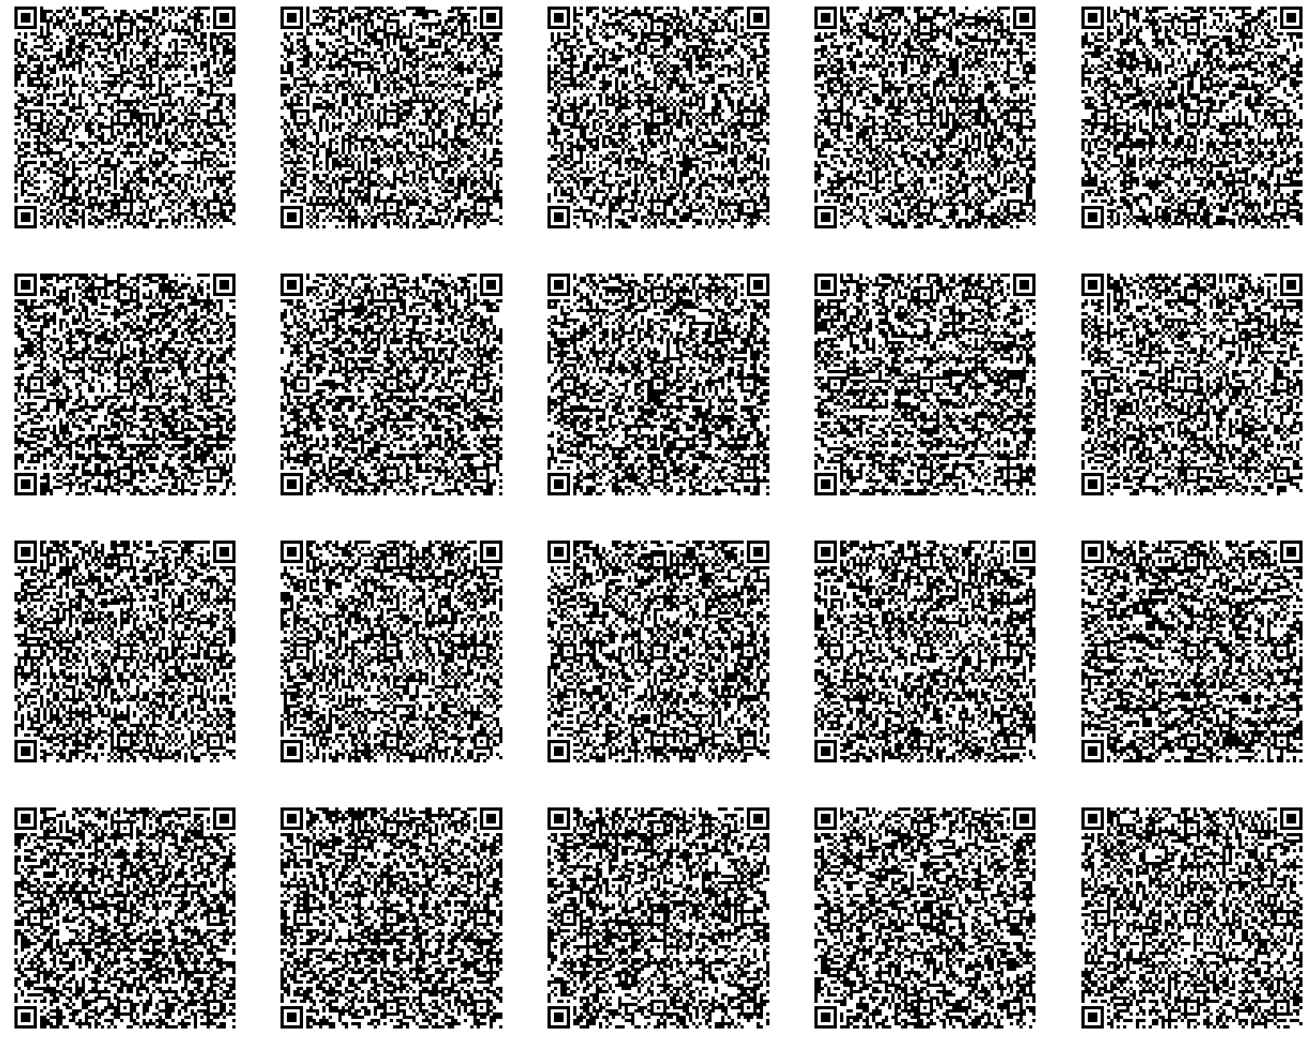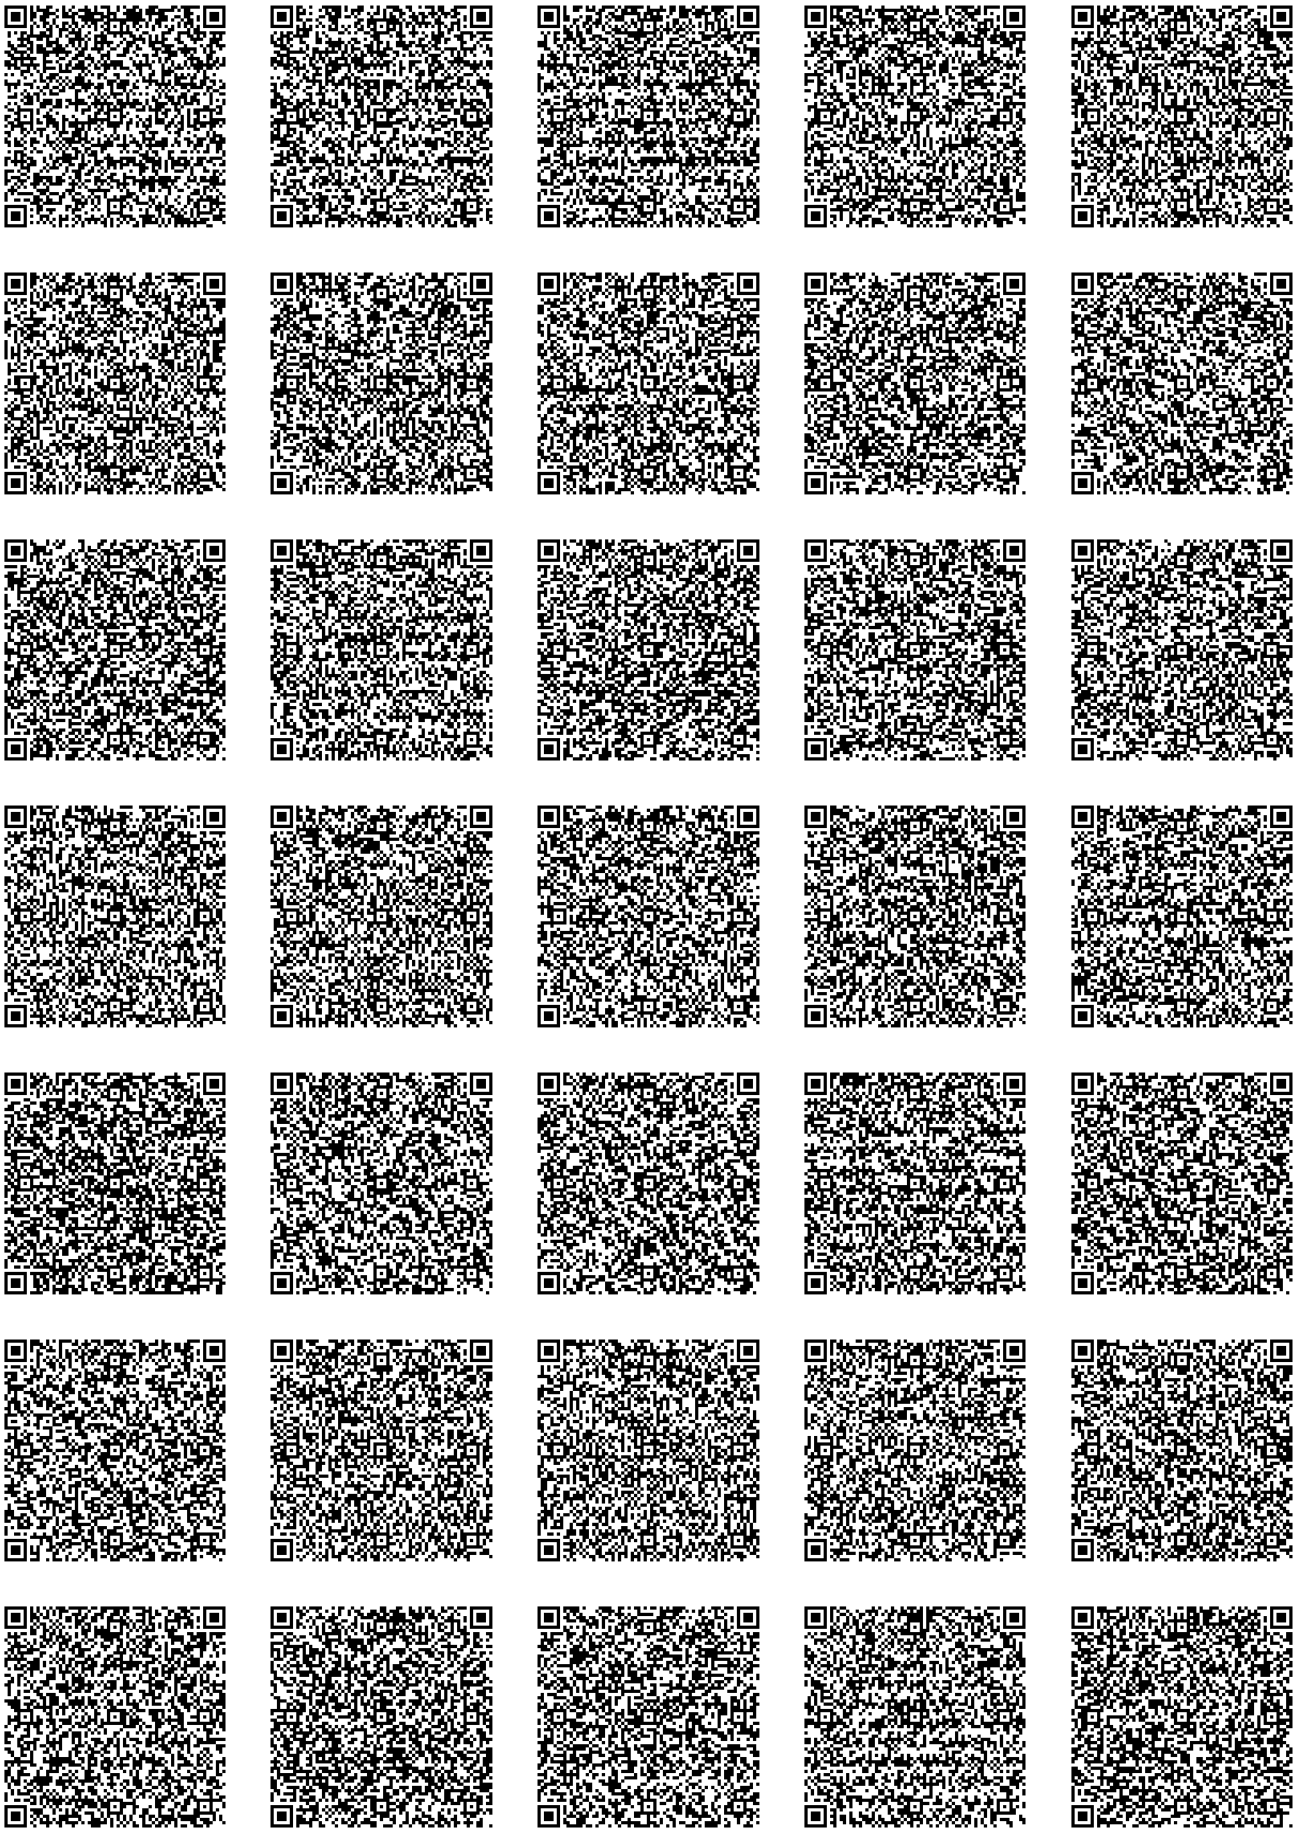
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	31.07.2024 02:09:06
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	31.07.2024 05:00:31
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	31.07.2024 02:23:18
Представители заказчика		
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	31.07.2024 07:35:07
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	31.07.2024 07:58:49
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	31.07.2024 07:32:50
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	31.07.2024 10:42:20
