Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания АР				
			Раздел: Фасад /АР 17/				
1	238	6112-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями,с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м2	6973	5 300	36 956 900
2	239	231-102-0401 СпрСЦ 04.2024	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	м2	3092.7047	6 249	19 326 311
3	240	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	6973	1 739	12 126 047
4	241	234-101-0110 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	711.246	39 491	28 087 816
5	242	231-103-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана фасадная,негорючая,ветрозащитная,на основе стеклоткани,сила растяжения 1400/1000,водоотталкивание - не менее 90%,паропроницаемость - 0,08 мг/(м.ч.ПА)	м2	7182.19	561	4 029 209
6	243	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м2	6973	2 223	15 500 979
7	244	231-305-0502 СпрСЦ 04.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм,шириной от 900 до 6000 мм,толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	7670.3	4 897	37 561 459
			Подраздел: Утепление стен подвала и техподполья				
8	245	6111-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м2	763.34	2 945	2 248 036

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	246	234-102-0302 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	39.31201	35 441	1 393 257
			Итого по подразделу: Утепление стен подвала и техподполья				**3 641 293**
			Подраздел: Утепление стен тамбуров				
10	247	6111-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м2	166.12	2 945	489 222
11	248	234-101-0110 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	17.1083	39 491	675 624
			Итого по подразделу: Утепление стен тамбуров				**1 164 847**
			Подраздел: Утепление парапетов				
12	249	6111-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м2	95.85	2 945	282 278
13	250	234-101-0110 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	4.936275	39 491	194 938
			Итого по подразделу: Утепление парапетов				**477 216**
			Подраздел: Утепление вентшахт				
14	252	6111-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м2	12.6051	2 945	37 122
15	253	234-101-0110 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	2.22	39 491	87 670
			Итого по подразделу: Утепление вентшахт				**124 792**
			Итого по разделу: Фасад /АР 17/				**158 996 869**
			Раздел: Окна /АР 53/				
			Подраздел: ОК-1 --- ОК-4,ОК-8,ОК-17,ОК-18				
16	264	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	1127.17	8 284	9 337 476
17	265	223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	1127.17	49 309	55 580 257
			Итого по подразделу: ОК-1 --- ОК-4,ОК-8,ОК-17,ОК-18				**64 917 733**
			Подраздел: ОК-5--ОК-6,ОК-9--ОК-10,ОК-16				
18	266	6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	11.004	9 424	103 702

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	267	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	22.135	7 099	157 136
20	268	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	33.139	52 984	1 755 862
			Итого по подразделу: ОК-5--ОК-6,ОК-9--ОК-10,ОК-16				**2 016 700**
			Подраздел: ОК-7				
21	269	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	3.322	7 099	23 583
22	270	223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3.322	45 657	151 673
			Итого по подразделу: ОК-7				**175 256**
			Подраздел: ОК-11				
23	271	6108-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м2,глухой	м2	16.29	10 866	177 007
24	272	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	м2	16.29	36 958	602 059
25	273	217-402-0103 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	16.29	-10 673	-173 863
26	274	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	16.29	3 006	48 968
			Итого по подразделу: ОК-11				**654 171**
			Подраздел: ОК-12				
27	275	6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	1.965	9 424	18 518
28	276	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	1.965	51 022	100 259
			Итого по подразделу: ОК-12				**118 777**
			Подраздел: ОК-13				
29	277	6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	1.703	9 424	16 048
30	278	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	1.703	52 754	89 842

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	279	217-402-0103 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	1.703	-10 673	-18 176
32	280	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	1.703	3 006	5 119
			Итого по подразделу: ОК-13				**92 834**
			Подраздел: ОК-14				
33	281	6108-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м2,глухой	м2	1.703	10 866	18 505
34	282	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	м2	1.703	34 942	59 507
			Итого по подразделу: ОК-14				**78 012**
			Подраздел: ОК-15				
35	283	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый	м2	17.28	11 112	192 015
36	284	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	17.28	51 934	897 428
			Итого по подразделу: ОК-15				**1 089 443**
			Итого по разделу: Окна /АР 53/				**69 142 929**
			Раздел: Витражи /АР-48/				
			Подраздел: ВН-1; ВН-3; ВН-5				
37	289	6108-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока витражного из ПВХ	м2	307.734	6 243	1 921 183
38	290	223-301-0107 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	307.734	128 305	39 483 811
			Итого по подразделу: ВН-1; ВН-3; ВН-5				**41 404 994**
			Итого по разделу: Витражи /АР-48/				**41 404 994**
			Раздел: Полы.				
			Подраздел: Тип 1.2				
39	362	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	74.05	340	25 177
40	363	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	74.05	2 029	150 247

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	364	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	74.05	573	42 431
42	365	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.2036375	68 239	13 896
43	366	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.2036375	382 476	77 886
			Итого по подразделу: Тип 1.2				**309 637**
			Подраздел: Тип 1.3				
44	370	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	784.5	2 029	1 591 750
45	371	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	784.5	1 003	786 854
46	372	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2.157375	68 239	147 217
47	373	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2.157375	382 476	825 143
			Итого по подразделу: Тип 1.3				**3 350 965**
			Подраздел: Тип 1.4				
48	376	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	169.03	2 029	342 962
49	377	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	169.03	1 862	314 734
50	378	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.4648325	68 239	31 720
51	379	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.4648325	382 476	177 787
			Итого по подразделу: Тип 1.4				**867 203**
			Подраздел: Тип 1.5				
52	384	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	183.45	340	62 372
53	385	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	183.45	2 029	372 220

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	386	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	183.45	717	131 534
55	387	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.5044875	68 239	34 426
56	388	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.5044875	382 476	192 954
57	389	6111-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой	м2	183.45	5 373	985 677
58	390	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	205.464	435	89 377
			Итого по подразделу: Тип 1.5				**1 868 561**
			Подраздел: Тип 1.5.1				
59	395	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	141.85	340	48 229
60	396	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	141.85	2 029	287 814
61	397	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	141.85	717	101 706
62	398	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.3900875	68 239	26 619
63	399	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.3900875	382 476	149 199
64	400	6111-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой	м2	141.85	5 373	762 160
65	401	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	158.872	435	69 109
			Итого по подразделу: Тип 1.5.1				**1 444 836**
			Подраздел: Тип 1.7				
66	406	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	86.33	340	29 351

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	407	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	86.33	2 029	175 164
68	408	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	86.33	717	61 899
69	409	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.2374075	68 239	16 200
70	410	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.2374075	382 476	90 803
71	411	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	86.33	2 604	224 803
			Итого по подразделу: Тип 1.7				**598 221**
			Подраздел: Тип 1.8				
72	416	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	232.45	340	79 033
73	417	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	232.45	2 029	471 641
74	418	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	232.45	1 576	366 341
75	419	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.6392375	68 239	43 621
76	420	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.6392375	382 476	244 493
77	421	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	232.45	2 604	605 300
78	422	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	232.45	631	146 676
			Итого по подразделу: Тип 1.8				**1 957 105**
			Подраздел: Тип 1.9				
79	425	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,щебеночных	м3	104.751	26 113	2 735 363

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	426	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	1047.51	340	356 153
81	427	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	104.751	46 929	4 915 860
82	428	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2.8806525	68 239	196 573
83	429	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2.8806525	382 476	1 101 780
84	430	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	1047.51	2 029	2 125 398
85	431	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	1047.51	1 289	1 350 240
86	432	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2.8806525	68 239	196 573
87	433	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2.8806525	382 476	1 101 780
88	434	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1047.51	2 604	2 727 716
89	435	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	1047.51	945	989 897
			Итого по подразделу: Тип 1.9				**17 797 333**
			Подраздел: Тип 2.0				
90	440	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	1819.94	340	618 780
91	441	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	1819.94	2 029	3 692 658
92	442	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	1819.94	860	1 565 148
93	443	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	5.004835	68 239	341 525

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	444	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5.004835	382 476	1 914 228
95	445	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1819.94	2 604	4 739 124
			Итого по подразделу: Тип 2.0				**12 871 464**
			Подраздел: Тип 2.1				
96	450	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	118.43	340	40 266
97	451	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	118.43	2 029	240 294
98	452	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	118.43	860	101 850
99	453	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.3256825	68 239	22 224
100	454	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.3256825	382 476	124 566
			Итого по подразделу: Тип 2.1				**529 200**
			Подраздел: Тип 2.2				
101	459	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	32	2 029	64 928
102	460	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	32	860	27 520
103	461	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.088	68 239	6 005
104	462	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.088	382 476	33 658
			Итого по подразделу: Тип 2.2				**132 111**
			Подраздел: Тип 2.3				
105	471	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	267.25	340	90 865
106	472	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	267.25	2 029	542 250

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	473	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	267.25	1 633	436 419
108	474	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.7349375	68 239	50 151
109	475	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.7349375	382 476	281 096
110	476	6111-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой	м2	267.25	5 373	1 435 934
111	477	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	299.32	435	130 204
			Итого по подразделу: Тип 2.3				**2 966 919**
			Подраздел: Тип 1.3.1				
112	482	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	14.65	2 029	29 725
113	483	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	14.65	1 719	25 183
114	484	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0402875	68 239	2 748
115	485	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0402875	382 476	15 408
			Итого по подразделу: Тип 1.3.1				**73 066**
			Подраздел: Тип 1.4				
116	488	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	171.41	2 029	347 791
117	489	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	171.41	1 862	319 165
118	490	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.4713775	68 239	32 166
119	491	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.4713775	382 476	180 291
			Итого по подразделу: Тип 1.4				**879 413**
			Подраздел: Тип 1.5				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	496	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	136.65	2 029	277 263
121	497	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	136.65	717	97 978
122	498	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.3757875	68 239	25 642
123	499	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.3757875	382 476	143 730
124	500	6111-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой	м2	136.65	5 373	734 220
125	501	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	153.048	435	66 576
			Итого по подразделу: Тип 1.5				**1 345 410**
			Подраздел: Тип 1.5.1				
126	506	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	40.99	2 029	83 169
127	507	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	40.99	717	29 390
128	508	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.1127225	68 239	7 692
129	509	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1127225	382 476	43 114
130	510	6111-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой	м2	40.99	5 373	220 239
131	511	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	45.9088	435	19 970
			Итого по подразделу: Тип 1.5.1				**403 574**
			Подраздел: Тип 1.6.1				
132	516	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	65.91	2 029	133 731

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	517	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	65.91	1 146	75 533
134	518	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.1812525	68 239	12 368
135	519	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1812525	382 476	69 325
			Итого по подразделу: Тип 1.6.1				**290 957**
			Подраздел: Тип 1.8				
136	526	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	47.71	1 289	61 498
137	527	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.1312025	68 239	8 953
138	528	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1312025	382 476	50 182
			Итого по подразделу: Тип 1.8				**120 633**
			Подраздел: Тип 2.1				
139	533	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	2431.89	2 029	4 934 305
140	534	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	2431.89	2 064	5 019 421
141	535	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	6.6876975	68 239	456 362
142	536	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6.6876975	382 476	2 557 884
143	537	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	2431.89	2 604	6 332 642
			Итого по подразделу: Тип 2.1				**19 300 614**
			Подраздел: Тип 2.2.1				
144	543	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	208.04	2 029	422 113
145	544	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	208.04	860	178 914

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
146	545	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.57211	68 239	39 040
147	546	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.57211	382 476	218 818
148	547	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	208.04	2 604	541 736
149	548	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	208.04	315	65 533
			Итого по подразделу: Тип 2.2.1				**1 466 154**
			Подраздел: Тип 2.2.2				
150	551	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	104.12	2 029	211 259
151	552	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	104.12	1 289	134 211
152	553	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.28633	68 239	19 539
153	554	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.28633	382 476	109 514
			Итого по подразделу: Тип 2.2.2				**474 523**
			Подраздел: Тип 1.3.1				
154	596	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	89.3	2 029	181 190
155	597	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	89.3	1 719	153 507
156	598	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.245575	68 239	16 758
157	599	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.245575	382 476	93 927
158	600	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	89.3	6 687	597 149

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	601	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	91.086	7 380	672 215
			Итого по подразделу: Тип 1.3.1				**1 714 746**
			Подраздел: Тип 1.4				
160	602	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	160.86	2 029	326 385
161	603	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	160.86	1 862	299 521
162	604	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.442365	68 239	30 187
163	605	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.442365	382 476	169 194
			Итого по подразделу: Тип 1.4				**825 287**
			Подраздел: Тип 1.5				
164	610	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	112.56	2 029	228 384
165	611	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	112.56	717	80 706
166	612	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.30954	68 239	21 122
167	613	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.30954	382 476	118 392
168	614	6111-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой	м2	112.56	5 373	604 785
169	615	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	126.0672	435	54 839
			Итого по подразделу: Тип 1.5				**1 108 229**
			Подраздел: Тип 1.8				
170	620	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	13.95	2 029	28 305
171	621	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	13.95	1 576	21 985

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
172	622	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0383625	68 239	2 617
173	623	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0383625	382 476	14 673
			Итого по подразделу: Тип 1.8				**67 581**
			Подраздел: Тип 2.2.1				
174	628	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	253.72	2 029	514 798
175	629	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	253.72	2 064	523 677
176	630	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.69773	68 239	47 612
177	631	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.69773	382 476	266 865
			Итого по подразделу: Тип 2.2.1				**1 352 953**
			Подраздел: Тип 2.3.1				
178	638	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	2467.61	2 029	5 006 781
179	639	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	2467.61	2 064	5 093 146
180	640	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	6.7859275	68 239	463 065
181	641	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6.7859275	382 476	2 595 454
182	642	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	2467.61	2 604	6 425 656
183	643	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	2467.61	631	1 557 062
			Итого по подразделу: Тип 2.3.1				**21 141 165**
			Подраздел: Тип 2.9				
184	646	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	5.82	340	1 979

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
185	647	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	5.82	2 029	11 809
186	648	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	5.82	717	4 173
187	649	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.016005	68 239	1 092
188	650	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.016005	382 476	6 122
189	651	6111-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой	м2	5.82	5 373	31 271
190	652	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	6.5184	435	2 836
			Итого по подразделу: Тип 2.9				**59 282**
			Итого по разделу: Полы.				**95 317 142**
			Раздел: Отделка потолков				
			Подраздел: Тип 1				
191	670	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за один раз	м2	1942.65	2 591	5 033 406
			Итого по подразделу: Тип 1				**5 033 406**
			Подраздел: Тип 1.2				
192	678	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за один раз	м2	677.98	2 591	1 756 646
			Итого по подразделу: Тип 1.2				**1 756 646**
			Подраздел: Тип 2				
193	681	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	1047.51	6 933	7 262 387
194	682	232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1078.9353	1 080	1 165 250
195	683	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м2	1047.51	2 430	2 545 449
			Итого по подразделу: Тип 2				**10 973 086**
			Подраздел: Тип 4				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
196	685	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	13.54	6 933	93 873
197	686	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	13.9462	925	12 900
198	687	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м2	13.54	2 430	32 902
			Итого по подразделу: Тип 4				**139 675**
			Подраздел: Тип 1				
199	691	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за один раз	м2	2079.66	2 591	5 388 399
			Итого по подразделу: Тип 1				**5 388 399**
			Подраздел: Тип 2				
200	693	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за один раз	м2	177.75	2 591	460 550
			Итого по подразделу: Тип 2				**460 550**
			Подраздел: Тип 3,4				
201	698	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м2	125.95	2 430	306 058
			Итого по подразделу: Тип 3,4				**306 058**
			Подраздел: Тип 1				
202	708	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза	м2	2010.81	3 465	6 967 457
			Итого по подразделу: Тип 1				**6 967 457**
			Подраздел: тип 3				
203	710	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза	м2	118.38	3 465	410 187
			Итого по подразделу: тип 3				**410 187**
			Подраздел: Тип 4				
204	713	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	8.06	6 933	55 880
205	714	232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	8.3018	1 080	8 966

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
206	715	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м2	8.06	2 430	19 586
			Итого по подразделу: Тип 4				**84 432**
			Подраздел: Тип 10				
207	719	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	151.06	6 933	1 047 299
208	720	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	155.5918	764	118 872
209	721	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м2	151.06	2 430	367 076
			Итого по подразделу: Тип 10				**1 533 247**
			Итого по разделу: Отделка потолков				**33 053 143**
			Раздел: Отделка стен				
			Подраздел: Отделка по кирпичу				
210	735	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	м2	5116.8	4 994	25 553 299
211	736	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	5116.8	2 037	10 422 922
			Итого по подразделу: Отделка по кирпичу				**35 976 221**
			Подраздел: Отделка по газоблоку				
212	740	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	947.1	1 619	1 533 355
213	741	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	947.1	1 736	1 644 166
			Итого по подразделу: Отделка по газоблоку				**3 177 521**
			Подраздел: Отделка по ГКЛ				
214	743	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена облицованная гипсокартонными листами	м2	161	1 438	231 518
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛ				**231 518**
			Подраздел: отделка по утеплителю				
215	747	6112-0202-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	м2	116.25	8 368	972 780

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
216	748	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	116.25	2 037	236 801
217	749	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	116.25	1 736	201 810
			Итого по подразделу: отделка по утеплителю				**1 411 391**
			Подраздел: Отделка по низу стен				
218	751	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	м2	1486.57	4 173	6 203 457
			Итого по подразделу: Отделка по низу стен				**6 203 457**
			Подраздел: Откосы				
219	755	6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами,откоса плоского оконного и дверного	м2	377.6	11 093	4 188 717
220	756	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе,толщина до 3 мм	м2	377.6	4 792	1 809 459
			Итого по подразделу: Откосы				**5 998 176**
			Подраздел: Отделка по кирпичу				
221	758	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	м2	4977.08	4 994	24 855 538
222	759	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	4977.08	2 037	10 138 312
			Итого по подразделу: Отделка по кирпичу				**34 993 850**
			Подраздел: Отделка по газоблоку				
223	763	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	6.54	1 619	10 588
224	764	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	6.54	1 736	11 353
225	769	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена облицованная гипсокартонными листами	м2	15.45	1 438	22 217
			Итого по подразделу: Отделка по газоблоку				**44 158**
			Подраздел: Отделка по ГКЛ				
226	771	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена облицованная гипсокартонными листами	м2	278.19	1 438	400 037

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛ				**400 037**
			Подраздел: отделка по утеплителю				
227	775	6112-0202-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	м2	35.11	8 368	293 800
228	776	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	35.11	2 037	71 519
229	777	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	35.11	1 736	60 951
			Итого по подразделу: отделка по утеплителю				**426 270**
			Подраздел: Отделка по низу стен				
230	779	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	м2	376.69	4 173	1 571 927
231	780	1203-0101-2501 РСНБ РК 2022	Стены монолитных,сборных бетонных и железобетонных конструкций.Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения	м2 поверхности	376.69	2 630	990 695
			Итого по подразделу: Отделка по низу стен				**2 562 622**
			Подраздел: Отделка по кирпичу				
232	787	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	м2	4475.29	4 994	22 349 598
233	788	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	4475.29	2 037	9 116 166
			Итого по подразделу: Отделка по кирпичу				**31 465 764**
			Подраздел: Отделка по ГКЛ				
234	792	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена облицованная гипсокартонными листами	м2	125.19	1 438	180 023
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛ				**180 023**
			Подраздел: отделка по утеплителю				
235	796	6112-0202-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	м2	471.44	8 368	3 945 010
236	797	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	471.44	2 037	960 323
237	798	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	471.44	1 736	818 420

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: отделка по утеплителю				**5 723 753**
			Подраздел: Отделка по низу стен				
238	800	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	м2	305.71	4 173	1 275 728
			Итого по подразделу: Отделка по низу стен				**1 275 728**
			Подраздел: Откосы				
239	804	6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами,откоса плоского оконного и дверного	м2	249.22	11 093	2 764 597
240	805	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе,толщина до 3 мм	м2	249.22	4 792	1 194 262
			Итого по подразделу: Откосы				**3 958 859**
			Итого по разделу: Отделка стен				**134 029 348**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания АР				**531 944 426**
			ИТОГО по акту:				**531 944 426**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)	531944426.272 x 9.40%	50 002 774
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	531944426.272 + 50002774.040	581 947 200
	Сметная прибыль, 5.00%	581947200.312 x 5.00%	29 097 360
	Непредвиденные расходы, 5.000%	581947200.312 x 5.000%	29 097 360
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		640 141 920
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	640141920.344 x 1.0368	663 699 143
	НДС (12%)	663699143.012 x 12%	79 643 897
	Итого с НДС	663699143.012 + 79643897.161	743 343 040

Лист согласования
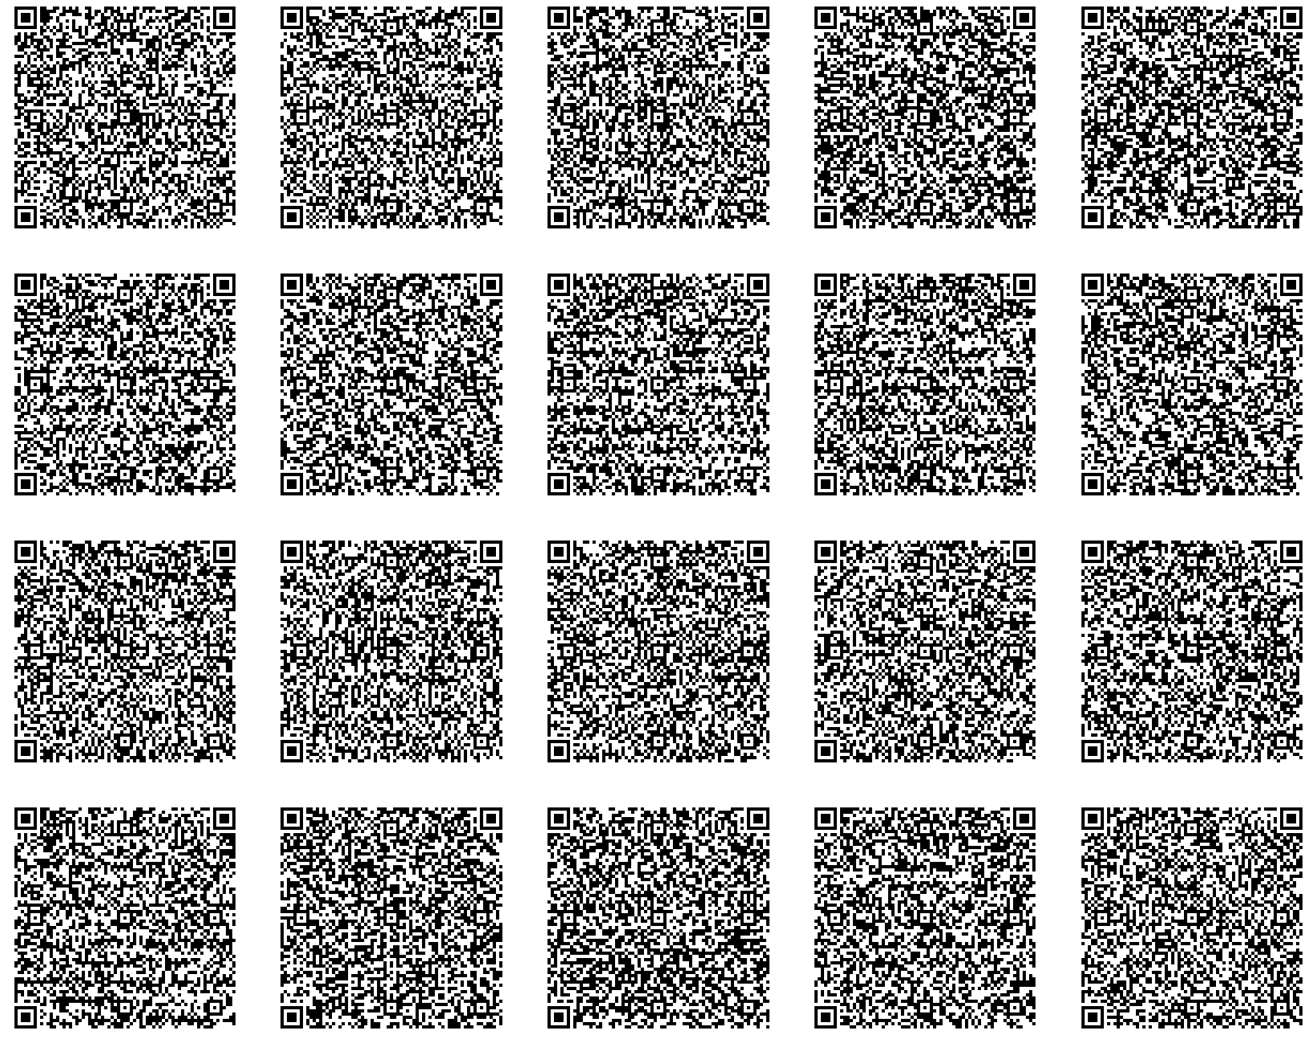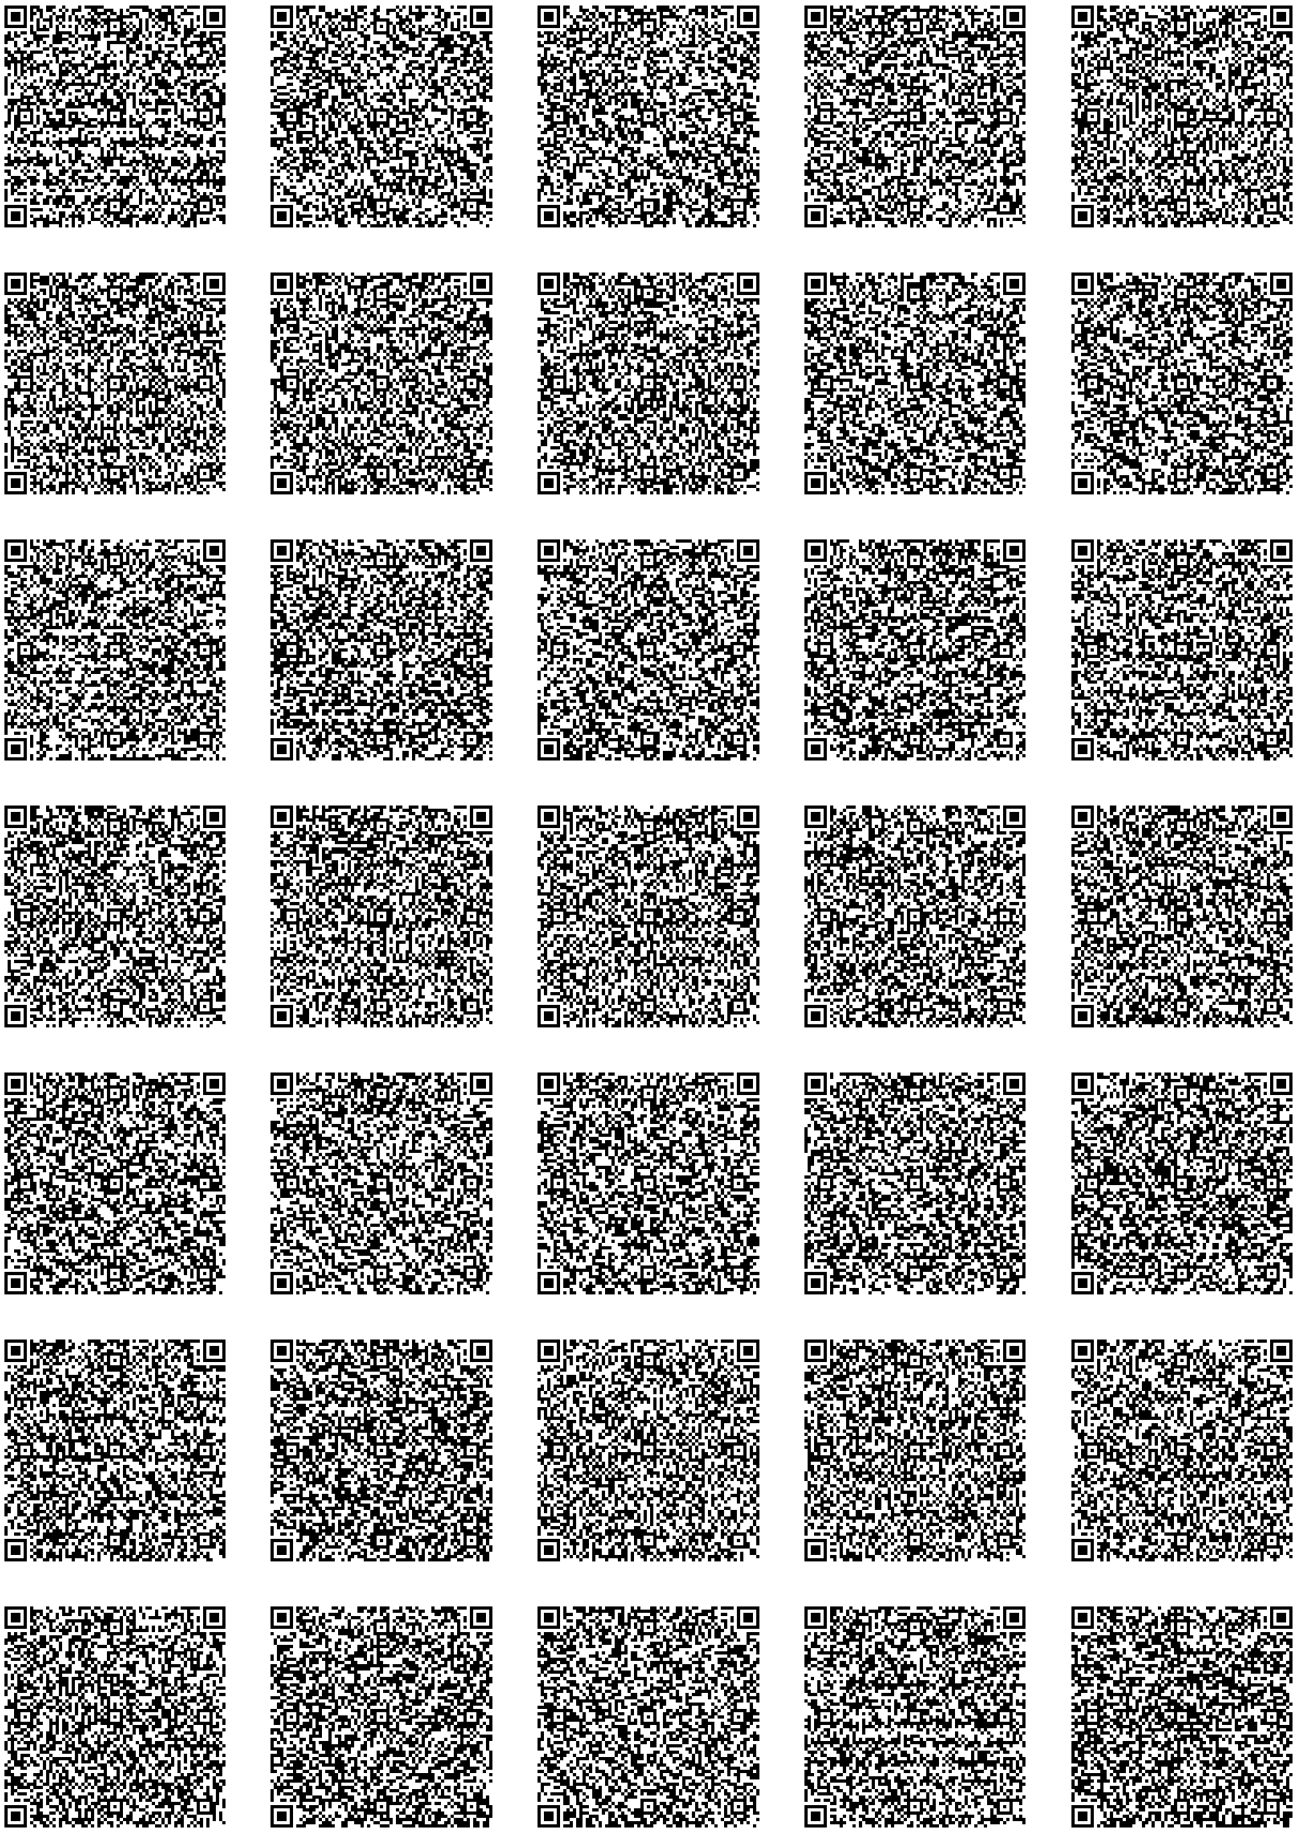
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	31.07.2024 02:42:36
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	31.07.2024 08:37:05
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	31.07.2024 05:48:29
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	31.07.2024 10:57:17
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	31.07.2024 11:48:27
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	31.07.2024 10:08:29
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	31.07.2024 08:54:23
