Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструктивная часть здания.Конструкции железобетонные				
			Отдел: Блок 1				
			Раздел: Армирование кладки /КЖ-17				
1	1	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	3.7487	65 056	243 875
2	2	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3.7487	382 476	1 433 788
			Итого по разделу: Армирование кладки /КЖ-17				**1 677 663**
			Раздел: Перемычки /КЖ-21/				
3	9	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	186	1 654	307 644
4	10	222-102-0101РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.182	124 724	22 700
5	11	222-102-0102РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.54	108 763	58 731
6	12	222-102-0105РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2.912	117 164	341 182
7	13	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	7.629	151 106	1 152 788
8	14	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	3	7 847	23 541
9	15	222-102-0209РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.645	149 418	96 375
10	17	261-101-0383РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0.12	57 413	6 890

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	18	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	9	1 654	14 886
12	19	222-202-0101РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0.9	181 570	163 413
13	20	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.18479	114 424	21 144
14	21	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.17234	374 529	64 546
15	22	214-208-0102РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0.01245	382 131	4 758
16	23	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	9.60908	206	1 979
			Подраздел: Перемычки над отверстиями /КЖ-21.5				
17	24	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	27	1 654	44 658
18	25	222-102-0101РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.182	124 724	22 700
19	26	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.406	151 106	61 349
			Итого по подразделу: Перемычки над отверстиями /КЖ-21.5				**128 707**
			Итого по разделу: Перемычки /КЖ-21/				**2 409 285**
			Раздел: Перекрытия				
20	27	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 5 м2	шт.	23	7 739	177 997
21	28	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 м2	шт.	180	9 423	1 696 140
22	29	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	335.7744	12 064	4 050 782
23	30	222-203-0415РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ,длиной от 1,7 до 7,8 м,высотой сечения 280 мм,под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1170.8322	16 728	19 585 962
24	31	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2153	344 590	74 190
			Подраздел: Монолитный участок МУ-1 4шт				
25	32	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	4.16	81 808	340 321
26	33	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.12696	344 590	43 749

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	34	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.18784	326 417	61 314
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-1 4шт				**445 384**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-2 1шт				
28	35	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.43	81 808	35 177
29	36	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02007	344 590	6 916
30	37	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.02442	326 417	7 970
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-2 1шт				**50 064**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-3 5шт				
31	38	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.95	81 808	77 718
32	39	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06045	344 590	20 830
33	40	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.11685	326 417	38 142
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-3 5шт				**136 690**
			Итого по разделу: Перекрытия				**26 217 209**
			Итого по отделу: Блок 1				**30 304 157**
			Отдел: Блок 3				
			Раздел: Армирование кладки /КЖ-26				
34	186	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	4.39424	65 056	285 872
35	187	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4.39424	382 476	1 680 691
			Итого по разделу: Армирование кладки /КЖ-26				**1 966 563**
			Раздел: Перемычки				
36	194	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	175	1 654	289 450
37	195	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	3	7 847	23 541
38	196	222-102-0101РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.07	124 724	8 731
39	197	222-102-0102РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.648	108 763	70 478
40	198	222-102-0105РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2.867	117 164	335 909

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	199	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	7.086	151 106	1 070 737
42	200	222-102-0209РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.645	149 418	96 375
43	201	6104-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка конструкции мелкой (подоконник,слив,парапет и другие),масса до 0,5 т	шт.	6	6 666	39 996
44	202	261-101-0383РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0.12	57 413	6 890
45	203	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	9	1 654	14 886
46	208	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.931339	206	192
			Подраздел: Монолитная перемычка ПР-11 1 шт				
47	209	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной перемычки	м3	0.95	138 911	131 965
48	210	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09251	344 590	31 878
49	211	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.094	326 417	30 683
			Итого по подразделу: Монолитная перемычка ПР-11 1 шт				**194 526**
			Подраздел: Перемычки над отверстиями /КЖ-34				
50	212	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	51	1 654	84 354
51	213	222-102-0101РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.34	124 724	42 406
52	214	222-102-0102РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.056	108 763	6 091
53	215	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1	151 106	151 106
54	216	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.0374	65 056	2 433
55	217	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.0374	338 700	12 666
			Итого по подразделу: Перемычки над отверстиями /КЖ-34				**299 057**
			Итого по разделу: Перемычки				**2 450 768**
			Раздел: Перекрытия				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	218	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 5 м2	шт.	30	7 739	232 170
57	219	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 м2	шт.	177	9 423	1 667 871
58	220	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	722.7286	12 064	8 718 997
59	221	222-203-0415РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ,длиной от 1,7 до 7,8 м,высотой сечения 280 мм,под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	747.3222	16 728	12 501 385
60	222	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.28872	344 590	99 490
			Подраздел: Монолитный участок МУ-1 1шт				
61	223	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.41	81 808	33 541
62	224	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.00164	326 417	535
63	225	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04011	344 590	13 822
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-1 1шт				**47 898**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-2 1шт				
64	226	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.5	81 808	40 904
65	227	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.03064	326 417	10 001
66	228	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.022	344 590	7 581
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-2 1шт				**58 486**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-3 2шт				
67	229	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.92	81 808	75 263
68	230	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.05638	326 417	18 403
69	231	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04054	344 590	13 970
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-3 2шт				**107 636**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-4 1шт				
70	232	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.39	81 808	31 905
71	233	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.02728	326 417	8 905
72	234	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01716	344 590	5 913

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-4 1шт				**46 723**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-5 1шт				
73	235	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.11	81 808	8 999
74	236	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.00796	326 417	2 598
75	237	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00482	344 590	1 661
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-5 1шт				**13 258**
			Итого по разделу: Перекрытия				**23 493 914**
			Итого по отделу: Блок 3				**27 911 245**
			Отдел: Блок 4				
			Раздел: Армирование кладки /КЖ-25				
76	270	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	5.0775	65 056	330 322
77	271	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5.0775	382 476	1 942 022
			Итого по разделу: Армирование кладки /КЖ-25				**2 272 344**
			Раздел: Балка монолитная Бм-1 2шт				
78	278	6103-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	17.112	10 606	181 490
79	279	6103-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0.19856	96 263	19 114
80	280	6103-0401-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	м3	2.4	11 862	28 469
81	281	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.436	26 417	64 352
82	282	6103-0401-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	17.112	6 646	113 726
83	283	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05506	344 590	18 973
84	284	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06504	336 177	21 865
85	285	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.03424	338 700	11 597
86	286	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес более 20 кг	т	0.1388	1 313 412	182 302

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Балка монолитная Бм-1 2шт				**641 888**
			Раздел: Перемычки				
87	287	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	271	1 654	448 234
88	288	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	16	7 847	125 552
89	289	222-102-0101РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.612	124 724	76 331
90	290	222-102-0102РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1.566	108 763	170 323
91	291	222-102-0103РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.5	112 048	56 024
92	292	222-102-0105РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1.33	117 164	155 828
93	293	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	6.57	151 106	992 766
94	294	222-102-0209РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1.29	149 418	192 749
95	296	261-101-0383РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0.6	57 413	34 448
96	297	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	18	1 654	29 772
97	298	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	36	7 847	282 492
98	299	222-202-0101РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	7.2	181 570	1 307 304
99	300	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.01697	114 424	1 942
100	301	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.01414	374 529	5 296
101	302	214-208-0102РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0.00283	382 131	1 081
102	303	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.856121	206	176
			Подраздел: Перемычки отверстий КЖ-22.5				
103	304	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	42	1 654	69 468

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	305	222-102-0101РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.528	124 724	65 854
105	306	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.612	151 106	92 476
			Итого по подразделу: Перемычки отверстий КЖ-22.5				**227 799**
			Итого по разделу: Перемычки				**4 108 117**
			Раздел: Перекрытия				
106	307	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 5 м2	шт.	27	7 739	208 953
107	308	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 м2	шт.	229	9 423	2 157 867
108	309	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	401.801397	12 064	4 847 332
109	310	222-203-0415РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ,длиной от 1,7 до 7,8 м,высотой сечения 280 мм,под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	918.085599	16 728	15 357 956
110	311	222-203-0416РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ,длиной от 7,9 до 9,6 м,высотой сечения 280 мм,под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	671.145	19 672	13 202 865
111	312	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3419	344 590	117 814
112	313	212-101-0603РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50,W4	м3	1.85	23 202	42 924
			Подраздел: Монолитный участок МУ-1 4шт				
113	314	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	4.16	81 808	340 321
114	315	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.20768	326 417	67 790
115	316	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.12696	344 590	43 749
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-1 4шт				**451 860**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-2 2шт				
116	317	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1.76	81 808	143 982
117	318	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.09056	326 417	29 559
118	319	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06222	344 590	21 440
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-2 2шт				**194 982**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-3 2шт				
119	320	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1.02	81 808	83 444

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	321	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.05326	326 417	17 385
121	322	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0359	344 590	12 371
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-3 2шт				**113 200**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-4 1шт				
122	323	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1.54	81 808	125 984
123	324	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.07857	326 417	25 647
124	325	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05424	344 590	18 691
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-4 1шт				**170 322**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-5 3шт				
125	326	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1.17	81 808	95 715
126	327	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.13551	326 417	44 233
127	328	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0693	344 590	23 880
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-5 3шт				**163 828**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-6 3шт				
128	329	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	2.01	81 808	164 434
129	330	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.15069	326 417	49 188
130	331	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07497	344 590	25 834
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-6 3шт				**239 456**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-7 1шт				
131	332	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.43	81 808	35 177
132	333	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.02442	326 417	7 970
133	334	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02007	344 590	6 916
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-7 1шт				**50 064**
			Подраздел: Монолитная плита МП-1 2шт				
134	335	1106-0801-0112РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	4	71 929	287 716

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
135	336	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.16662	336 177	56 014
136	337	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.18124	325 807	59 049
			Итого по подразделу: Монолитная плита МП-1 2шт				**402 779**
			Подраздел: Монолитная плита МУ-6 1шт				
137	338	1106-0801-0112РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1.72	71 929	123 718
138	339	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.22278	326 417	72 719
			Итого по подразделу: Монолитная плита МУ-6 1шт				**196 437**
			Итого по разделу: Перекрытия				**37 918 640**
			Итого по отделу: Блок 4				**44 940 989**
			Отдел: Блок 5				
			Раздел: Армирование кладки /КЖ-20				
139	372	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	3.3959	65 056	220 924
140	373	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3.3959	382 476	1 298 850
			Итого по разделу: Армирование кладки /КЖ-20				**1 519 774**
			Раздел: Перемычки				
141	383	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	163	1 654	269 602
142	384	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	6	7 847	47 082
143	385	222-102-0101РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1.074	124 724	133 954
144	386	222-102-0102РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.504	108 763	54 817
145	387	222-102-0105РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.336	117 164	39 367
146	388	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2.661	151 106	402 093
147	389	222-102-0209РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1.29	149 418	192 749
148	391	261-101-0383РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0.48	57 413	27 558
149	392	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	36	1 654	59 544

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
150	393	222-202-0101РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	3.6	181 570	653 652
			Подраздел: Перемычки отверстий				
151	394	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	21	1 654	34 734
152	395	222-102-0101РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.167	124 724	20 829
153	396	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.244	151 106	36 870
154	397	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.02665	65 056	1 734
155	398	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.02665	338 700	9 026
			Итого по подразделу: Перемычки отверстий				**103 193**
			Итого по разделу: Перемычки				**1 983 611**
			Раздел: Перекрытия				
156	399	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 5 м2	шт.	34	7 739	263 126
157	400	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 м2	шт.	152	9 423	1 432 296
158	401	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	475.1022	12 064	5 731 632
159	402	222-203-0415РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ,длиной от 1,7 до 7,8 м,высотой сечения 280 мм,под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	713.122598	16 728	11 929 285
160	403	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.22183	344 590	76 440
			Подраздел: Монолитный участок МУ-1 2шт				
161	404	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1.62	81 808	132 529
162	405	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.08524	326 417	27 824
163	406	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05704	344 590	19 655
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-1 2шт				**180 008**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-2 3шт				
164	407	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1.89	81 808	154 617
165	408	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.15345	326 417	50 089

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
166	409	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07878	344 590	27 146
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-2 3шт				**231 853**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-3 2шт				
167	410	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1.98	81 808	161 980
168	411	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1039	326 417	33 915
169	412	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06952	344 590	23 956
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-3 2шт				**219 851**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-5 3шт				
170	413	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1.95	81 808	159 526
171	414	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.04863	326 417	15 874
172	415	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02598	344 590	8 952
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-5 3шт				**184 352**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-7 2шт				
173	416	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1.88	81 808	153 799
174	417	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1094	326 417	35 710
175	418	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0653	344 590	22 502
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-7 2шт				**212 011**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-4 3шт				
176	419	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	4.8	81 808	392 678
177	420	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.66708	326 417	217 746
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-4 3шт				**610 424**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-8 1шт				
178	421	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1.9	81 808	155 435
179	422	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.24052	326 417	78 510
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-8 1шт				**233 945**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-6 1шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
180	423	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.4	81 808	32 723
181	424	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.01758	326 417	5 738
182	425	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01963	344 590	6 764
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-6 1шт				**45 225**
			Итого по разделу: Перекрытия				**21 350 449**
			Итого по отделу: Блок 5				**24 853 834**
			Отдел: Блок 6				
			Раздел: Армирование кладки /КЖ-19				
183	453	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	4.75381	65 056	309 264
184	454	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4.75381	382 476	1 818 218
			Итого по разделу: Армирование кладки /КЖ-19				**2 127 482**
			Раздел: Перемычки				
185	461	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	169	1 654	279 526
186	462	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	21	7 847	164 787
187	463	222-102-0101РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.406	124 724	50 638
188	464	222-102-0102РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.558	108 763	60 690
189	465	222-102-0103РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.1	112 048	11 205
190	466	222-102-0105РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2.628	117 164	307 907
191	467	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	6.844	151 106	1 034 169
192	468	222-102-0209РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.645	149 418	96 375
193	470	261-101-0383РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0.96	57 413	55 116
194	471	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	15	1 654	24 810
195	472	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	57	7 847	447 279

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
196	473	222-202-0101РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	10.05	181 570	1 824 779
197	474	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.03675	114 424	4 205
198	475	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0316	374 529	11 835
199	476	214-208-0102РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0.00515	382 131	1 968
200	477	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1.863105	206	384
			Подраздел: Перемычки отверстий				
201	478	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	15	1 654	24 810
202	479	222-102-0101РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.131	124 724	16 339
203	480	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.145	151 106	21 910
204	481	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.08662	65 056	5 635
205	482	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.08662	338 700	29 338
			Итого по подразделу: Перемычки отверстий				**98 032**
			Итого по разделу: Перемычки				**4 473 705**
			Раздел: Перекрытия				
206	483	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 5 м2	шт.	29	7 739	224 431
207	484	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 м2	шт.	250	9 423	2 355 750
208	485	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	444.777798	12 064	5 365 799
209	486	222-203-0415РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ,длиной от 1,7 до 7,8 м,высотой сечения 280 мм,под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1576.435891	16 728	26 370 997
210	487	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3202	344 590	110 338
			Подраздел: Монолитный участок МУ-1 4шт				
211	488	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	3.92	81 808	320 687
212	489	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.23976	326 417	78 262

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
213	490	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.16084	344 590	55 424
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-1 4шт				**454 373**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-2 3шт				
214	491	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1.44	81 808	117 804
215	492	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.13602	326 417	44 399
216	493	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07911	344 590	27 261
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-2 3шт				**189 464**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-3 2шт				
217	494	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	2.38	81 808	194 703
218	495	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.05562	326 417	18 155
219	496	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03166	344 590	10 910
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-3 2шт				**223 768**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-4 3шт				
220	497	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1.95	81 808	159 526
221	498	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.04863	326 417	15 874
222	499	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02598	344 590	8 952
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-4 3шт				**184 352**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-5 1шт				
223	500	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.4	81 808	32 723
224	501	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.01758	326 417	5 738
225	502	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01963	344 590	6 764
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-5 1шт				**45 225**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-6 2шт				
226	503	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	3.06	81 808	250 331
227	504	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4376	326 417	142 840
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-6 2шт				**393 172**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Перекрытия				**35 917 669**
			Итого по отделу: Блок 6				**42 518 856**
			Отдел: Блок 8				
			Раздел: Армирование кладки /КЖ-26				
228	655	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.546945	382 476	591 669
			Итого по разделу: Армирование кладки /КЖ-26				**591 669**
			Итого по отделу: Блок 8				**591 669**
			Отдел: Блок 9				
			Раздел: Армирование кладки /КЖ-27				
229	771	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1.54755	65 056	100 677
230	772	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.54755	382 476	591 901
			Итого по разделу: Армирование кладки /КЖ-27				**692 578**
			Раздел: Перемычки				
			Подраздел: Перемычки первого этажа				
231	777	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	99	1 654	163 746
232	778	222-102-0101РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.606	124 724	75 583
233	779	222-102-0102РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.144	108 763	15 661
234	780	222-102-0103РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.68	112 048	76 193
235	781	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.783	151 106	118 316
			Итого по подразделу: Перемычки первого этажа				**449 500**
			Подраздел: Перемычки над отверстиями				
236	782	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	18	1 654	29 772
237	783	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	1	7 847	7 847
238	784	222-102-0101РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.084	124 724	10 477
239	785	222-102-0102РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.018	108 763	1 958

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
240	786	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.373	151 106	56 363
241	787	222-102-0209РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.149	149 418	22 263
242	788	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.02	65 056	1 301
243	789	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.02	338 700	6 774
			Итого по подразделу: Перемычки над отверстиями				**136 755**
			Итого по разделу: Перемычки				**586 255**
			Раздел: Перекрытие на отметке -0,320 /КЖ-17/				
244	792	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04068	344 590	14 018
			Подраздел: Монолитный участок МП-1 1шт				
245	793	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1.2	81 808	98 170
246	794	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.19442	326 417	63 462
			Итого по подразделу: Монолитный участок МП-1 1шт				**161 632**
			Подраздел: Монолитный участок МП-2 1шт				
247	795	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1	81 808	81 808
248	796	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.16341	326 417	53 340
			Итого по подразделу: Монолитный участок МП-2 1шт				**135 148**
			Итого по разделу: Перекрытие на отметке -0,320 /КЖ-17/				**310 798**
			Раздел: Перекрытие на отметке+3,28 /КЖ-30/				
249	797	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 м2	шт.	60	9 423	565 380
250	798	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	411.435	12 064	4 963 552
251	799	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04068	344 590	14 018
			Подраздел: Монолитный участок МП-3 1шт				
252	800	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1.27	81 808	103 896
253	801	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.18166	326 417	59 297
			Итого по подразделу: Монолитный участок МП-3 1шт				**163 193**
			Подраздел: Монолитный участок МП-4 1шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
254	802	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	1	81 808	81 808
255	803	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1544	326 417	50 399
			Итого по подразделу: Монолитный участок МП-4 1шт				**132 207**
			Итого по разделу: Перекрытие на отметке+3,28 /КЖ-30/				**5 838 350**
			Итого по отделу: Блок 9				**7 427 981**
			Итого по локальной смете: Конструктивная часть здания.Конструкции железобетонные				**178 548 735**
			ИТОГО по акту:				**178 548 735**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)	178548735.033 x 9.40%	16 783 580
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	178548735.033 + 16783580.412	195 332 315
	Сметная прибыль, 5.00%	195332315.445 x 5.00%	9 766 615
	Непредвиденные расходы, 5.000%	195332315.445 x 5.000%	9 766 615
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		214 865 546
	НДС (12%)	214865546.990 x 12%	25 783 865
	Итого с НДС	214865546.990 + 25783865.639	240 649 412

Лист согласования
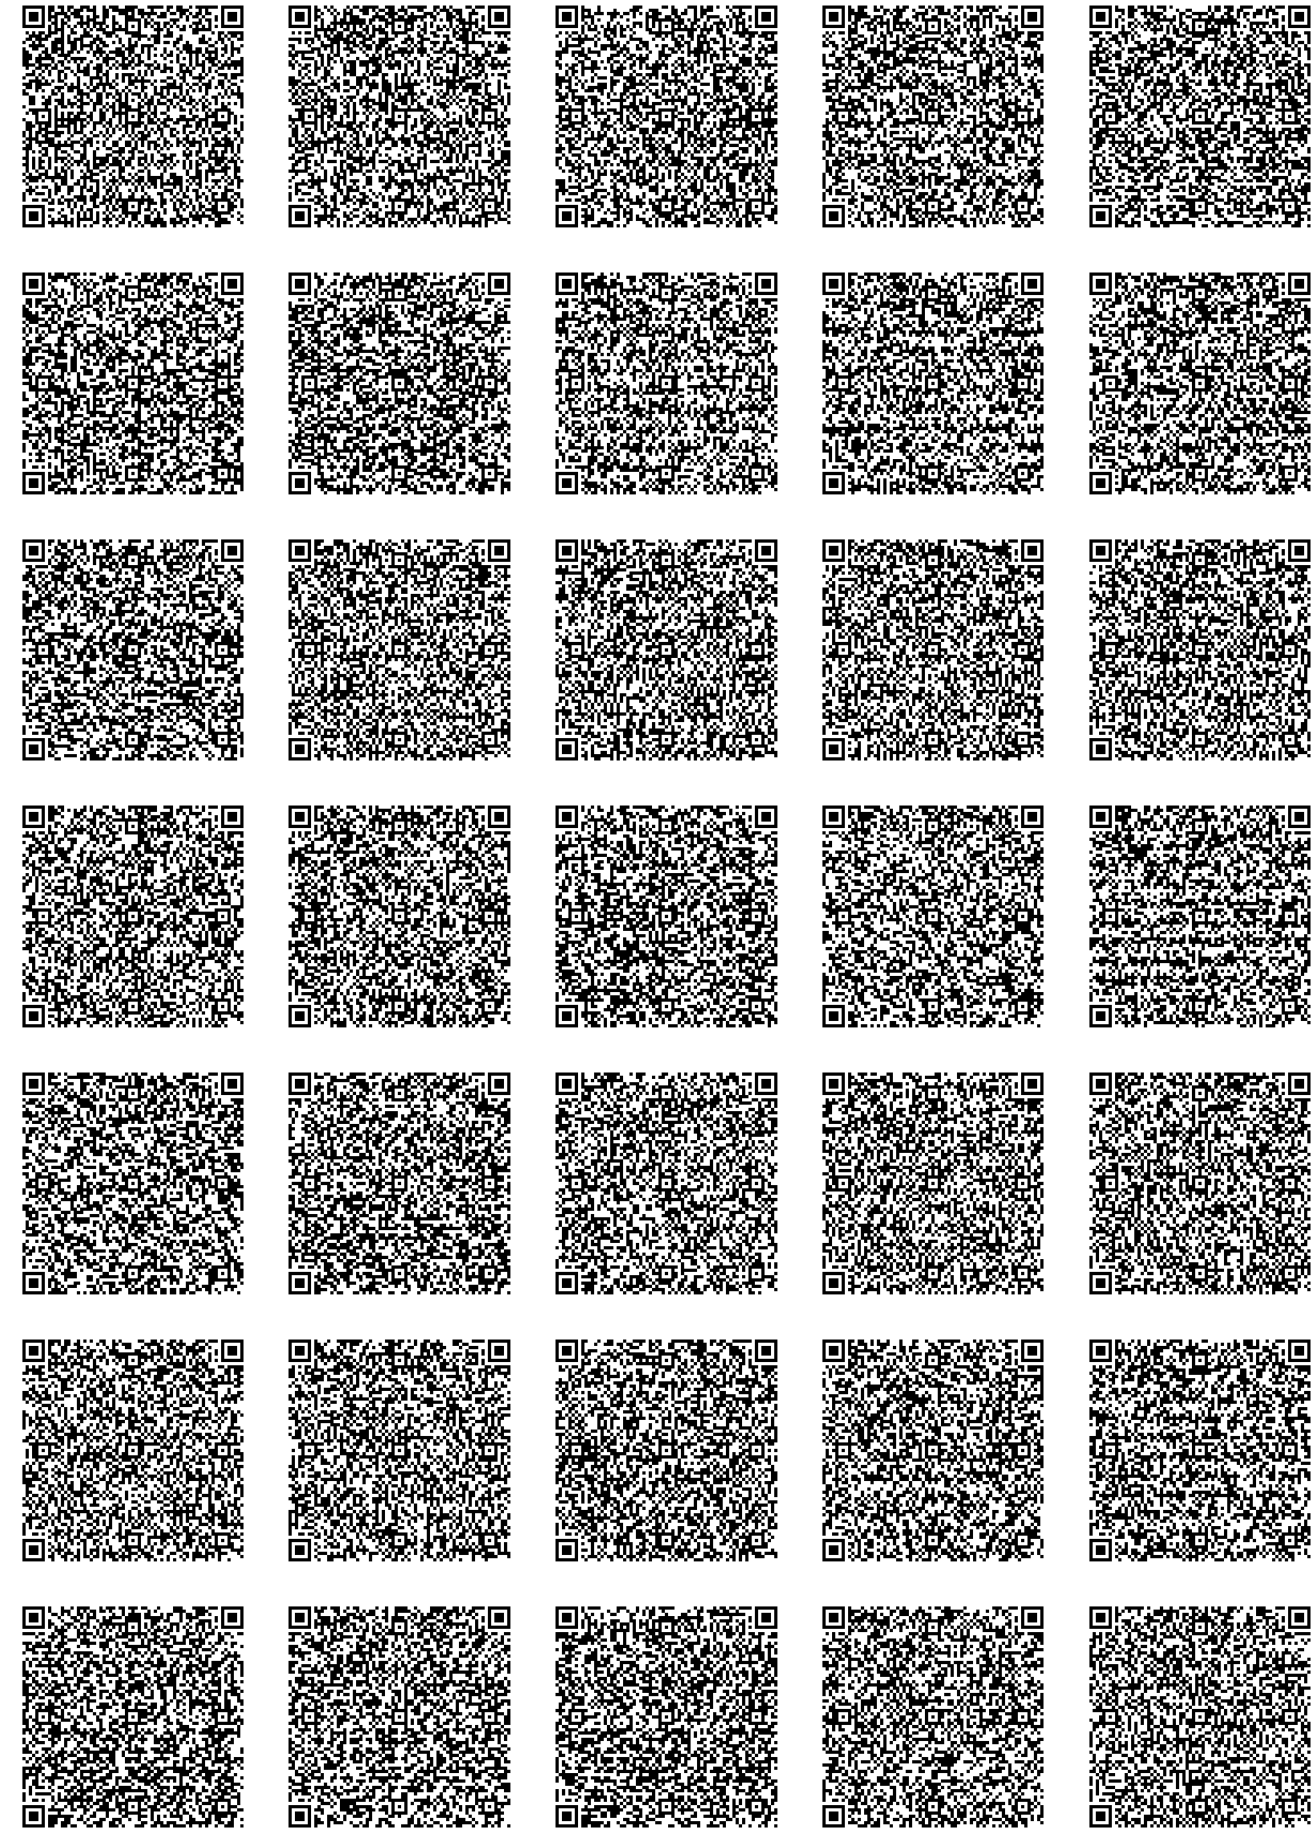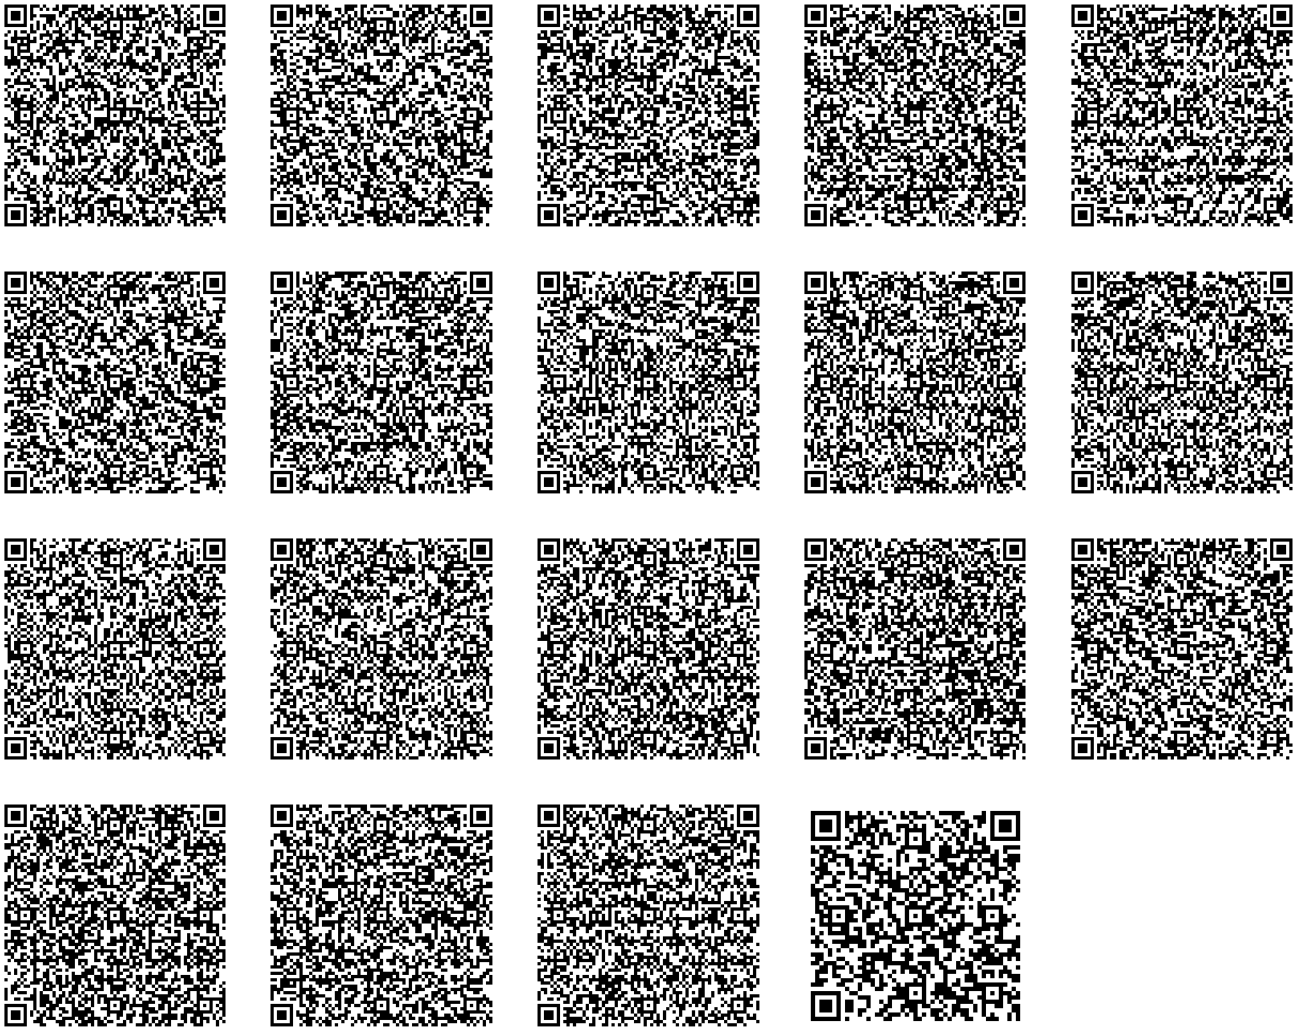
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	31.07.2024 00:13:49
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	31.07.2024 01:56:17
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	31.07.2024 00:39:42
Представители заказчика		
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	31.07.2024 03:50:40
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	31.07.2024 06:52:07
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	31.07.2024 09:16:11
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	31.07.2024 03:45:02
