Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания АР				
			Раздел: Двери /АР-51)				
			Подраздел: Стальные Д-1,Д-8"				
1	311	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная	м2	8.52	11 394	97 077
2	312	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м2	8.52	68 169	580 799
3	313	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	3	5 885	17 655
4	314	223-502-0104 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса,на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	3	6 531	19 593
			Итого по подразделу: Стальные Д-1,Д-8"				**715 125**
			Подраздел: Стальные Д-3",Д-3"",Д-18,Д-19,Д21--Д-24,Д-25"				
5	315	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная	м2	30.12	11 394	343 187
6	316	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	30.12	42 023	1 265 732
7	317	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического противопожарного,двупольного,глухого или остекленного	м2	24.63753	17 082	420 858
8	318	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	21.36	58 080	1 240 588

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	319	223-207-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,двупольный	м2	2.63	67 178	176 678
10	320	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	16	5 885	94 160
11	321	223-502-0104 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса,на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	16	6 531	104 496
			Итого по подразделу: Стальные Д-3",Д-3"",Д-18,Д-19,Д21–Д-24,Д-25"				**3 645 700**
			Подраздел: Стальные однопольные Д-5",Д-6,Д-6"" Д-9,Д-27				
12	322	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического противопожарного,однопольного,глухого или остекленного	м2	14.751	15 626	230 499
13	323	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	14.751	52 373	772 554
14	324	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	7	5 885	41 195
15	325	223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса,на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	7	5 220	36 540
16	326	1114-0303-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	м2	3.863	5 901	22 795
17	327	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3.863	33 823	130 658
			Итого по подразделу: Стальные однопольные Д-5",Д-6,Д-6"" Д-9,Д-27				**1 234 242**
			Подраздел: Алюминивые Д-2,Д-7,Д-25				
18	328	6108-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной,площадь проема до 3 м2	м2	41.423	10 619	439 870
19	329	223-205-0505 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА С 21-13	м2	37.423	102 774	3 846 111
20	330	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	14	5 885	82 390
21	331	223-502-0105 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса,на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	14	8 993	125 902
			Итого по подразделу: Алюминивые Д-2,Д-7,Д-25				**4 494 274**
			Подраздел: Дверь стальная решетчатая Д8п				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	332	1114-0303-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	м2	1.1	5 901	6 491
23	333	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	0.0452	932 114	42 131
			Итого по подразделу: Дверь стальная решетчатая Д8п				**48 622**
			Подраздел: Двери герметичные				
24	334	6118-0206-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверей герметических утепленных размер 1250х500 мм	шт.	2	84 687	169 374
			Итого по подразделу: Двери герметичные				**169 374**
			Подраздел: Деревянные Д-3--Д-5,Д-9				
25	335	1114-0303-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	225.0156	6 048	1 360 894
26	336	6108-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях,площадь проема более 3 м2	м2	1.856	5 446	10 107
27	337	223-201-0814 СпрСЦ 04.2024	Блок дверной внутренний типа Le porte,термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДО 20-13,ДО 20,5-13,двупольная,МДФ 6 мм,наполнение полотна Белтермо,антивандальные алюминиевые кромки,отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см,с двух сторон	комплект	47	147 658	6 939 926
28	338	223-201-0802 СпрСЦ 04.2024	Блок дверной внутренний типа Le porte,термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6,ДГ 20-7,ДГ 20-8,ДГ 20-9,МДФ 6 мм,наполнение полотна Белтермо,антивандальные алюминиевые кромки,отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см,с двух сторон	комплект	51	82 335	4 199 085
29	339	223-201-0808 СпрСЦ 04.2024	Блок дверной внутренний типа Le porte,термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-12,МДФ 6 мм,наполнение полотна Белтермо,антивандальные алюминиевые кромки,отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см,с двух сторон	комплект	4	115 309	461 236
30	340	223-201-0812 СпрСЦ 04.2024	Блок дверной внутренний типа Le porte,термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 22-18,двупольная,МДФ 6 мм,наполнение полотна Белтермо,антивандальные алюминиевые кромки,отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см,с двух сторон	комплект	1	181 124	181 124
31	341	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	262	601	157 462
32	342	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	96	4 853	465 888
33	343	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	10	768	7 680
34	344	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники.Установка и крепление	м коробок	523.385	866	453 251
			Итого по подразделу: Деревянные Д-3--Д-5,Д-9				**14 236 654**
			Итого по разделу: Двери /АР-51)				**24 543 993**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания АР				**24 543 993**
			ИТОГО по акту:				**24 543 993**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)			24543993.509 x 9.40%	2 307 135
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			24543993.509 + 2307135.296	26 851 128
			Сметная прибыль, 5.00%			26851128.805 x 5.00%	1 342 556
			Непредвиденные расходы, 5.000%			26851128.805 x 5.000%	1 342 556
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				29 536 241
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368			29536241.685 x 1.0368	30 623 175
			НДС (12%)			30623175.379 x 12%	3 674 781
			Итого с НДС			30623175.379 + 3674781.046	34 297 956

Лист согласования
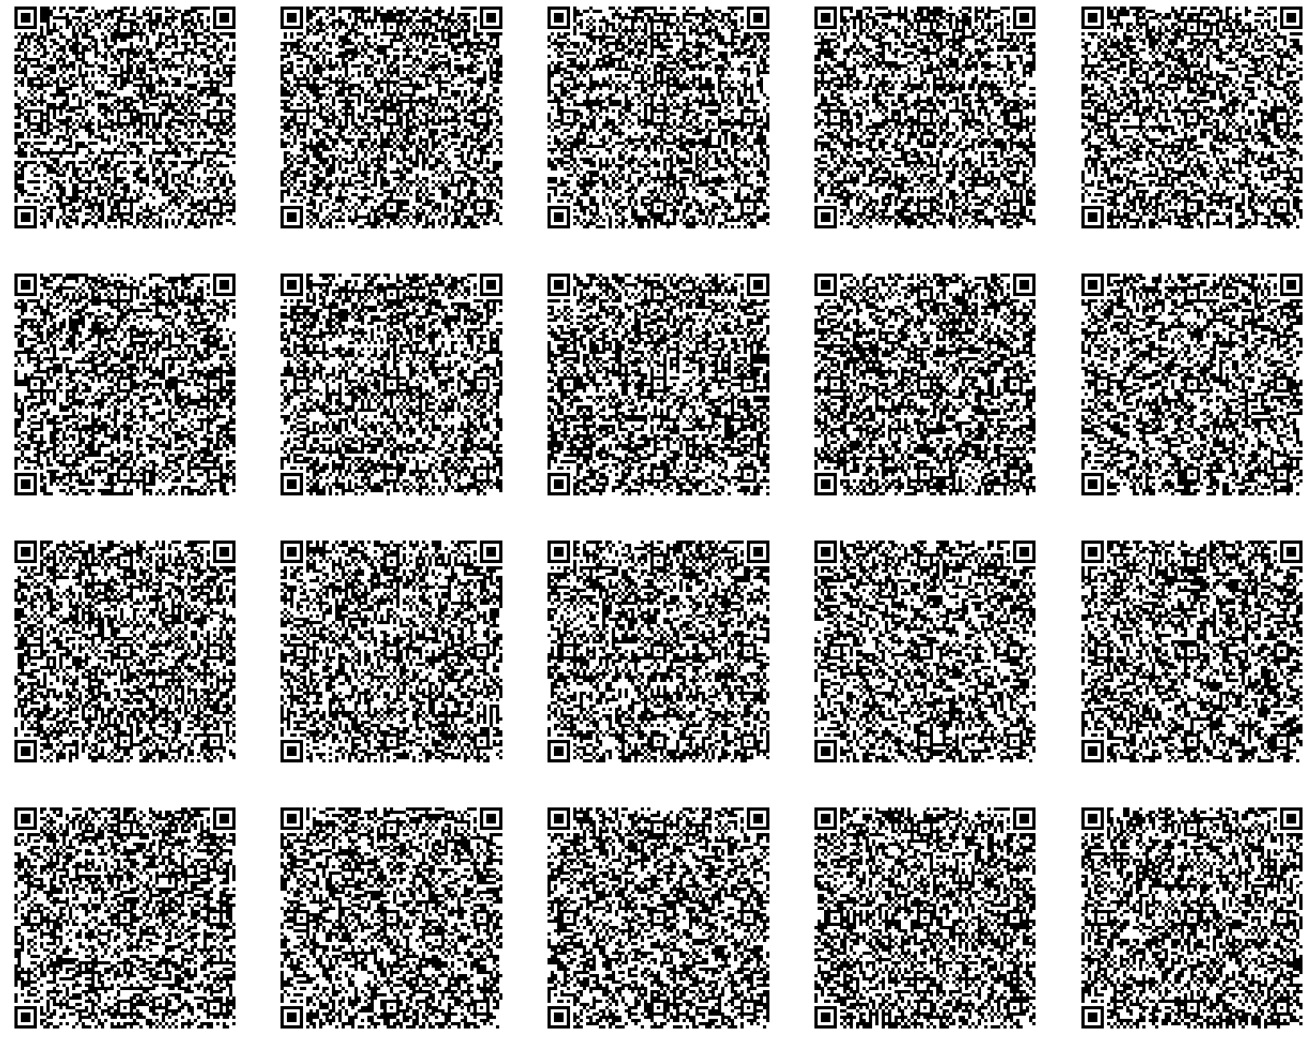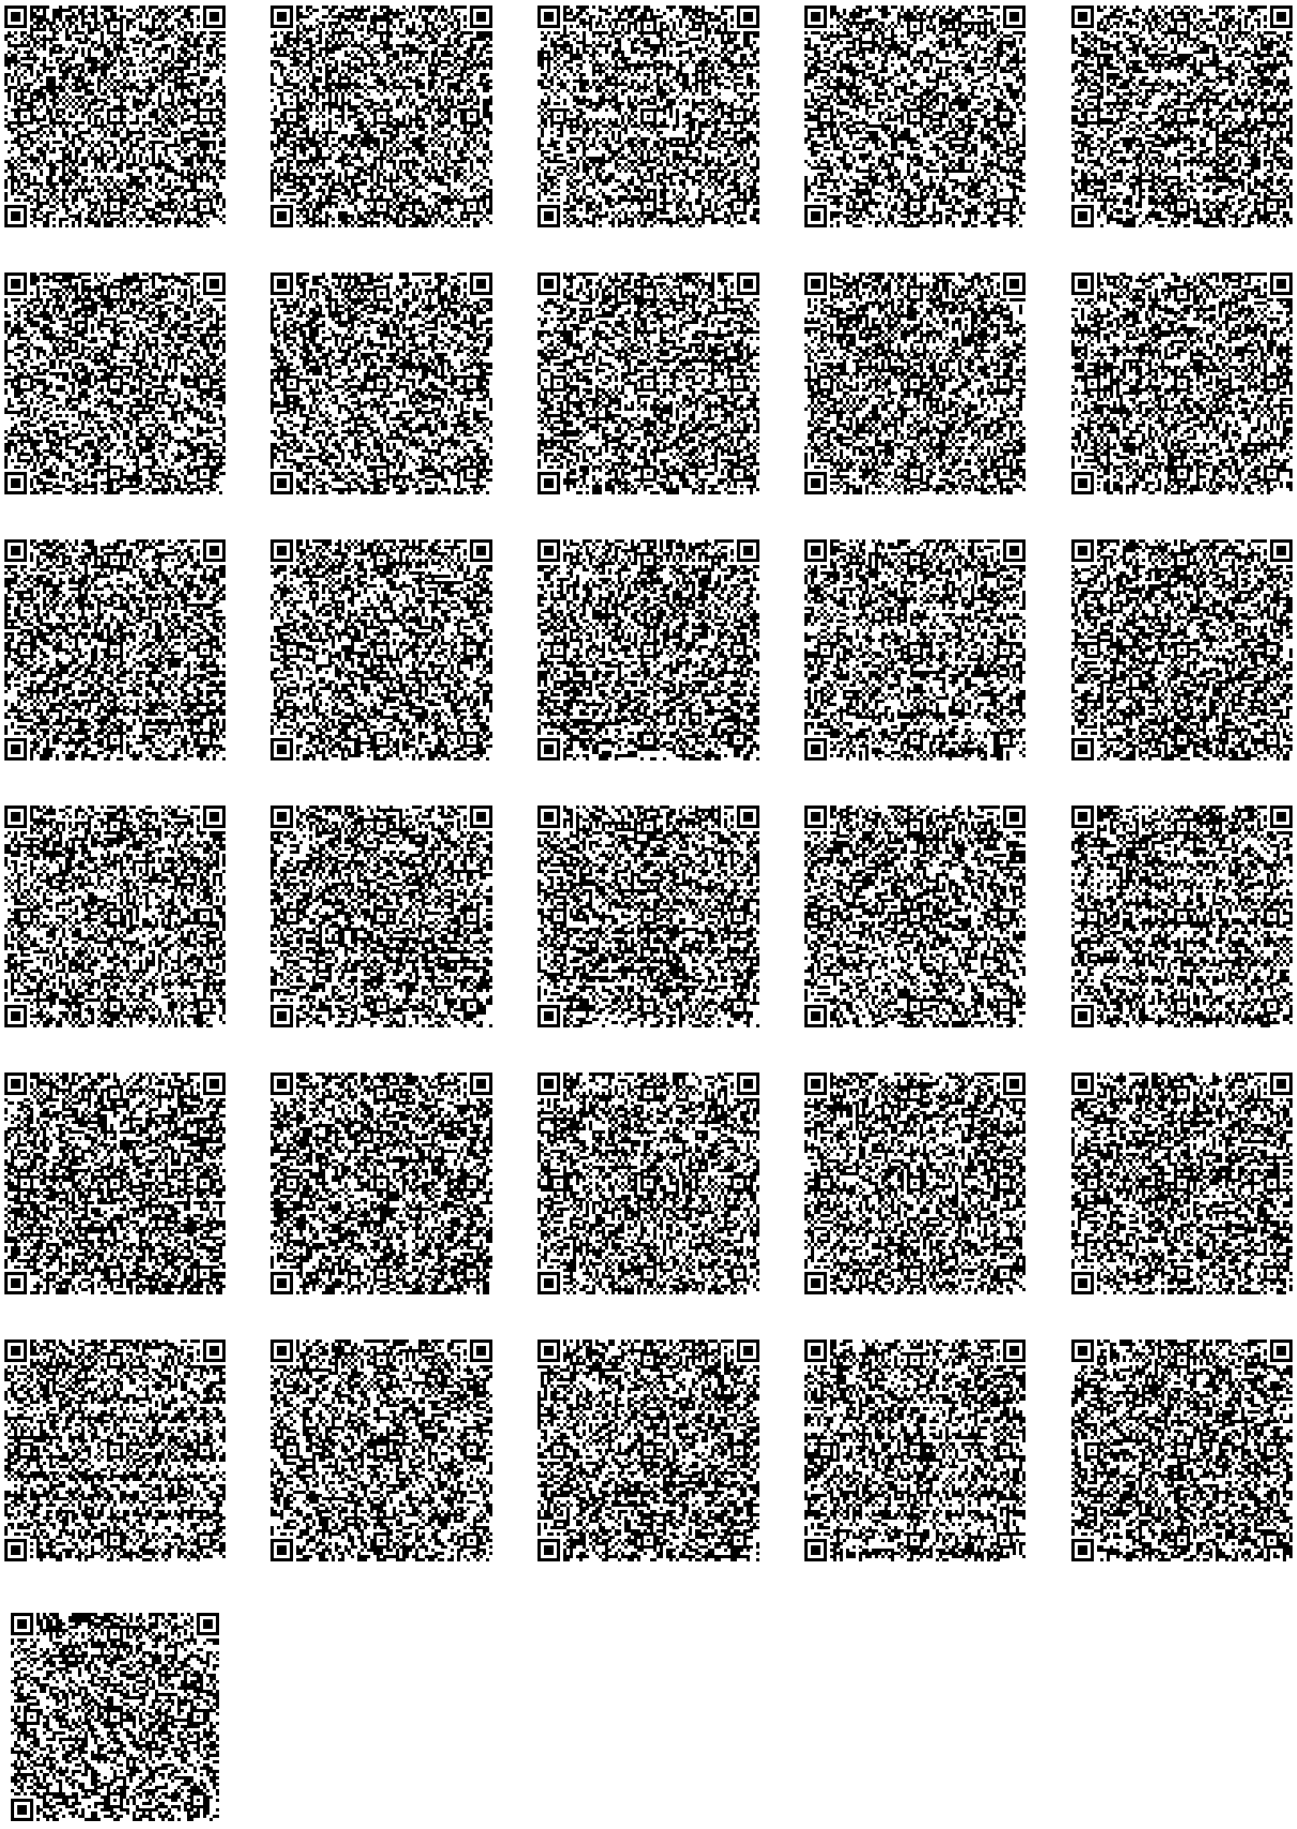
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	31.07.2024 00:30:00
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	31.07.2024 02:00:10
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	31.07.2024 01:07:20
Представители заказчика		
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	31.07.2024 03:48:57
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	31.07.2024 03:50:11
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	31.07.2024 05:33:30
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	31.07.2024 03:24:47
