Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети электроснабжения				
1	1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	118.26	376	44 466
2	4	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	11.826	4 156	49 149
3	5	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	106.434	98	10 431
4	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	106.434	656	69 821
5	7	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	439	827	363 053
6	8	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201 2 кабеля	м	27	254	6 858
7	9	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201 3 кабеля	м	206	508	104 648
8	10	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201 4 кабеля	м	176	762	134 112
9	11	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201 5 кабеля	м	14	1 016	14 224

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	12	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201 6 кабеля	м	14	1 270	17 780
11	13	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	65.043	3 818	248 334
12	14	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	135	571	77 085
13	15	241-207-1001РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	137.7	394	54 254
14	16	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	885	571	505 335
15	17	241-207-1005РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	902.7	1 391	1 255 656
16	18	6124-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	270	2 566	692 820
17	19	243-125-2951РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х240 (мс)-1	м	275.4	6 779	1 866 937
18	20	6124-0201-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	516	2 040	1 052 640
19	21	243-125-2948РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х120 (мс)-1	м	526.32	3 833	2 017 385
20	22	6124-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	701	1 547	1 084 447
21	23	243-125-2945РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х50 (мс)-1	м	131.58	2 102	276 581
22	24	243-125-2945РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х50 (мс)-1//4х35	м	583.44	2 102	1 226 391
23	25	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	390	1 077	420 030
24	26	243-125-1729РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х35 (мк)-0,66//4х25	м	47.94	1 826	87 538
25	27	243-213-0304РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 7х2,5	м	349.86	1 677	586 715
26	28	6124-0201-1501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	24	6 545	157 080
27	29	243-903-2006РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4	55 876	223 504

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	30	243-903-2005РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	12	47 514	570 168
29	31	243-903-2004РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	8	36 438	291 504
			Итого по локальной смете: Наружные сети электроснабжения				**13 508 946**
			ИТОГО по акту:				**13 508 946**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)	13508946.000 x 9.40%	1 269 840
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	13508946.000 + 1269840.872	14 778 786
	Сметная прибыль, 5.00%	14778786.872 x 5.00%	738 939
	Непредвиденные расходы, 5.000%	14778786.872 x 5.000%	738 939
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		16 256 665
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	16256665.560 x 1.0557	17 162 161
	НДС (12%)	17162161.831 x 12%	2 059 459
	Итого с НДС	17162161.831 + 2059459.420	19 221 621

Лист согласования
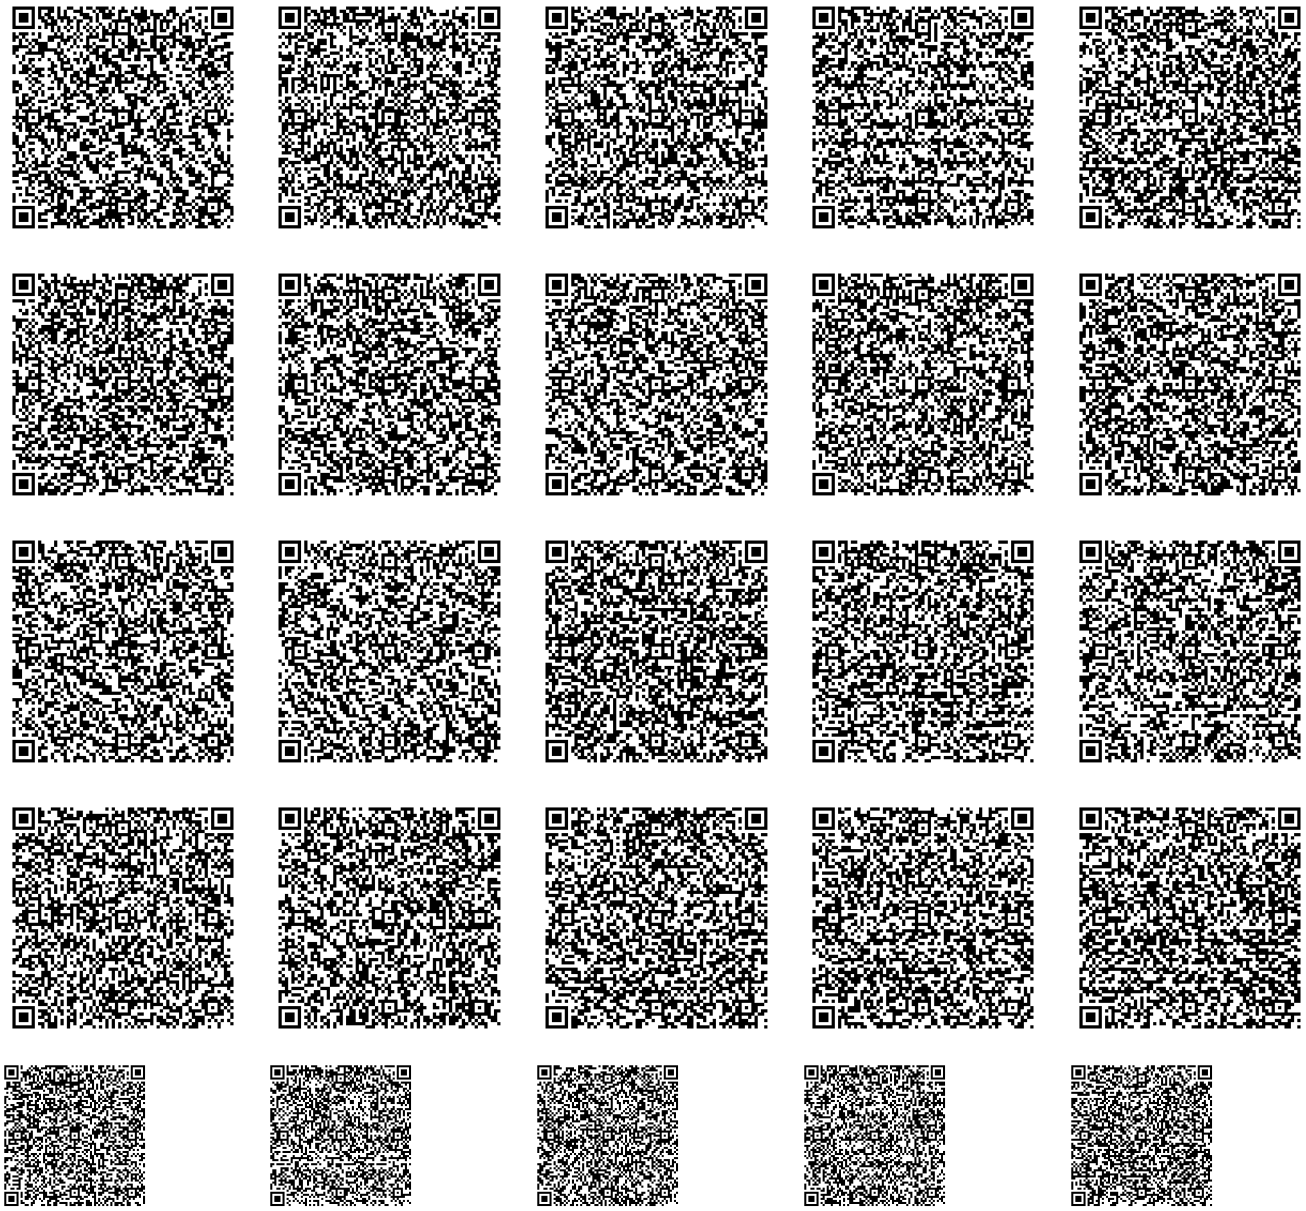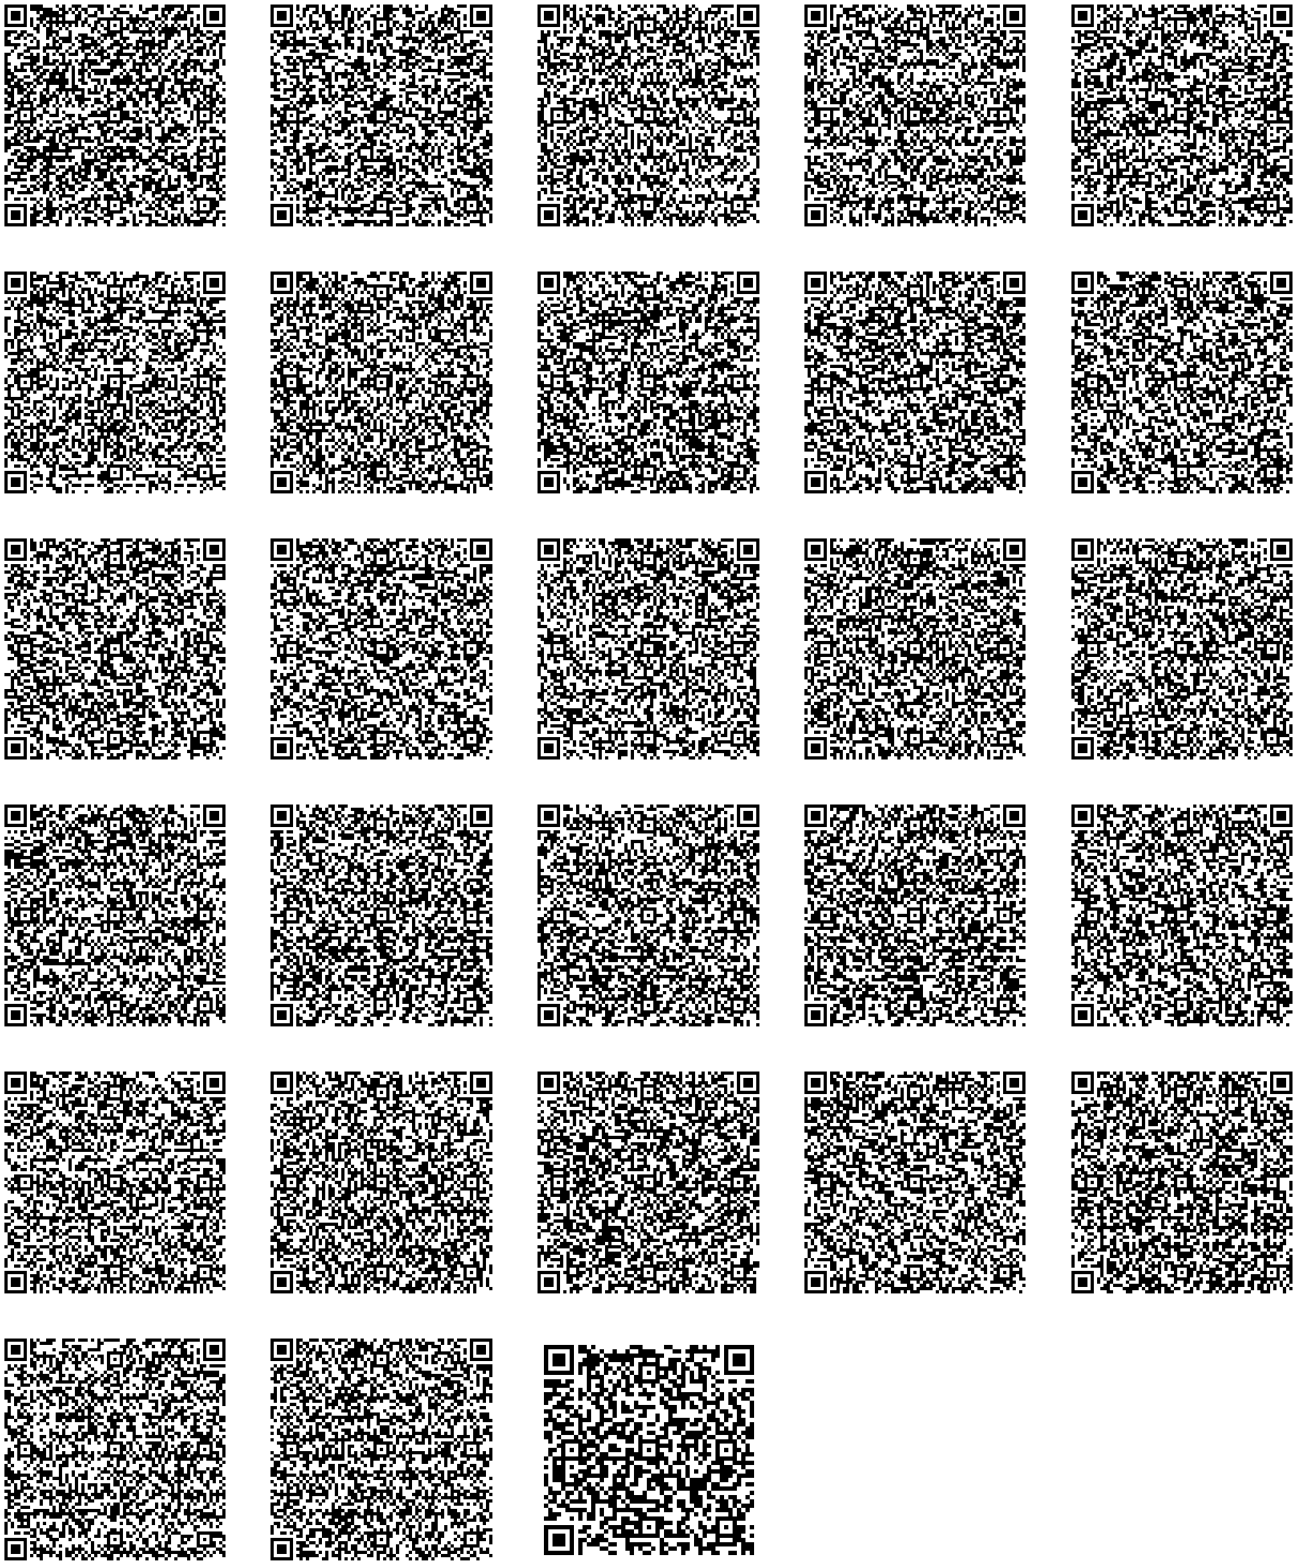
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	10.10.2024 11:21
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	11.10.2024 05:42
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	10.10.2024 16:44
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	14.10.2024 07:34
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	14.10.2024 06:15
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	15.10.2024 10:31
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	13.10.2024 18:10
