Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Озеленение				
			Раздел: Газоны				
			Подраздел: В границах участка, 8076,7 м2				
1	19	6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных// ДЭС из песка	м3	121.67	20 605	2 507 010
2	20	6113-0112-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом/ 20 см	м2	7276.7	1 239	9 015 831
3	21	6113-0112-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать до толщины 20 см	м2	7276.7	248	1 804 621
4	22	6113-0112-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	7276.7	738	5 370 204
			Итого по подразделу: В границах участка, 8076,7 м2				**18 697 668**
			Подраздел: Укрепление откоса повевом трав, 314,19 м2				
5	24	6113-0112-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см /20см/ вручную	м2	314.19	1 239	389 281
6	25	6113-0112-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать //до толщины 20 см	м2	314.19	248	77 919
7	26	6113-0112-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	314.19	657	206 422
			Итого по подразделу: Укрепление откоса повевом трав, 314,19 м2				**673 623**
			Итого по разделу: Газоны				**19 371 291**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	2	6113-0102-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%	яма	79	21 858	1 726 782
9	3	6113-0102-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%	яма	2	29 271	58 542
10	4	6113-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%	яма	274	14 539	3 983 686
11	5	6113-0102-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,5х0,4 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%	яма	22	6 582	144 804
12	6	6113-0108-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, добавление растительной земли до 100%	м	214	2 377	508 678
13	7	6113-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м	шт.	79	21 746	1 717 934
14	8	6113-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м	шт.	2	28 490	56 980
15	9	6113-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,5х0,4 м	шт.	274	14 262	3 907 788
16	10	6113-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м	шт.	22	10 337	227 414
17	11	6113-0109-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м	214	2 513	537 782
18	12	254-103-3002РСНБ РК 2022	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	48	10 750	516 000
19	13	254-103-2402РСНБ РК 2022	Клен остролистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	31	18 163	563 053
20	14	254-101-0403РСНБ РК 2022	Лиственница Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	2	28 030	56 060
21	15	254-104-0403РСНБ РК 2022	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	14	13 895	194 530
22	16	254-104-0710РСНБ РК 2022	Барбарис с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	22	5 489	120 760
23	17	254-103-0601РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	260	6 892	1 791 920
24	18	254-104-0601РСНБ РК 2022	Боярышник с оголённой корневой системой	шт.	642	1 478	948 876
			Итого по локальной смете: Озеленение				**36 432 880**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту:				**36 432 880**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)			36432880.248 x 9.40%	3 424 690
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			36432880.248 + 3424690.604	39 857 570
			Сметная прибыль, 5.00%			39857570.852 x 5.00%	1 992 878
			Непредвиденные расходы, 5.000%			39857570.852 x 5.000%	1 992 878
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				43 843 327
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557			43843327.937 x 1.0557	46 285 401
			НДС (12%)			46285401.303 x 12%	5 554 248
			Итого с НДС			46285401.303 + 5554248.156	51 839 649

Лист согласования
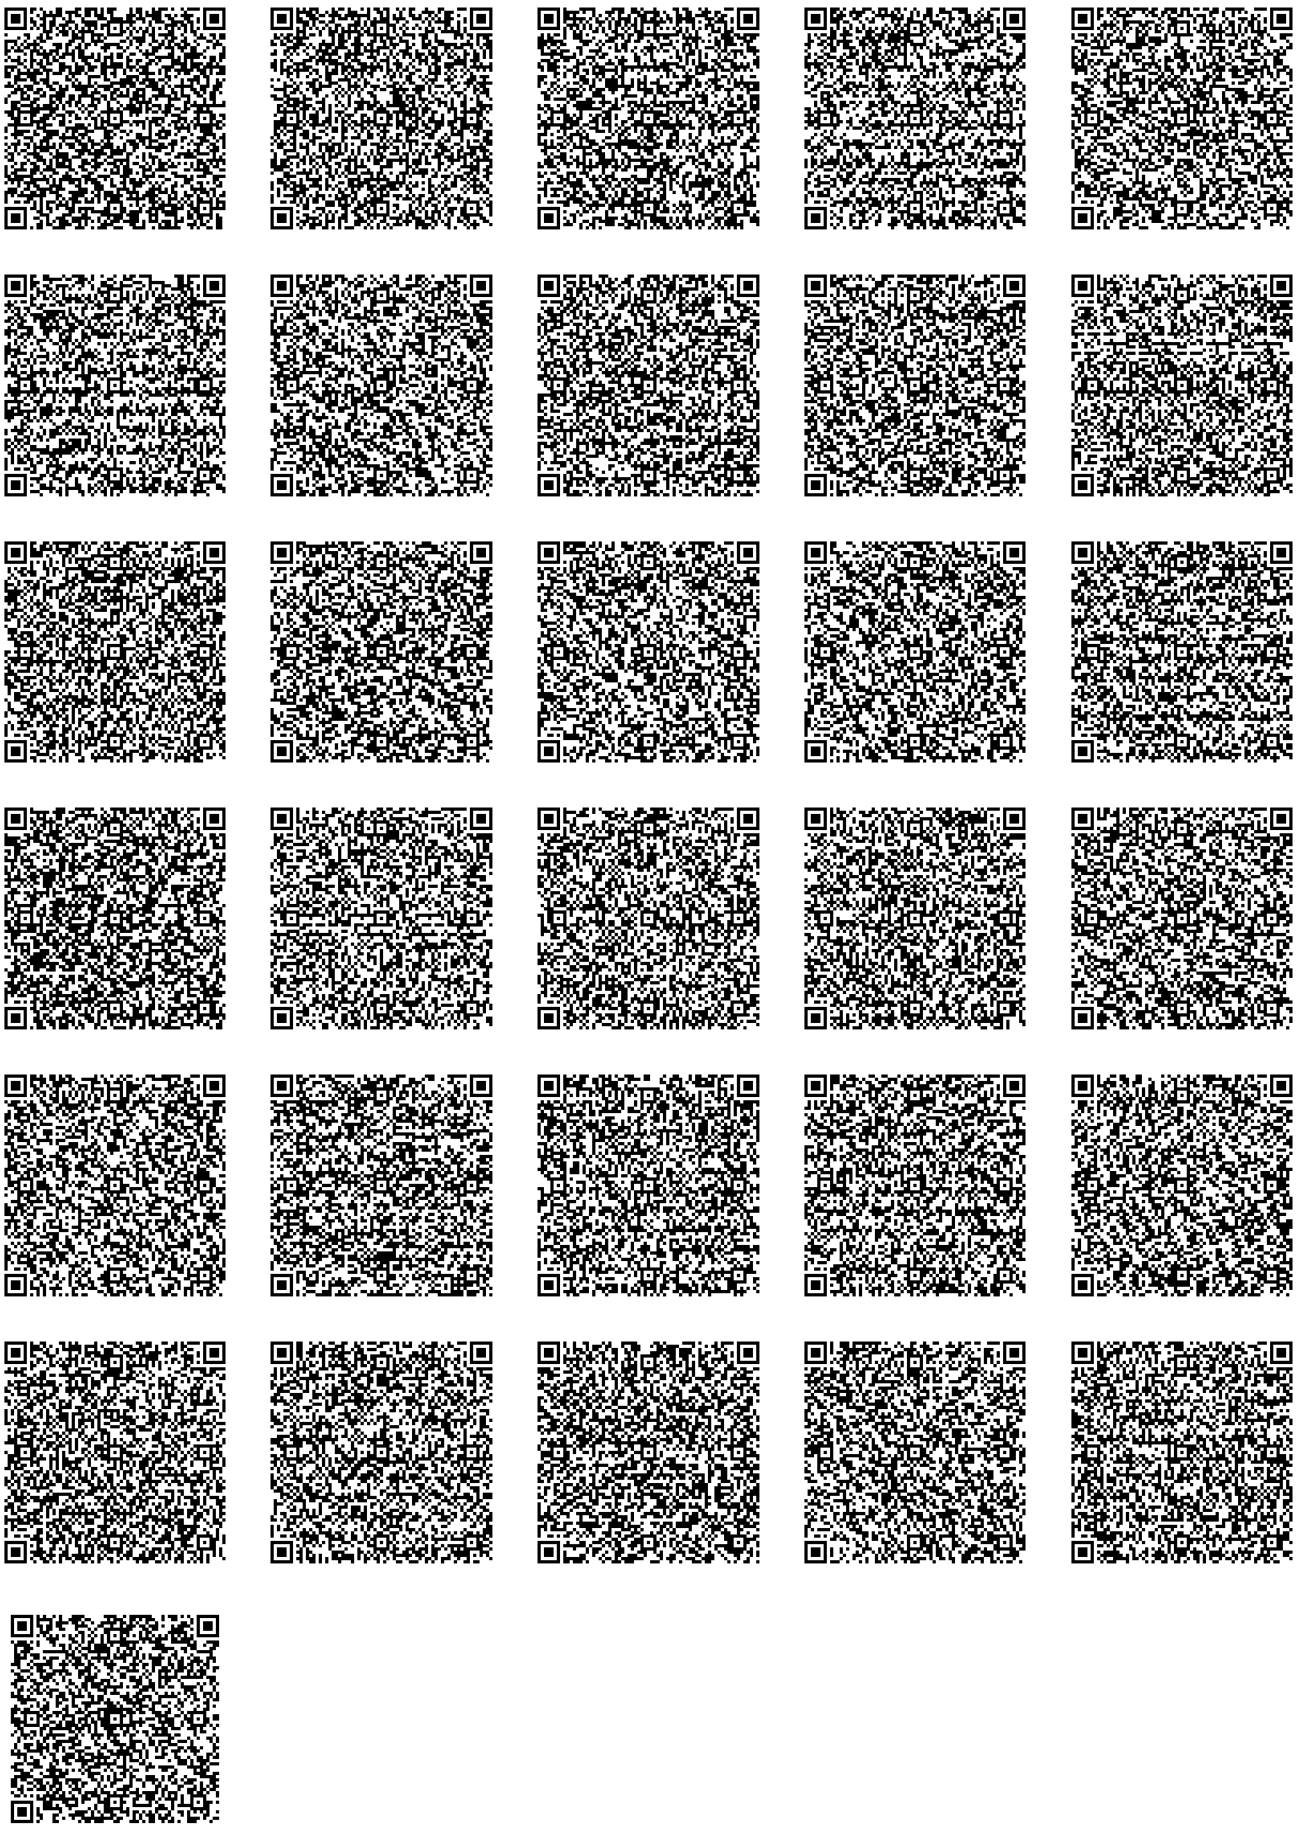
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	15.10.2024 06:49
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	16.10.2024 08:53
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	15.10.2024 12:52
Представители заказчика		
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	21.10.2024 06:17
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	21.10.2024 12:23
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	22.10.2024 04:57
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	23.10.2024 05:20
