Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети связи				
1	1	6101-0102-0114ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	11.76	376	4 422
2	4	6101-0206-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1.176	4 156	4 887
3	5	6101-0106-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	10.584	98	1 037
4	6	6101-0107-0501ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	10.584	656	6 943
5	7	6124-0201-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	98	827	81 046
6	8	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6.468	3 818	24 695
7	9	6124-0201-3101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	98	571	55 958
8	10	241-207-0705РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	99.96	4 312	431 028
9	11	1134-0201-0604РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	2	26 924	53 848
10	12	225-201-0101РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	2	44 760	89 520
11	13	1134-0201-0802РСНБ РК 2022	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	2	23 941	47 882
12	14	261-301-0514РСНБ РК 2022	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	2	60 989	121 978
13	15	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3.816	4 271	16 298
			Итого по локальной смете: Наружные сети связи				**939 542**
			ИТОГО по акту:				**939 542**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)			939542.000 x 9.40%	88 316
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			939542.000 + 88316.944	1 027 858
			Сметная прибыль, 5.00%			1027858.944 x 5.00%	51 392
			Непредвиденные расходы, 5.000%			1027858.944 x 5.000%	51 392
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				1 130 644
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557			1130644.839 x 1.0557	1 193 621
			НДС (12%)			1193621.756 x 12%	143 234
			Итого с НДС			1193621.756 + 143234.611	1 336 856

Лист согласования
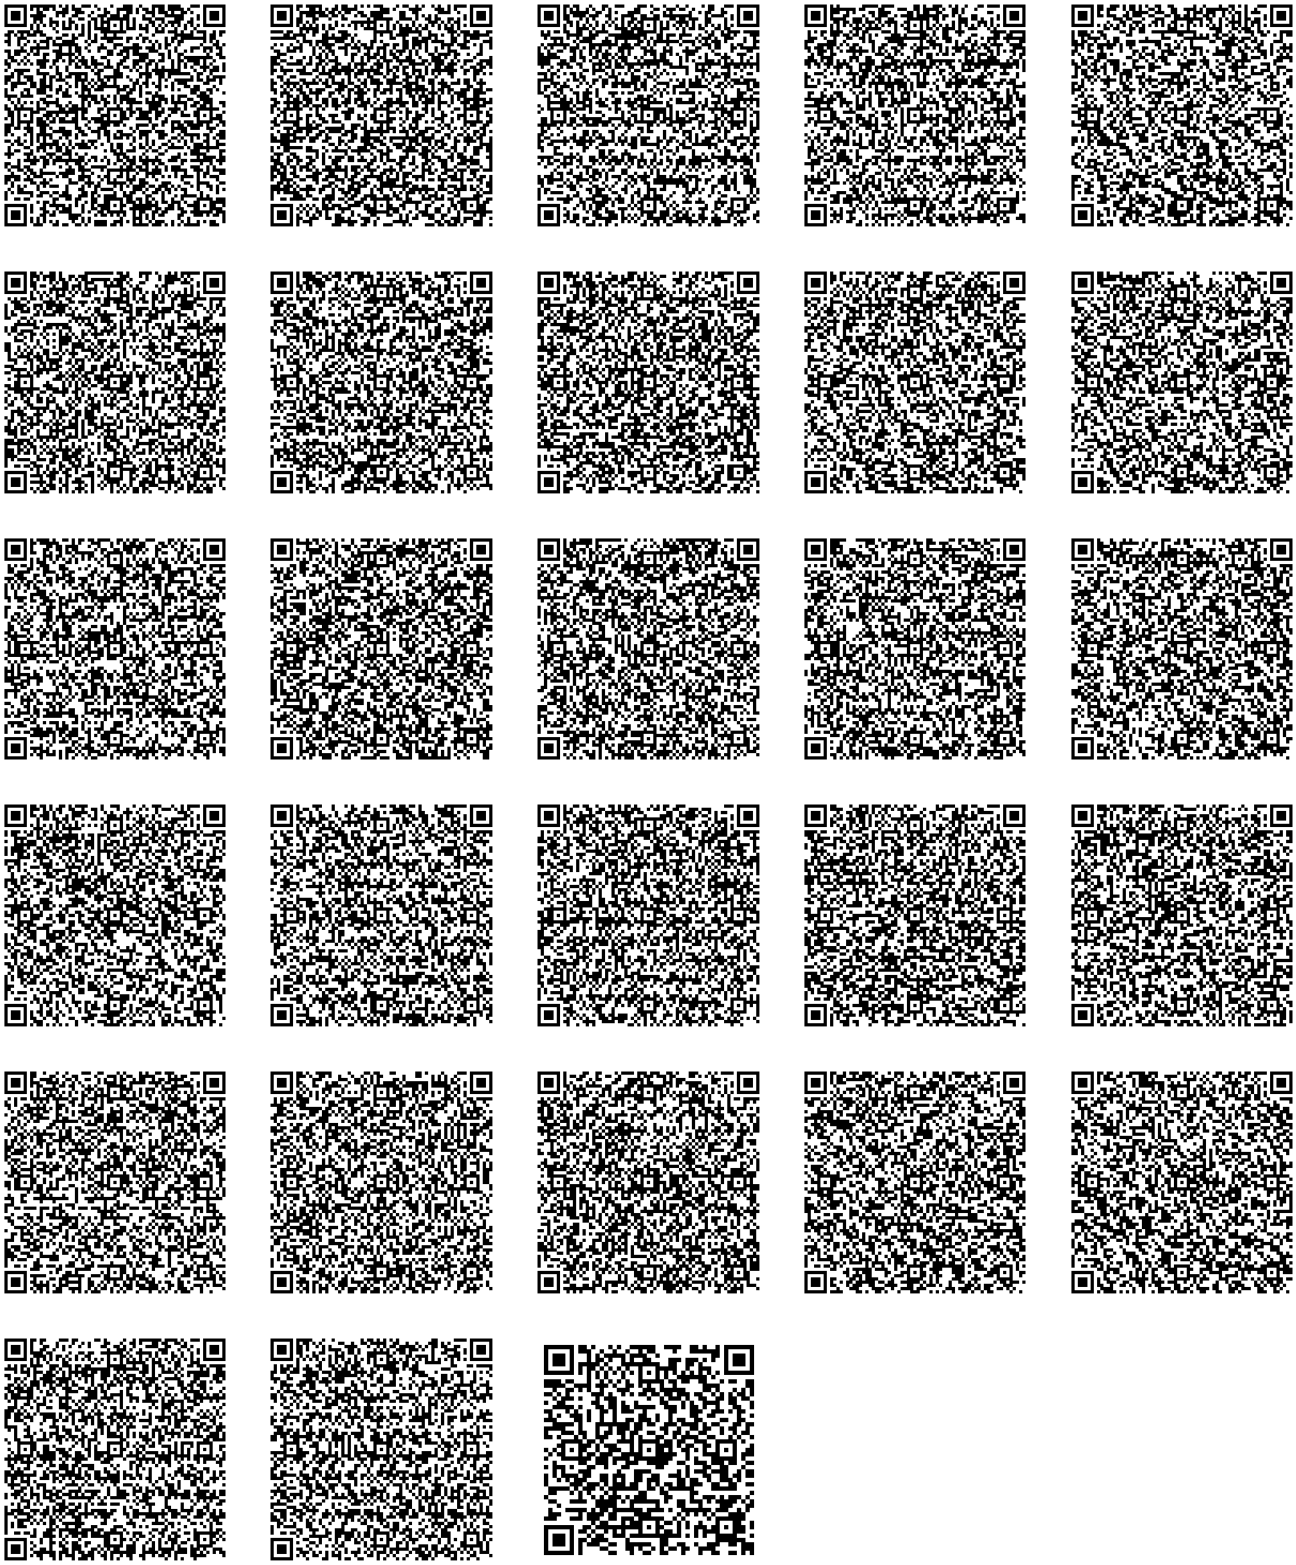
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	21.10.2024 11:53
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	21.10.2024 16:37
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	21.10.2024 16:32
Представители заказчика		
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	22.10.2024 10:33
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	22.10.2024 11:44
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	22.10.2024 12:17
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	23.10.2024 05:13
