Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Автоматическое газовое пожаротушение				
1	1	6125-0601-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча	шт.	1	33 554	33 554
2	2	248-310-0103 СпрСЦ 04.2024	МПТ-1, модуль автоматики пожаротушения	шт.	1	119 449	119 449
3	3	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	7 150	7 150
4	4	248-305-1301 СпрСЦ 04.2024	ЭДУ-ПТ Рубеж, элемент дистанционного управления	шт.	1	19 017	19 017
5	5	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	3	3 079	9 237
6	6	248-304-0207 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!"	шт.	1	3 427	3 427
7	7	248-304-0206 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!"	шт.	1	3 427	3 427
8	8	248-304-0210 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"	шт.	1	3 427	3 427
9	9	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	3 079	3 079

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	3 251	3 251
11	11	6125-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	2	14 169	28 338
12	12	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	2	3 274	6 548
13	13	6125-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	2	5 509	11 018
14	14	248-301-0103 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	2	2 455	4 910
15	15	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	29 575	29 575
16	16	248-306-0397 СпрСЦ 04.2024	Источник электропитания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР (К1)	шт.	1	58 820	58 820
17	17	6124-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	12 990	25 980
18	18	248-306-0376 СпрСЦ 04.2024	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31 882
19	19	1312-0701-0801 РСНБ РК 2022	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования	модуль	1	9 883	9 883
20	20	248-305-0702 РСНБ РК 2022	Модуль пожаротушения газовый с огнетушащим веществом, потолочного исполнения, СТ РК 1902-2009, типа МПТГ-С 30 "FIREX" (42-30-20)	комплект	1	565 660	565 660
21	21	СТРСНБ РК 2022	Огнетушащее вещество из класса хладонов, 227еа	кг.	23	7 629	175 479
22	22	248-305-0702 РСНБ РК 2022	Модуль пожаротушения газовый с огнетушащим веществом, потолочного исполнения, СТ РК 1902-2009, типа МПТГ-С 30 "FIREX" (42-30-20)	комплект	1	565 660	565 660
23	23	СТРСНБ РК 2022	Огнетушащее вещество из класса хладонов, 227еа	кг.	23	7 629	175 479
24	24	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	80	859	68 720
25	25	241-207-1701 СпрСЦ 04.2024	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	80.8	118	9 534

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	243-305-1009 СпрСЦ 04.2024	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	м	81.6	274	22 358
			Итого по локальной смете: Автоматическое газовое пожаротушение				**1 994 862**
			ИТОГО по акту:				**1 994 862**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)				1994862.000 x 9.40%	187 517
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				1994862.000 + 187517.020	2 182 379
		Сметная прибыль, 5.00%				2182379.020 x 5.00%	109 118
		Непредвиденные расходы, 5.000%				2182379.020 x 5.000%	109 118
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					2 400 616
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557				2400616.922 x 1.0557	2 534 331
		НДС (12%)				2534331.285 x 12%	304 119
		Итого с НДС				2534331.285 + 304119.754	2 838 451

Лист согласования
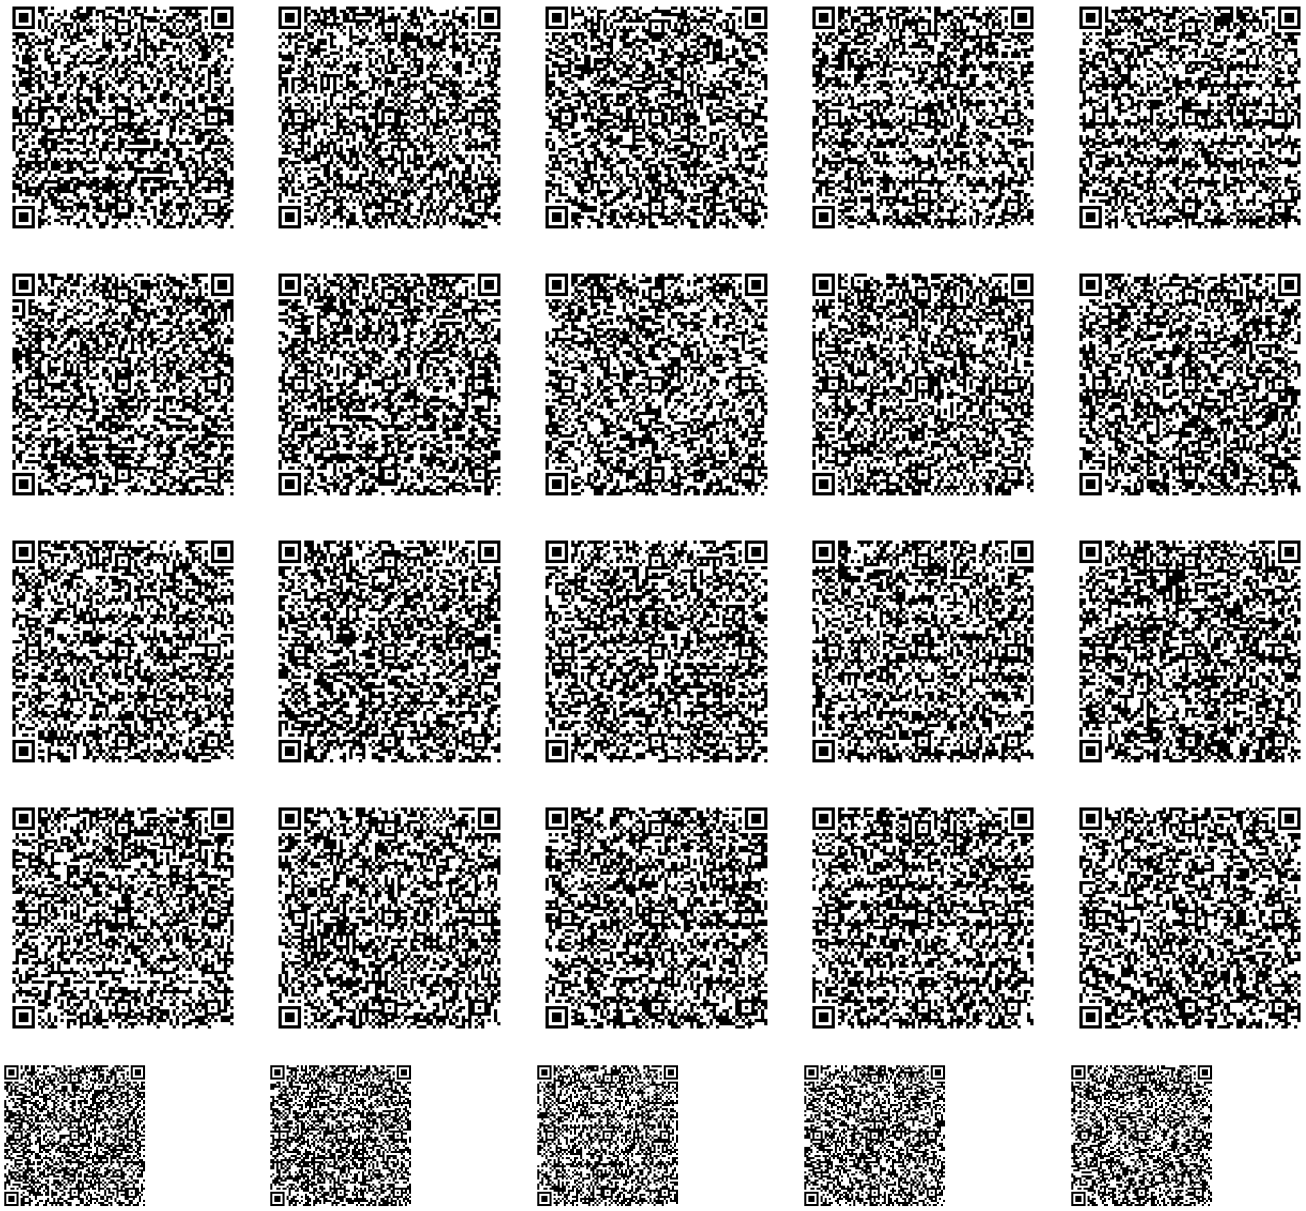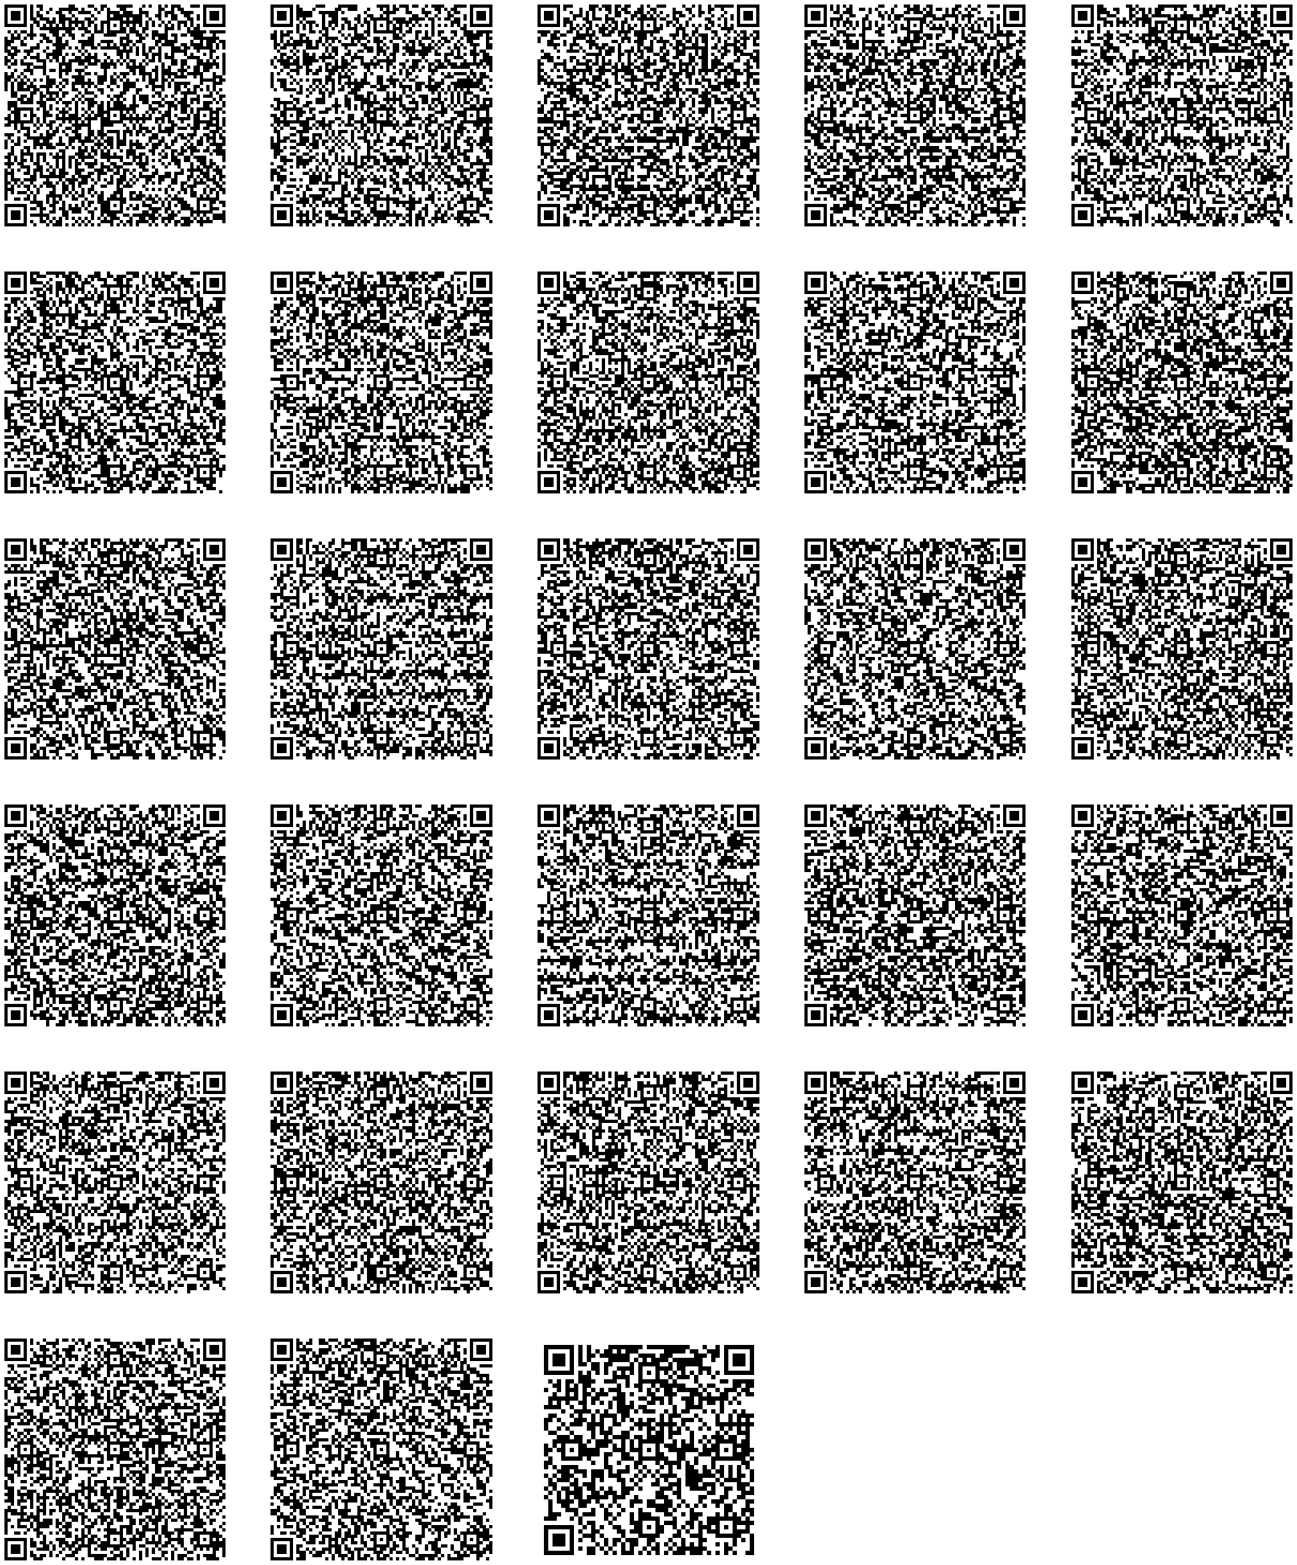
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	22.10.2024 08:07
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	23.10.2024 06:16
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	23.10.2024 06:04
Представители заказчика		
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	23.10.2024 10:20
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	23.10.2024 10:31
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	23.10.2024 11:17
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	23.10.2024 12:58
