Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания АР				
			Раздел: Перегородки из гипсокартона				
			Подраздел: тип С112				
1	37	6107-0201-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм,глухой	м2	380.31	9 690	3 685 203
2	38	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1601.1051	764	1 223 244
3	39	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	19.585965	19 185	375 757
			Итого по подразделу: тип С112				**5 284 205**
			Подраздел: тип С113				
4	40	6107-0201-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм,глухой	м2	23.72	9 532	226 099
5	41	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	99.8612	764	76 294
6	42	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1.22158	19 185	23 436
			Итого по подразделу: тип С113				**325 829**
			Подраздел: Тип С626				
7	43	6107-0204-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены,с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя,глухой	м2	401.34	6 039	2 423 692

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	44	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	842.814	764	643 910
9	45	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	20.66901	19 185	396 535
10	46	6107-0204-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены,с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя,глухой	м2	204.47	6 039	1 234 794
11	47	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	429.387	925	397 183
12	48	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	10.530205	19 185	202 022
			Итого по подразделу: Тип С626				**5 298 136**
			Подраздел: тип С626				
13	49	6107-0204-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены,с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя,глухой	м2	360.91	6 039	2 179 535
14	50	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	757.911	764	579 044
15	51	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	18.586865	19 185	356 589
16	52	6107-0204-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены,с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя,глухой	м2	91.77	6 039	554 199
17	53	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	192.717	925	178 263
18	54	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	4.726155	19 185	90 671
			Итого по подразделу: тип С626				**3 938 301**
			Итого по разделу: Перегородки из гипсокартона				**14 846 471**
			Раздел: Кровля				
			Подраздел: Аэратор				
19	97	6110-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство аэраторов	шт.	140	3 414	477 960
20	98	246-301-0612 СпрСЦ 04.2024	Ротационная вентиляционная турбина (нанодефлектор),пластиковая,диаметром 160 мм /Аэратор/	шт.	140	16 710	2 339 400

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Аэратор				**2 817 360**
			Подраздел: Воронка парапетная				
21	99	6110-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов,воронки	шт.	8	1 139	9 112
22	100	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2 535	20 280
			Итого по подразделу: Воронка парапетная				**29 392**
			Подраздел: Зонт канализационный Зк-1 28шт				
23	101	6118-0204-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт.	28	3 391	94 948
24	102	246-301-0303 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	28	12 483	349 524
			Итого по подразделу: Зонт канализационный Зк-1 28шт				**444 472**
			Подраздел: Вентшахты /АР66-АР84/				
25	111	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.06052	326 417	19 755
26	112	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.59845	114 424	68 477
27	113	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.59845	374 529	224 137
			Итого по подразделу: Вентшахты /АР66-АР84/				**312 369**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-1				
28	114	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	2.82	5 125	14 452
29	115	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.044274	447 151	19 797
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-1				**34 249**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-2				
30	116	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.78	5 125	3 998
31	117	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.012246	447 151	5 476

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-2				**9 474**
			Подраздел: Зонт вентиляционный Зв-3 1шт				
32	118	6118-0204-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм	шт.	1	54 303	54 303
33	122	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.0052	336 962	1 752
34	123	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.01902	335 421	6 380
35	124	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0017	374 529	637
			Итого по подразделу: Зонт вентиляционный Зв-3 1шт				**63 072**
			Подраздел: Зонт вентиляционный Зв-4 1шт				
36	125	6118-0204-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм	шт.	1	54 303	54 303
37	129	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.0052	336 962	1 752
38	130	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.01902	335 421	6 380
39	131	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0017	374 529	637
			Итого по подразделу: Зонт вентиляционный Зв-4 1шт				**63 072**
			Подраздел: Зонт вентиляционный Зв-5 1шт				
40	132	6118-0204-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм	шт.	1	54 303	54 303
41	136	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.0057	336 962	1 921
42	137	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.01947	335 421	6 531
43	138	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0022	374 529	824
			Итого по подразделу: Зонт вентиляционный Зв-5 1шт				**63 579**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-6				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	139	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.16	5 125	5 945
45	140	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.018212	447 151	8 144
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-6				**14 089**
			Подраздел: Зонт вентиляционный Зв-7 1шт				
46	141	6118-0204-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм	шт.	1	54 303	54 303
47	145	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.0057	336 962	1 921
48	146	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.01947	335 421	6 531
49	147	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0022	374 529	824
			Итого по подразделу: Зонт вентиляционный Зв-7 1шт				**63 579**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-8				
50	148	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.23	5 125	6 304
51	149	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.019311	447 151	8 635
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-8				**14 939**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-9				
52	150	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.3	5 125	6 663
53	151	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.02041	447 151	9 126
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-9				**15 789**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-10				
54	152	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.26	5 125	6 458
55	153	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.019782	447 151	8 846

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-10				**15 304**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-11				
56	154	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.89	5 125	4 561
57	155	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.013973	447 151	6 248
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-11				**10 809**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-12				
58	156	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.25	5 125	6 406
59	157	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.019625	447 151	8 775
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-12				**15 181**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-13				
60	158	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.85	5 125	4 356
61	159	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.013345	447 151	5 967
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-13				**10 323**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-17				
62	160	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.85	5 125	4 356
63	161	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.013345	447 151	5 967
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-17				**10 323**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-18				
64	162	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.91	5 125	4 664
65	163	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.014287	447 151	6 388
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-18				**11 052**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-19				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	164	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.12	5 125	5 739
67	165	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.017584	447 151	7 862
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-19				**13 602**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-20				
68	166	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.77	5 125	3 945
69	167	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.012089	447 151	5 406
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-20				**9 352**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-21				
70	168	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.77	5 125	3 945
71	169	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.012089	447 151	5 406
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-21				**9 352**
			Подраздел: Зонт вентиляционный Зв-22 1шт				
72	170	6118-0204-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм	шт.	1	54 303	54 303
73	174	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.0054	336 962	1 820
74	175	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.01917	335 421	6 429
75	176	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0019	374 529	712
			Итого по подразделу: Зонт вентиляционный Зв-22 1шт				**63 265**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-23				
76	177	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.91	5 125	4 664
77	178	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.014287	447 151	6 388

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-23				**11 052**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-24				
78	179	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.9	5 125	4 613
79	180	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.01413	447 151	6 318
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-24				**10 931**
			Подраздел: Зонт вентиляционый Зв-26				
80	181	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.91	5 125	4 664
81	182	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.014287	447 151	6 388
			Итого по подразделу: Зонт вентиляционый Зв-26				**11 052**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-27				
82	183	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.29	5 125	6 611
83	184	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.020253	447 151	9 056
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-27				**15 667**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-31				
84	185	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.01	5 125	5 176
85	186	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.015857	447 151	7 090
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-31				**12 266**
			Подраздел: Зонт вентиляционный Зв-32 1шт				
86	187	6118-0204-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	1	77 656	77 656
87	191	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.0111	336 962	3 740
88	192	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.03336	335 421	11 190

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	193	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0071	374 529	2 659
			Итого по подразделу: Зонт вентиляционный Зв-32 1шт				**95 245**
			Подраздел: Зонт вентиляционный Зв-33 1шт				
90	194	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.57	5 125	8 046
91	195	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.024649	447 151	11 022
			Итого по подразделу: Зонт вентиляционный Зв-33 1шт				**19 068**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-34				
92	196	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.77	5 125	3 945
93	197	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.012089	447 151	5 406
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-34				**9 352**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-44				
94	198	6118-0204-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	1	77 656	77 656
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-44				**77 656**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-45				
95	199	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.07	5 125	5 484
96	200	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.016799	447 151	7 512
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-45				**12 996**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-46				
97	201	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.42	5 125	7 278
98	202	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.022294	447 151	9 969
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-46				**17 247**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-47				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	203	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.62	5 125	3 178
100	204	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.009734	447 151	4 353
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-47				**7 531**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-50				
101	205	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.15	5 125	5 894
102	206	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.018055	447 151	8 073
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-50				**13 967**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-51				
103	207	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.42	5 125	7 278
104	208	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.022294	447 151	9 969
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-51				**17 247**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-52				
105	209	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.42	5 125	7 278
106	210	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.022294	447 151	9 969
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-52				**17 247**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-53				
107	211	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.42	5 125	7 278
108	212	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.022294	447 151	9 969
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-53				**17 247**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-54				
109	213	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.9	5 125	4 613

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	214	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.01413	447 151	6 318
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-54				**10 931**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-55				
111	215	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.42	5 125	7 278
112	216	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.022294	447 151	9 969
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-55				**17 247**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-57				
113	217	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.12	5 125	5 739
114	218	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.017584	447 151	7 862
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-57				**13 602**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-58				
115	219	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	2.48	5 125	12 710
116	220	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.038936	447 151	17 410
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-58				**30 120**
			Подраздел: Накрывочный элемент Нэ-59				
117	221	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	2.77	5 125	14 196
118	222	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.043489	447 151	19 446
			Итого по подразделу: Накрывочный элемент Нэ-59				**33 642**
			Итого по разделу: Кровля				**4 585 313**
			Раздел: Окна /АР 53/				
			Подраздел: Доски подоконные				
119	285	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	600	3 533	2 119 799

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Доски подоконные				**2 119 799**
			Подраздел: Сетки противомоскитные				
120	287	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка сетки антимоскитной	м2	269.3868	5 633	1 517 456
			Итого по подразделу: Сетки противомоскитные				**1 517 456**
			Итого по разделу: Окна /АР 53/				**3 637 255**
			Раздел: Витражи /АР-48/				
			Подраздел: ВН-2; ВН-4				
121	293	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	33.0925	3 848	127 340
122	294	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	41.6075	3 498	145 543
123	295	223-301-0107 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом /солнцезащитный/	м2	33.0925	138 569	4 585 607
124	296	223-301-0207 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом /солнцезащитный/	м2	41.6075	152 488	6 344 663
125	297	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	14	5 885	82 390
126	298	223-502-0104 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса,на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	14	6 531	91 434
			Итого по подразделу: ВН-2; ВН-4				**11 376 977**
			Подраздел: Витражи внутренние ВВ-1				
127	299	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	56.563	3 848	217 654
128	300	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	12.325	3 498	43 113
129	301	223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	56.563	109 410	6 188 558
130	302	223-301-0201 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	12.325	119 322	1 470 644
131	303	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	4	5 885	23 540

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	304	223-502-0104 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса,на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	4	6 531	26 124
			Итого по подразделу: Витражи внутренние ВВ-1				**7 969 633**
			Подраздел: Витражи внутренние ВВ-2---ВВ-9				
133	305	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	202.5301	3 848	779 336
134	306	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	60.9025	3 498	213 037
135	307	223-301-0103 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка),внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2	202.5301	108 394	21 953 048
136	308	223-301-0201 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	60.9025	119 322	7 267 008
137	309	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	20	5 885	117 700
138	310	223-502-0104 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса,на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	20	6 531	130 620
			Итого по подразделу: Витражи внутренние ВВ-2---ВВ-9				**30 460 749**
			Итого по разделу: Витражи /АР-48/				**49 807 359**
			Раздел: Двери /АР-51)				
			Подраздел: Стальные Д-1,Д-8"				
139	311	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная	м2	6.0055	11 394	68 426
140	312	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м2	6.0055	68 169	409 389
141	313	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	2	5 885	11 770
142	314	223-502-0104 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса,на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	6 531	13 062
			Итого по подразделу: Стальные Д-1,Д-8"				**502 647**
			Подраздел: Стальные Д-3",Д-3"",Д-18,Д-19,Д21--Д-24,Д-25"				
143	315	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная	м2	30.1248	11 394	343 241

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
144	316	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	30.1248	42 023	1 265 934
145	317	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического противопожарного,двупольного,глухого или остекленного	м2	24.28407	17 082	414 820
146	318	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	22.32	58 080	1 296 345
147	319	223-207-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,двупольный	м2	2.6116	67 178	175 441
148	320	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	15	5 885	88 275
149	321	223-502-0104 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса,на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	15	6 531	97 965
			Итого по подразделу: Стальные Д-3",Д-3"",Д-18,Д-19,Д21--Д-24,Д-25"				**3 682 024**
			Подраздел: Стальные однопольные Д-5",Д-6,Д-6"" Д-9,Д-27				
150	322	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического противопожарного,однопольного,глухого или остекленного	м2	12.57	15 626	196 418
151	323	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	12.57	52 373	658 328
152	324	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	6	5 885	35 310
153	325	223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса,на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	6	5 220	31 320
154	326	1114-0303-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	м2	3.781	5 901	22 311
155	327	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3.781	33 823	127 884
			Итого по подразделу: Стальные однопольные Д-5",Д-6,Д-6"" Д-9,Д-27				**1 071 573**
			Подраздел: Алюминивые Д-2,Д-7,Д-25				
156	328	6108-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной,площадь проема до 3 м2	м2	36.9869	10 619	392 764

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
157	329	223-205-0505 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА С 21-13	м2	36.9869	102 774	3 801 291
158	330	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	13	5 885	76 505
159	331	223-502-0105 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса,на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	13	8 993	116 909
			Итого по подразделу: Алюминивые Д-2,Д-7,Д-25				**4 387 469**
			Подраздел: Дверь стальная решетчатая Д8п				
160	332	1114-0303-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	м2	1	5 901	5 900
161	333	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	0.0522	932 114	48 656
			Итого по подразделу: Дверь стальная решетчатая Д8п				**54 557**
			Подраздел: Двери герметичные				
162	334	6118-0206-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверей герметических утепленных размер 1250х500 мм	шт.	1	84 687	84 687
			Итого по подразделу: Двери герметичные				**84 687**
			Подраздел: Деревянные Д-3--Д-5,Д-9				
163	335	1114-0303-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	215.01829	6 048	1 300 430
164	336	6108-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях,площадь проема более 3 м2	м2	1.89251	5 446	10 306
165	337	223-201-0814 СпрСЦ 04.2024	Блок дверной внутренний типа Le porte,термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДО 20-13,ДО 20,5-13,двупольная,МДФ 6 мм,наполнение полотна Белтермо,антивандальные алюминиевые кромки,отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см,с двух сторон	комплект	34	147 658	5 020 372
166	338	223-201-0802 СпрСЦ 04.2024	Блок дверной внутренний типа Le porte,термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6,ДГ 20-7,ДГ 20-8,ДГ 20-9,МДФ 6 мм,наполнение полотна Белтермо,антивандальные алюминиевые кромки,отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см,с двух сторон	комплект	52	82 335	4 281 420
167	339	223-201-0808 СпрСЦ 04.2024	Блок дверной внутренний типа Le porte,термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-12,МДФ 6 мм,наполнение полотна Белтермо,антивандальные алюминиевые кромки,отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см,с двух сторон	комплект	4	115 309	461 236
168	341	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	300	601	180 300
169	342	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	96	4 853	465 888

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
170	343	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	10	768	7 680
171	344	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники.Установка и крепление	м коробок	524.407	866	454 136
			Итого по подразделу: Деревянные Д-3--Д-5,Д-9				**12 181 769**
			Итого по разделу: Двери /АР-51)				**21 964 729**
			Раздел: Отделка стен				
			Подраздел: Отделка по кирпичу				
172	737	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	м2	3330.48	2 219	7 390 335
173	738	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена,подготовленная под окраску	м2	1786.32	1 170	2 089 993
174	739	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	1786.32	599	1 070 006
			Итого по подразделу: Отделка по кирпичу				**10 550 335**
			Подраздел: Отделка по газоблоку				
175	742	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	м2	947.1	2 219	2 101 615
			Итого по подразделу: Отделка по газоблоку				**2 101 615**
			Подраздел: Отделка по ГКЛ				
176	744	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м2	113.71	1 382	157 147
177	745	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена,подготовленная под окраску	м2	47.29	1 170	55 329
178	746	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	47.29	599	28 327
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛ				**240 803**
			Подраздел: отделка по утеплителю				
179	750	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	м2	116.25	2 219	257 959
			Итого по подразделу: отделка по утеплителю				**257 959**
			Подраздел: Отделка по низу стен				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
180	752	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	1486.57	8 568	12 736 932
181	753	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1516.3014	1 416	2 147 083
			Итого по подразделу: Отделка по низу стен				**14 884 015**
			Подраздел: Фартук				
182	754	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	5.4	11 165	60 291
			Итого по подразделу: Фартук				**60 291**
			Подраздел: Откосы				
183	757	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	м2	377.6	2 278	860 173
			Итого по подразделу: Откосы				**860 173**
			Подраздел: Отделка по кирпичу				
184	760	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	м2	4525.05	2 219	10 041 086
185	761	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена,подготовленная под окраску	м2	452.03	1 170	528 875
186	762	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	452.03	599	270 766
			Итого по подразделу: Отделка по кирпичу				**10 840 727**
			Подраздел: Отделка по газоблоку				
187	765	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	м2	6.54	2 219	14 512
188	770	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м2	15.45	1 382	21 352
			Итого по подразделу: Отделка по газоблоку				**35 864**
			Подраздел: Отделка по ГКЛ				
189	772	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м2	263.9	1 382	364 710
190	773	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена,подготовленная под окраску	м2	14.4	1 170	16 848

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
191	774	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	14.4	599	8 626
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛ				**390 184**
			Подраздел: отделка по утеплителю				
192	778	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	м2	35.11	2 219	77 909
			Итого по подразделу: отделка по утеплителю				**77 909**
			Подраздел: Отделка по низу стен				
193	781	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	376.69	8 568	3 227 480
194	782	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	384.2238	7 380	2 835 572
			Итого по подразделу: Отделка по низу стен				**6 063 052**
			Подраздел: Фартук				
195	783	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	14.04	11 165	156 757
			Итого по подразделу: Фартук				**156 757**
			Подраздел: Откосы				
196	786	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	м2	275.47	2 278	627 521
			Итого по подразделу: Откосы				**627 521**
			Подраздел: Отделка по кирпичу				
197	789	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	м2	4236.07	2 219	9 399 839
198	790	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена,подготовленная под окраску	м2	239.22	1 170	279 887
199	791	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	239.22	599	143 293
			Итого по подразделу: Отделка по кирпичу				**9 823 019**
			Подраздел: Отделка по ГКЛ				
200	793	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м2	113.35	1 382	156 650

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
201	794	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена,подготовленная под окраску	м2	11.84	1 170	13 853
202	795	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	11.84	599	7 092
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛ				**177 595**
			Подраздел: отделка по утеплителю				
203	799	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	м2	471.44	2 219	1 046 125
			Итого по подразделу: отделка по утеплителю				**1 046 125**
			Подраздел: Отделка по низу стен				
204	801	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	305.71	8 568	2 619 323
205	802	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	311.8242	7 380	2 301 263
			Итого по подразделу: Отделка по низу стен				**4 920 586**
			Подраздел: Фартук				
206	803	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	2.16	11 165	24 116
			Итого по подразделу: Фартук				**24 116**
			Подраздел: Откосы				
207	806	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	м2	249.22	2 278	567 723
			Итого по подразделу: Откосы				**567 723**
			Итого по разделу: Отделка стен				**63 706 369**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Р Решетки вентиляционные Рв1-Рв-4 /РП л.102				
208	964	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0.19855	254 272	50 486
209	965	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0.12999	382 131	49 673
210	966	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.06856	374 529	25 678

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
211	967	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5.75795	414	2 384
			Итого по подразделу: Р Решетки вентиляционные Рв1-Рв-4 /РП л.102				**128 221**
			Итого по разделу: Разные работы				**128 221**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания АР				**158 675 719**
			ИТОГО по акту:				**158 675 719**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)	158675719.111 x 9.40%	14 915 516
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	158675719.111 + 14915516.991	173 591 236
	Сметная прибыль, 5.00%	173591236.103 x 5.00%	8 679 561
	Непредвиденные расходы, 5.000%	173591236.103 x 5.000%	8 679 561
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		190 950 359
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557	190950359.713 x 1.0557	201 586 294
	НДС (12%)	201586294.749 x 12%	24 190 355
	Итого с НДС	201586294.749 + 24190355.370	225 776 650

Лист согласования
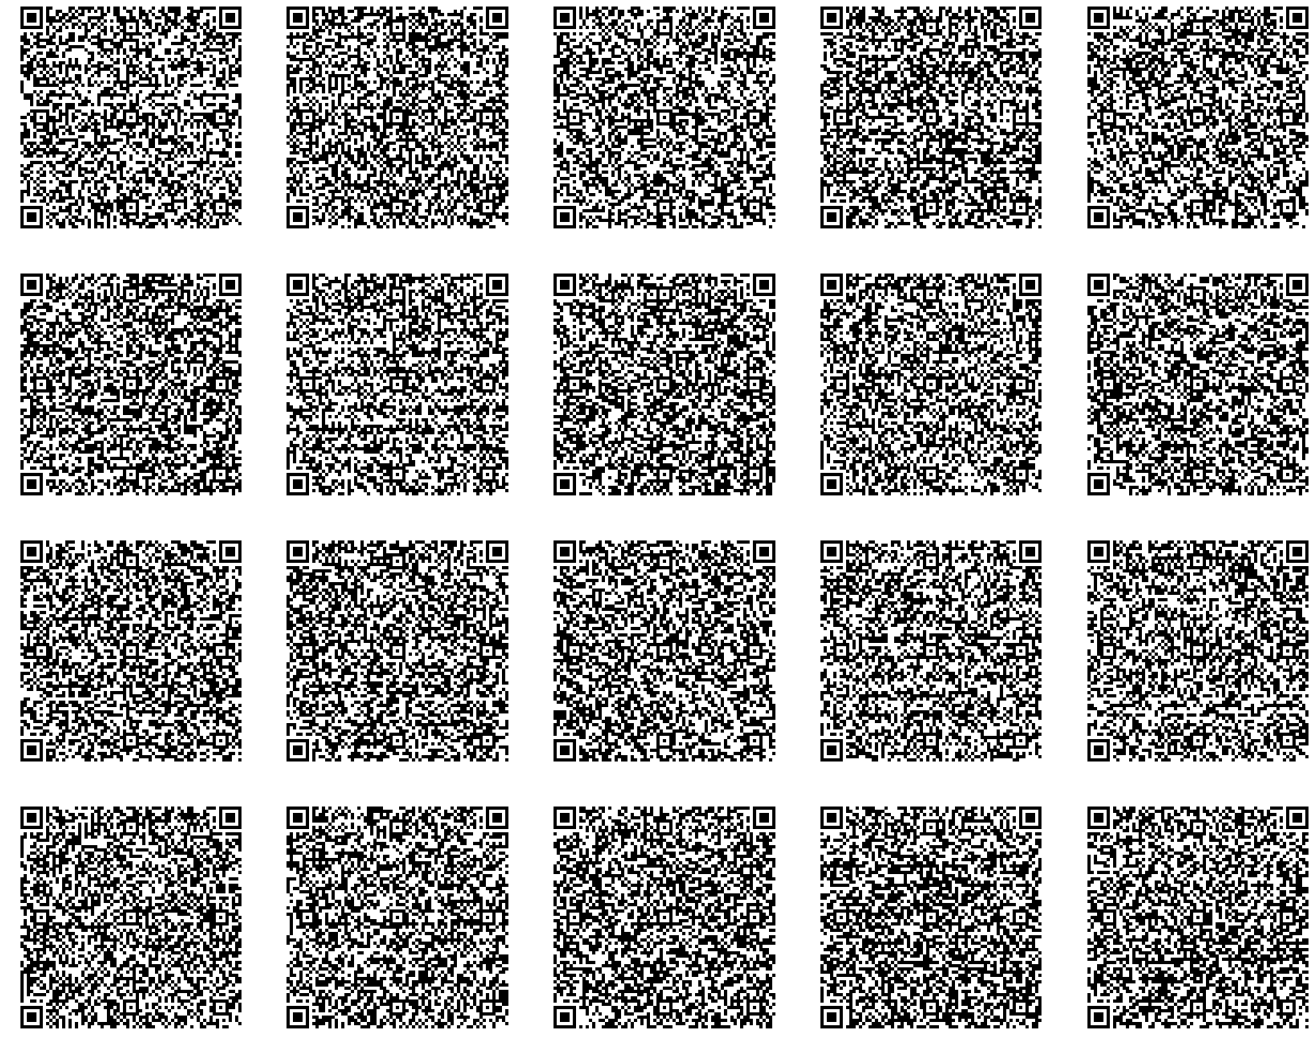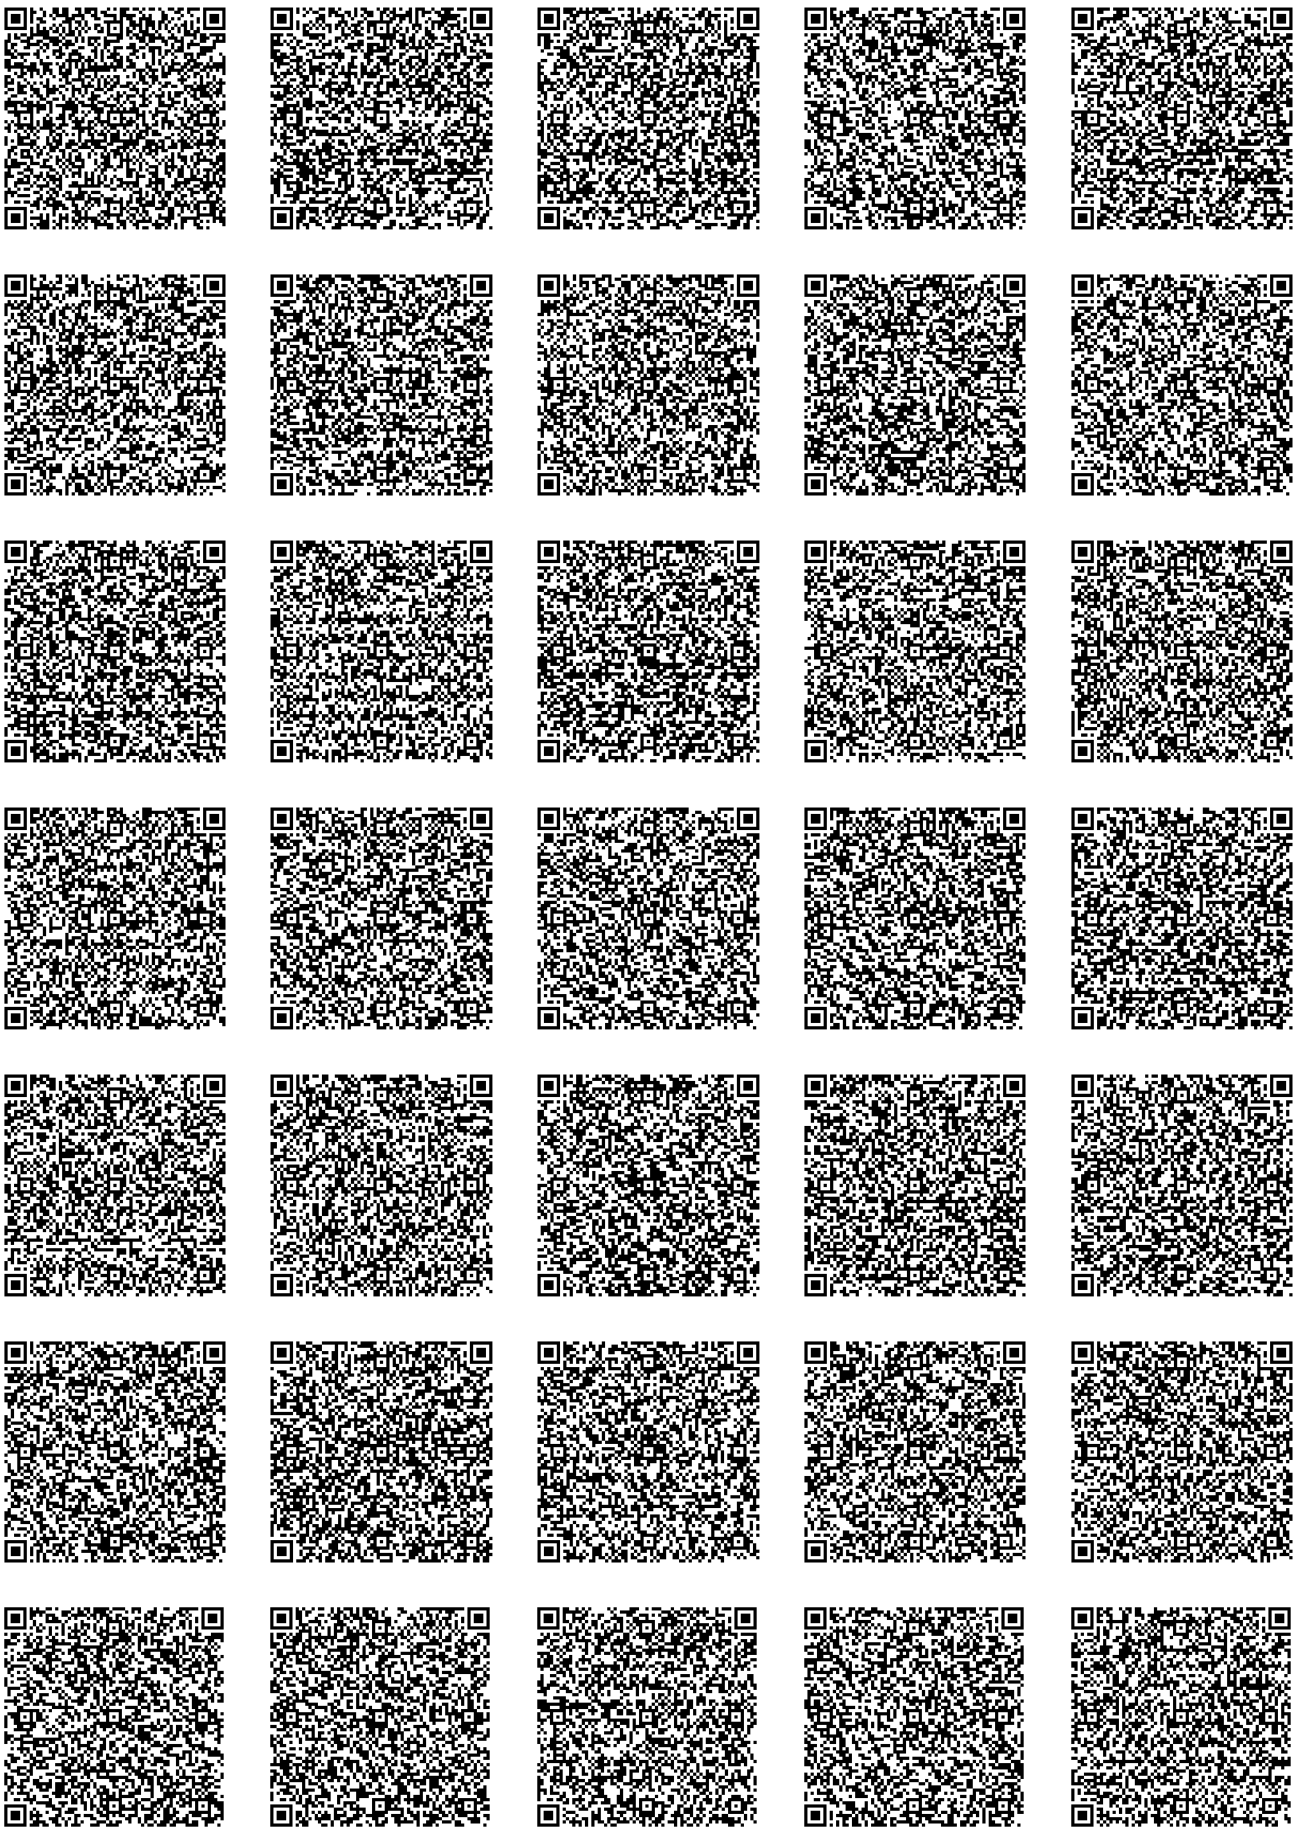
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	12.12.2024 13:45
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	13.12.2024 07:21
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	12.12.2024 16:21
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	16.12.2024 14:24 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	17.12.2024 08:05
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	15.12.2024 10:47
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	15.12.2024 13:28
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	16.12.2024 08:06 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
