Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система контроля и управления доступом. Охранная сигнализация				
1	1	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	3500	859	3 006 500
2	2	241-207-1703СпрСЦ 04.2024	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	3535	204	721 140
3	3	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	7240	392	2 838 080
4	4	243-305-0909СпрСЦ 04.2024	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	м	204	245	49 980
5	5	243-305-0921СпрСЦ 04.2024	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	м	300	590	177 000
6	6	243-305-0922СпрСЦ 04.2024	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5	м	3100	1 101	3 413 100
7	7	243-304-0137СпрСЦ 04.2024	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	7140	485	3 462 900
8	8	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 748	4 748
9	9	248-102-3702СпрСЦ 04.2024	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual) с кабельным органайзером	шт.	1	17 913	17 913
10	10	248-102-2507СпрСЦ 04.2024	Органайзер кабельный типа Hyperline, 1U, с 5 кольцами	шт.	1	8 080	8 080
11	11	6125-0205-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка, включение перемычек кабельных в кабельном канале с укладкой между секциями одного статива - монтаж патч-корда	шт.	31	218	6 758
12	12	243-906-2504СпрСЦ 04.2024	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	30	3 194	95 820

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	243-906-2411СпрСЦ 04.2024	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH	шт.	1	6 462	6 462
14	14	6125-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	37 751	37 751
15	15	248-404-0702СпрСЦ 04.2024	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI	шт.	1	272 915	272 915
16	16	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	2	4 748	9 496
17	17	248-404-1605СпрСЦ 04.2024	Модуль SFP, HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM оптический, дальность до 1км, 1310нм	шт.	2	12 596	25 192
18	18	6125-0801-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	комплект	25	4 140	103 500
19	19	248-405-0139СпрСЦ 04.2024	DS-K2604T, контроллер доступа	шт.	3	265 042	795 126
20	20	248-405-0138СпрСЦ 04.2024	DS-K2602T, контроллер доступа	шт.	22	212 426	4 673 372
21	21	6124-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	25	12 990	324 750
22	22	248-306-0376СпрСЦ 04.2024	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	25	15 941	398 525
23	23	6125-0801-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	71	4 140	293 940
24	24	248-405-0214РСНБ РК 2022	DS-K1802, считыватель бесконтактных карт	шт.	71	14 079	999 609
25	25	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	11	7 150	78 650
26	26	248-405-0515РСНБ РК 2022	DHI-ASF908, бесконтактная кнопка "Выход"	шт.	11	32 204	354 244
27	27	1310-1001-0605РСНБ РК 2022	Монтаж и расключение электромагнитного замка	шт.	39	12 238	477 282
28	28	248-405-0606РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный DHI-ASF500B	шт.	4	286 275	1 145 100
29	29	248-405-0607РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный ST-EL350ML, 12 VDC/500мА или 24VDC/250мА, усилие 350 кг	шт.	35	46 568	1 629 880
30	30	248-405-0527СпрСЦ 04.2024	DS-K4H250-LZ, LZ-образное крепление для магнитного замка DS-K4H250S/D	шт.	43	29 288	1 259 384
31	31	248-405-0520РСНБ РК 2022	ST-ER114D-GN, устройство разблокировки двери со стеклянной вставкой	шт.	28	6 588	184 464

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	6125-0601-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	43	5 625	241 875
33	33	248-301-0104РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели СН 03	шт.	43	479	20 597
34	34	248-405-0407РСНБ РК 2022	FM11RF08-M1, бесконтактная смарт-карта Mifare1	шт.	170	448	76 160
35	35	6125-0801-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж турникета -трипода напольного	шт.	9	17 021	153 189
36	36	248-405-1418СпрСЦ 04.2024	Турникет тумбовый NT02	шт.	9	847 509	7 627 581
37	37	6125-0801-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж турникета -калитки электромеханической	шт.	2	11 492	22 984
38	38	248-405-1551СпрСЦ 04.2024	Турникет створчатый DS-K3BC411X-R/M-Dm110	шт.	2	581 463	1 162 926
39	39	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	12	78 738	944 856
40	40	6125-1101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6 031	6 031
41	41	521-101-0401028 СпрСЦ 04.2024	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	476 903	476 903
42	42	521-101-0401009 СпрСЦ 04.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9 031
43	43	6125-1101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6 031	6 031
44	44	521-101-0401026 СпрСЦ 04.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53 563
45	45	6125-0801-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	комплект	1	4 140	4 140
46	46	248-405-0216РСНБ РК 2022	DS-K1F100-D8E, настольный считыватель бесконтактных карт	шт.	1	24 129	24 129
47	47	248-405-0144СпрСЦ 04.2024	STR20-IP, контроллер сетевой доступа с базовой лицензией /Базовая лицензия на 16 дверей HikCentral "HikCentral-AC-ACS/	шт.	1	375 326	375 326
48	49	248-405-0127РСНБ РК 2022	DHI-ASA3213GL-MW-DTK, терминал учета рабочего времени	шт.	1	214 691	214 691

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	50	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	700	859	601 300
50	51	241-207-1701СпрСЦ 04.2024	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	707	118	83 426
51	52	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	840	392	329 280
52	53	243-305-0909СпрСЦ 04.2024	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	м	1530	245	374 850
53	54	243-305-0602СпрСЦ 04.2024	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	20	211	4 219
54	55	243-305-0602СпрСЦ 04.2024	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	20	211	4 219
55	56	6125-0202-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	2	66 810	133 620
56	57	248-306-0343РСНБ РК 2022	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х12-Р БР/ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР	шт.	1	39 608	39 608
57	58	РСНБ РК 2022	Блок резервного питания, БР 12 2х40	шт.	1	35 696	35 696
58	59	6124-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	4	12 990	51 960
59	60	248-306-0388СпрСЦ 04.2024	Аккумулятор 12 В, 40 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1240М	шт.	4	163 315	653 260
60	61	6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 478	17 478
61	62	248-303-0234СпрСЦ 04.2024	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ШКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112	250 112
62	63	6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 478	17 478
63	64	248-303-1101СпрСЦ 04.2024	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969	122 969
64	65	6125-0601-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	69	5 625	388 125
65	66	248-301-0914РСНБ РК 2022	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	шт.	22	20 060	441 320
66	67	248-301-0915РСНБ РК 2022	Извещатель охранный Модели ИО-30920-2	шт.	20	26 851	537 020
67	68	248-301-0916СпрСЦ 04.2024	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание	шт.	27	3 659	98 793

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	69	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	3 079	3 079
69	70	248-304-0302РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	3 251	3 251
70	71	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	3	9 132	27 396
71	72	248-303-1002СпрСЦ 04.2024	IDC Мектеп, тревожная кнопка	шт.	3	632 510	1 897 530
			Итого по локальной смете: Система контроля и управления доступом. Охранная сигнализация				**44 407 664**
			ИТОГО по акту:				**44 407 664**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)	43832471.216 x 9.40%	4 120 252
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	44407664.216 + 4120252.127	48 527 916
	Сметная прибыль, 5.00%	47952723.343 x 5.00%	2 397 636
	Непредвиденные расходы, 5.000%	48527916.343 x 5.000%	2 426 395
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		53 351 948
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557	53351948.327 x 1.0557	56 323 651
	НДС (12%)	56323651.849 x 12%	6 758 838
	Итого с НДС	56323651.849 + 6758838.222	63 082 490

Лист согласования
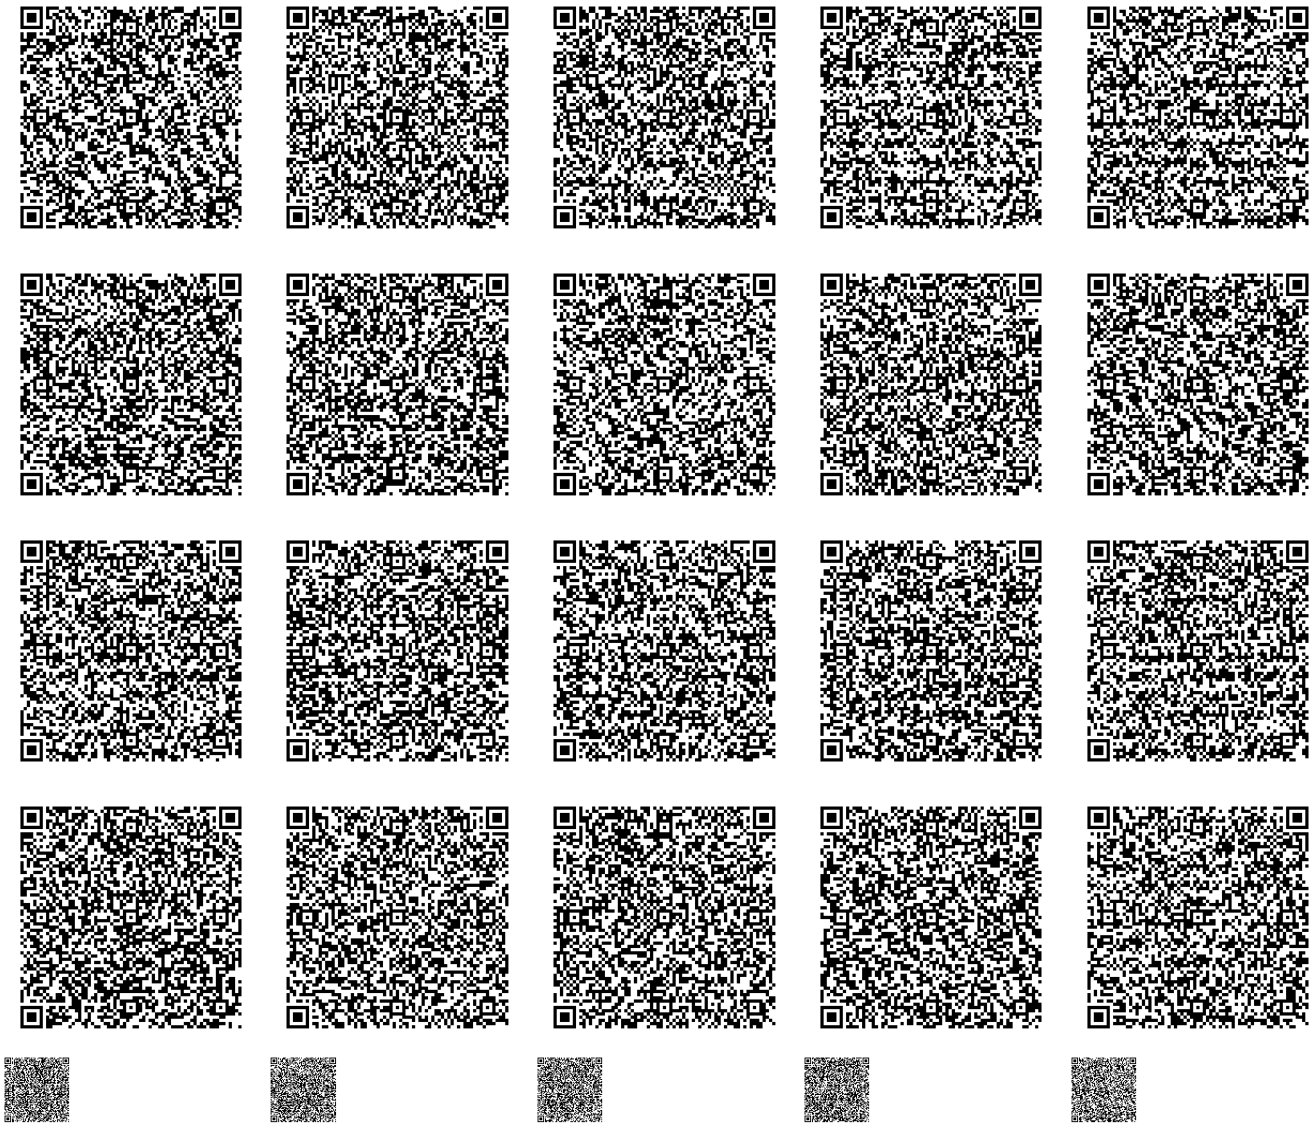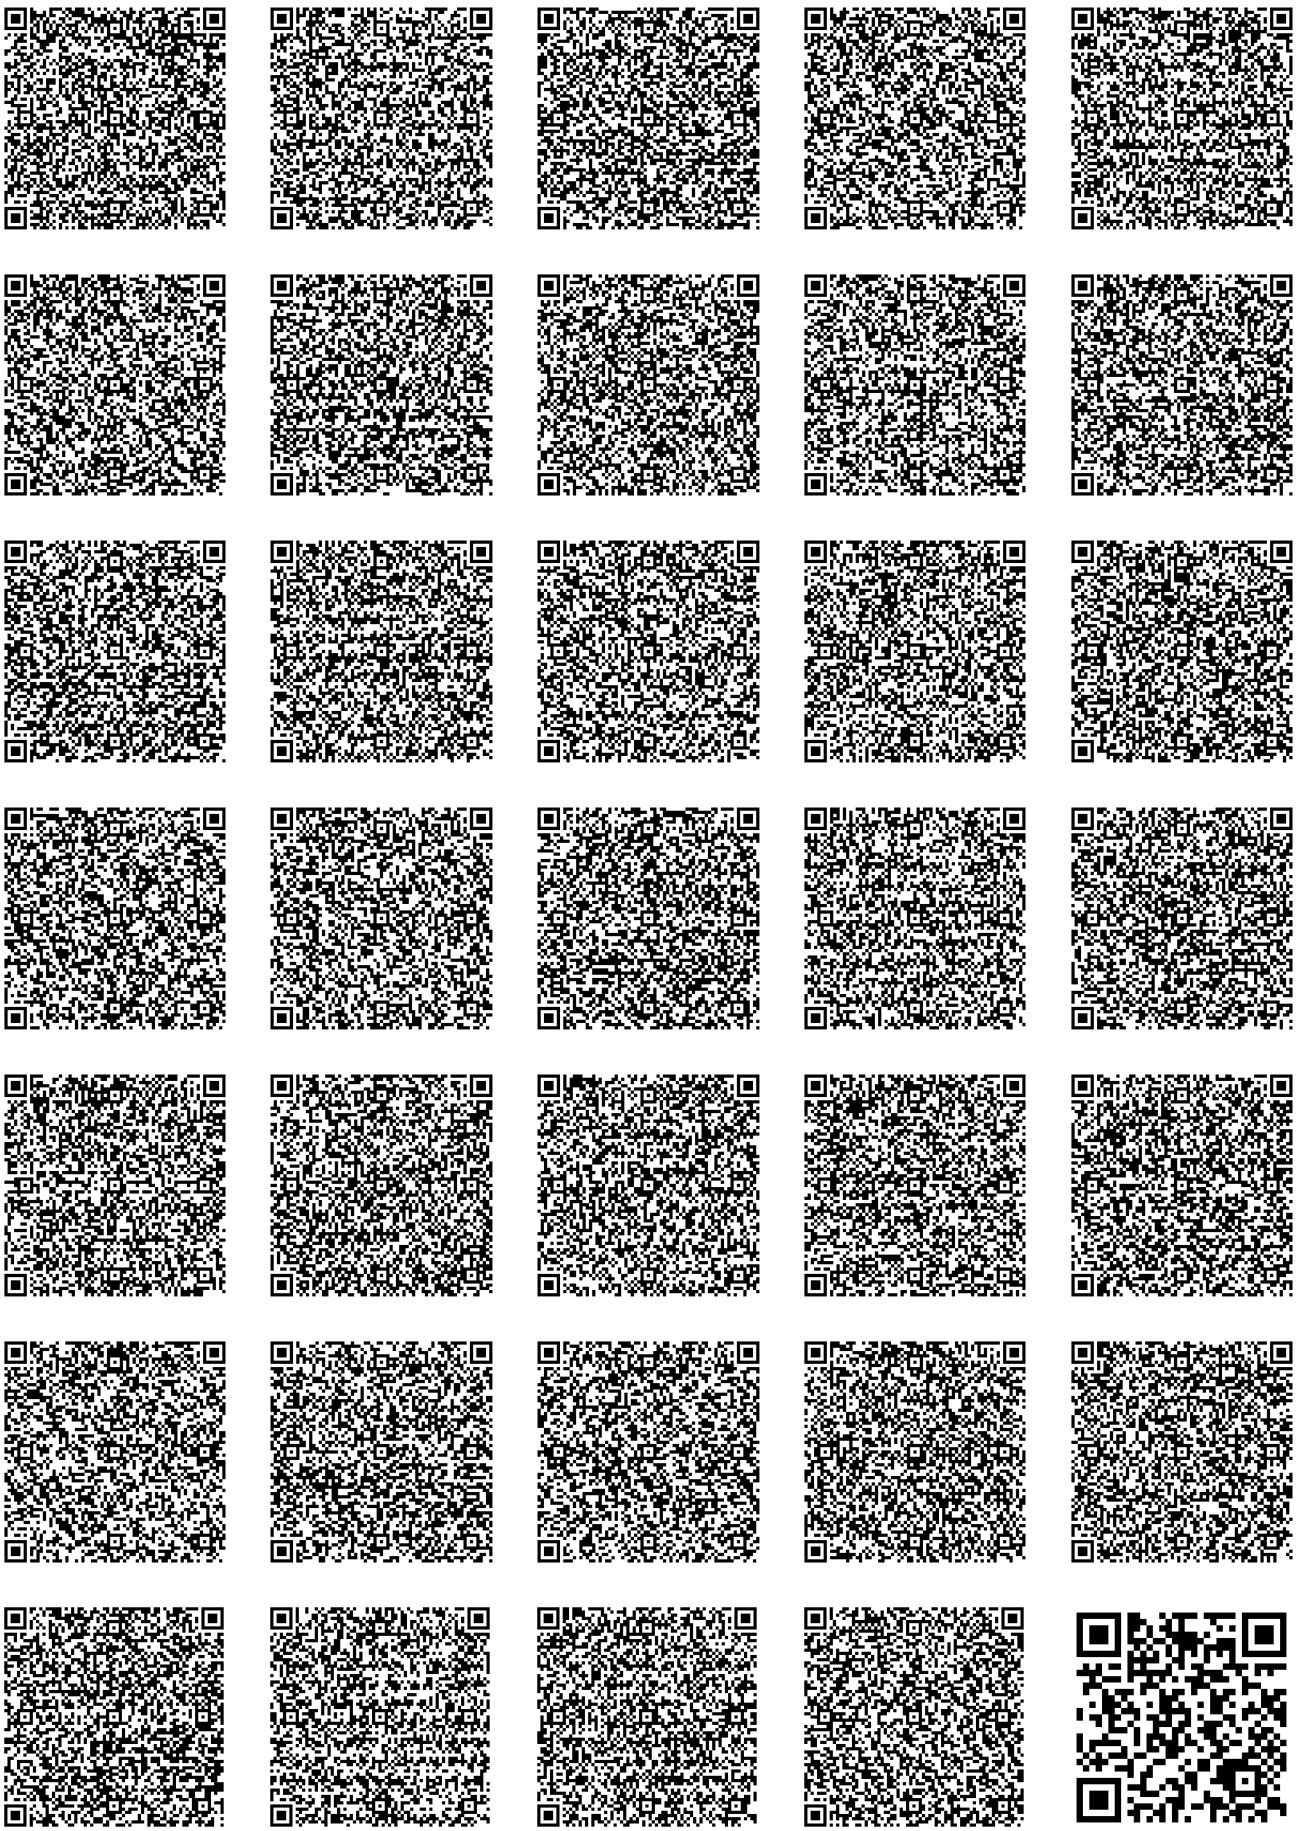
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	25.12.2024 17:13
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	26.12.2024 02:47
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	26.12.2024 03:25
Представители заказчика		
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	27.12.2024 11:43
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	27.12.2024 14:36
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	26.12.2024 08:35 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	27.12.2024 11:34
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист (сметчик) отдела смет и ценообразования	27.12.2024 14:10 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
