Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети газоснабжения				
			Раздел: Резервуарная установка сжиженного углеводородного газа				
			Подраздел: РРезервуарная установка сжиженного углеводородного газа				
1	65	1109-0202-0202 РСНБ РК 2022	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 1,2 МПа. Монтаж	т конструкций	9	321 948	2 897 532
2	66	513-302-0312 СпрСЦ 04.2024	Резервуар подземного размещения отопительный стальной 09Г2С, с промышленной крышкой для СУГ D 1600, V 24,9 м3,в комплекте: 2 предохранительных клапана, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух, типа FAS-24,9 ПО	комплект	2	8 257 103	16 514 206
			Итого по подразделу: РРезервуарная установка сжиженного углеводородного газа				**19 411 738**
			Подраздел: Колонка сливная ГСН.Н1				
3	69	6123-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	4	18 865	75 460
4	72	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 438	2 876
5	73	245-701-0703 СпрСЦ 04.2024	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 100	шт.	2	7 617	15 234
6	74	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1 797	3 594
7	75	6123-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0.00254	3 773 003	9 583
8	76	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0.606	483	293

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	77	241-108-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	0.75	1 143	857
10	78	241-108-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	1.19	3 611	4 297
11	79	241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	359	359
12	80	241-112-0127 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	2	1 015	2 030
13	81	241-113-0103 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	1 110	1 110
14	82	241-113-0109 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	2	2 517	5 034
15	83	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	530	1 060
16	84	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415	9 660
17	85	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	3 383	6 766
18	86	261-301-0252 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 65 мм	шт.	2	563	1 126
19	87	241-117-0305 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 65 мм	шт.	2	3 312	6 624
20	88	241-703-0503 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 - 4,0 (10-40), наружный диаметр 60 мм	1000 шт.	0.001	13 438	13
21	89	241-703-0503 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 - 4,0 (10-40), наружный диаметр 60 мм	1000 шт.	0.001	13 438	13
22	90	241-703-0114 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0.004	99 450	398
23	91	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.282	708	200

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	92	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.096	1 092	1 197
			Итого по подразделу: Колонка сливная ГСН.Н1				**147 784**
			Подраздел: Шкаф защитный колонки сливной				
25	93	6124-0103-1501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях, масса до 100 кг	шт.	1	16 284	16 284
26	94	222-509-0902 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой 0,1-0,5 т	т	0.10229	1 063 681	108 804
27	95	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601	1 202
28	96	223-502-0308 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	1	6 869	6 869
29	97	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	5.5	206	1 133
			Итого по подразделу: Шкаф защитный колонки сливной				**134 292**
			Подраздел: Устройство заземления автоцистерн УЗА-3В, длина заземляющего проводника 15 м				
30	103	СТПеречень РСНБ РК 2022	Устройство заземления автоцистерн УЗА-3В, длина заземляющего проводника 15 м Ех СЕНС 424411.001 ТУ	комплект.	1	155 089	155 089
			Итого по подразделу: Устройство заземления автоцистерн УЗА-3В, длина заземляющего проводника 15 м				**155 089**
			Подраздел: Комплект крепления резервуара 29/05/23-ГСН.Н2 6шт				
31	104	222-515-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	0.0723972	1 239 912	89 766
			Итого по подразделу: Комплект крепления резервуара 29/05/23-ГСН.Н2 6шт				**89 766**
			Подраздел: Трубопроводы и арматура				
32	106	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	12 970	51 880
33	108	242-309-0502 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 20	шт.	2	11 949	23 898
34	109	6123-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0.0572	3 773 003	215 816
35	110	241-108-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм	м	0.2	988	198

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	111	241-108-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	28	1 143	32 004
37	112	241-108-0110 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 38х3,0 мм	м	21	1 376	28 896
38	113	241-108-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	8	3 611	28 888
39	114	241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	22	359	7 898
40	115	241-112-0115 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,5 мм	шт.	6	371	2 226
41	116	241-112-0127 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	4	1 015	4 060
42	117	241-113-0103 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	3	1 110	3 330
43	118	241-113-0104 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	4	1 165	4 660
44	119	241-113-0109 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	4	2 517	10 068
45	120	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	287	574
46	121	241-114-0104 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	6	323	1 938
47	122	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	3	530	1 590
48	123	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	3	476	1 428
49	124	241-116-0303 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	2	845	1 690
50	125	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	999	3 996

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	126	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1 547	6 188
52	127	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415	9 660
53	128	241-117-0301 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 25 мм	шт.	2	1 084	2 168
54	129	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7.36	1 092	8 036
55	130	241-703-0501 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 - 4,0 (10-40), наружный диаметр 45 мм	1000 шт.	0.012	8 959	108
56	131	241-703-0108 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0.004	54 243	217
57	132	241-703-0108 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0.006	54 243	325
58	133	241-703-0110 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-32-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0.004	63 285	253
59	134	241-703-0114 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0.004	99 450	398
			Итого по подразделу: Трубопроводы и арматура				**452 392**
			Подраздел: Насадка для свечи				
60	135	245-510-0402 РСНБ РК 2022	Насадка для свечи - Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	4	4 115	16 460
61	136	241-115-0103 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм	шт.	4	312	1 248
62	137	241-119-0103 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	2	118	236
63	138	241-119-0403 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 25 мм	шт.	2	212	424
64	139	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	3 383	6 766

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	140	261-301-0258 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	2	81	162
66	141	241-115-0104 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	2	443	886
67	142	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.05772	374 529	21 618
68	143	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00024	344 590	83
69	144	1125-0129-0401 РСНБ РК 2022	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	4	100 317	401 268
70	145	247-308-0410 СпрСЦ 04.2024	Комплектующие системы электрохимзащиты ПМ-10У SHIK, протектор магниевый	шт.	4	44 197	176 788
71	146	247-308-0201 СпрСЦ 04.2024	Стойка контрольно-измерительного пункта электрохимзащиты СКИП-1-4-5-2,0 SHIK// СКИП-Г-1-6	шт.	1	54 758	54 758
72	147	247-308-0302 СпрСЦ 04.2024	Электрод сравнения медносульфатный электрохимзащиты ЭСМ-ОС SHIK однокамерный стационарный// Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризирующийся с соединительным кабелем в комплекте ЭНЕС-1	шт.	1	19 519	19 519
73	148	247-308-0421 СпрСЦ 04.2024	Комплектующие системы электрохимзащиты БПИ-3 SHIK, блок пластин индикаторов (датчик скорости коррозии)	шт.	1	16 917	16 917
74	149	243-107-0104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-0,66	м	5	482	2 410
75	150	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ Подушка ЭЗК13	м3	0.001	57 413	57
76	151	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.01	3 818	38
77	152	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.00005	382 131	19
78	153	243-902-1004 РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-25	100 шт.	0.01	18 346	183
79	154	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.017	1 092	19

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	155	241-201-0807 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	0.1	312	31
81	156	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	13.5	270	3 645
82	157	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	13.5	206	2 781
			Итого по подразделу: Насадка для свечи				**726 316**
			Итого по разделу: Резервуарная установка сжиженного углеводородного газа				**21 117 377**
			Раздел: Газопровод среднего давления сжиженного углеводородного газа				
83	159	242-209-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	16 831	16 831
84	160	241-116-0804 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	3 931	7 862
85	161	242-209-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	26 796	53 592
86	162	241-116-0807 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	4 526	18 104
87	163	242-209-0202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	52 260	52 260
88	164	241-116-0609 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	6 258	12 516
89	165	6114-0201-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 80 мм	соединение	2	16 653	33 306
90	166	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1 438	1 438
91	167	245-701-0201 РСНБ РК 2022	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	1	4 290	4 290
92	168	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	1 797
93	169	6123-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0.0052	3 773 003	19 620

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	170	6123-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0.037	3 773 003	139 601
95	171	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	шт.	0.202	483	98
96	172	241-108-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	шт.	5.05	3 640	18 382
97	173	241-108-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,5 мм	шт.	37.37	8 433	315 141
98	174	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0.002	1 495 058	2 990
99	175	241-201-0705 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,3 мм	м	2.02	821	1 658
100	176	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	4	764	3 056
101	177	241-112-0141 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	10	1 986	19 860
102	178	241-113-0218 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	3 492	6 984
103	179	241-113-0115 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	1	5 466	5 466
104	180	241-114-0127 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	2	1 581	3 162
105	181	241-114-0218 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-159х7,0 мм//325х8,0-108х4,0	шт.	2	17 736	35 472
106	182	241-117-0103 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	2	1 460	2 920
107	183	241-116-1107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	25 970	155 820
108	184	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	2 992	8 976

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
109	185	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм// 25 мм	шт.	1	2 100	2 100
110	186	241-117-0103 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	1	1 460	1 460
111	187	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	7.411536	408 199	3 025 382
112	188	241-703-0108 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0.002	54 243	108
113	189	241-703-0114 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0.006	99 450	597
114	190	241-703-0118 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-80-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0.004	149 178	597
115	191	6123-0205-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка сборников конденсата и гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов, диаметр 150 мм	шт.	1	63 235	63 235
116	192	СТПеречень ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конденсатосборник УДГ5.03.00-17	шт.	1	129 241	129 241
117	193	261-301-0122 РСНБ РК 2022	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30 // Трубка водоотводящая с футляром	м	1	250	250
118	194	1129-0174-0102 РСНБ РК 2022	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	2	5 083	10 166
119	195	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1.2	5 685	6 822
120	196	6121-0201-0826 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0.21	4 595 369	965 027
121	197	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021/ за 2 раза	м2	3.45	540	1 863
122	198	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/ за 2 раза	м2	3.45	412	1 421
			Подраздел: Молниезащита и заземление				
123	203	1133-0202-0203 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка	опора	2	126 694	253 388

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	204	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	207 960	415 920
125	205	1134-0206-0402 РСНБ РК 2022	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м	молниеотвод	2	5 702	11 404
126	206	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0144	374 529	5 393
127	207	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	58.5	955	55 868
128	208	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.07371	382 131	28 167
129	209	6124-0203-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1 039	20 780
130	210	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0.02	389 075	7 782
131	211	6124-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	7	6 204	43 428
132	212	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0791	374 529	29 625
			Итого по подразделу: Молниезащита и заземление				**871 755**
			Подраздел: Очистка полости и испытание трубопроводов				
133	213	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом// от 25 мм до 89 мм	км трубопровода	0.0992	1 092 351	108 360
134	214	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Испытание газопровода пневматическое	м	116	2 449	284 084
			Итого по подразделу: Очистка полости и испытание трубопроводов				**392 445**
			Подраздел: Контроль сварных стыков				
135	215	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	10	54 018	540 180
136	216	1125-0211-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	67 032	67 032

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
137	217	1125-0211-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	88 387	88 387
138	218	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	50.288	419	21 071
139	219	1125-0211-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	83	29 654	2 461 282
140	220	1125-0211-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	35 022	35 022
			Итого по подразделу: Контроль сварных стыков				**3 212 974**
			Итого по разделу: Газопровод среднего давления сжиженного углеводородного газа				**9 626 645**
			Итого по локальной смете: Наружные сети газоснабжения				**30 744 022**
			ИТОГО по акту:				**30 744 022**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)	14229816.000 x 9.40%	1 337 602
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	30744022.000 + 1337602.650	32 081 624
	Сметная прибыль, 5.00%	15567418.650 x 5.00%	778 370
	Непредвиденные расходы, 5.000%	32081624.650 x 5.000%	1 604 081
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		34 464 076
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557	34464076.815 x 1.0557	36 383 725
	НДС (12%)	36383725.893 x 12%	4 366 047
	Итого с НДС	36383725.893 + 4366047.107	40 749 773

Лист согласования
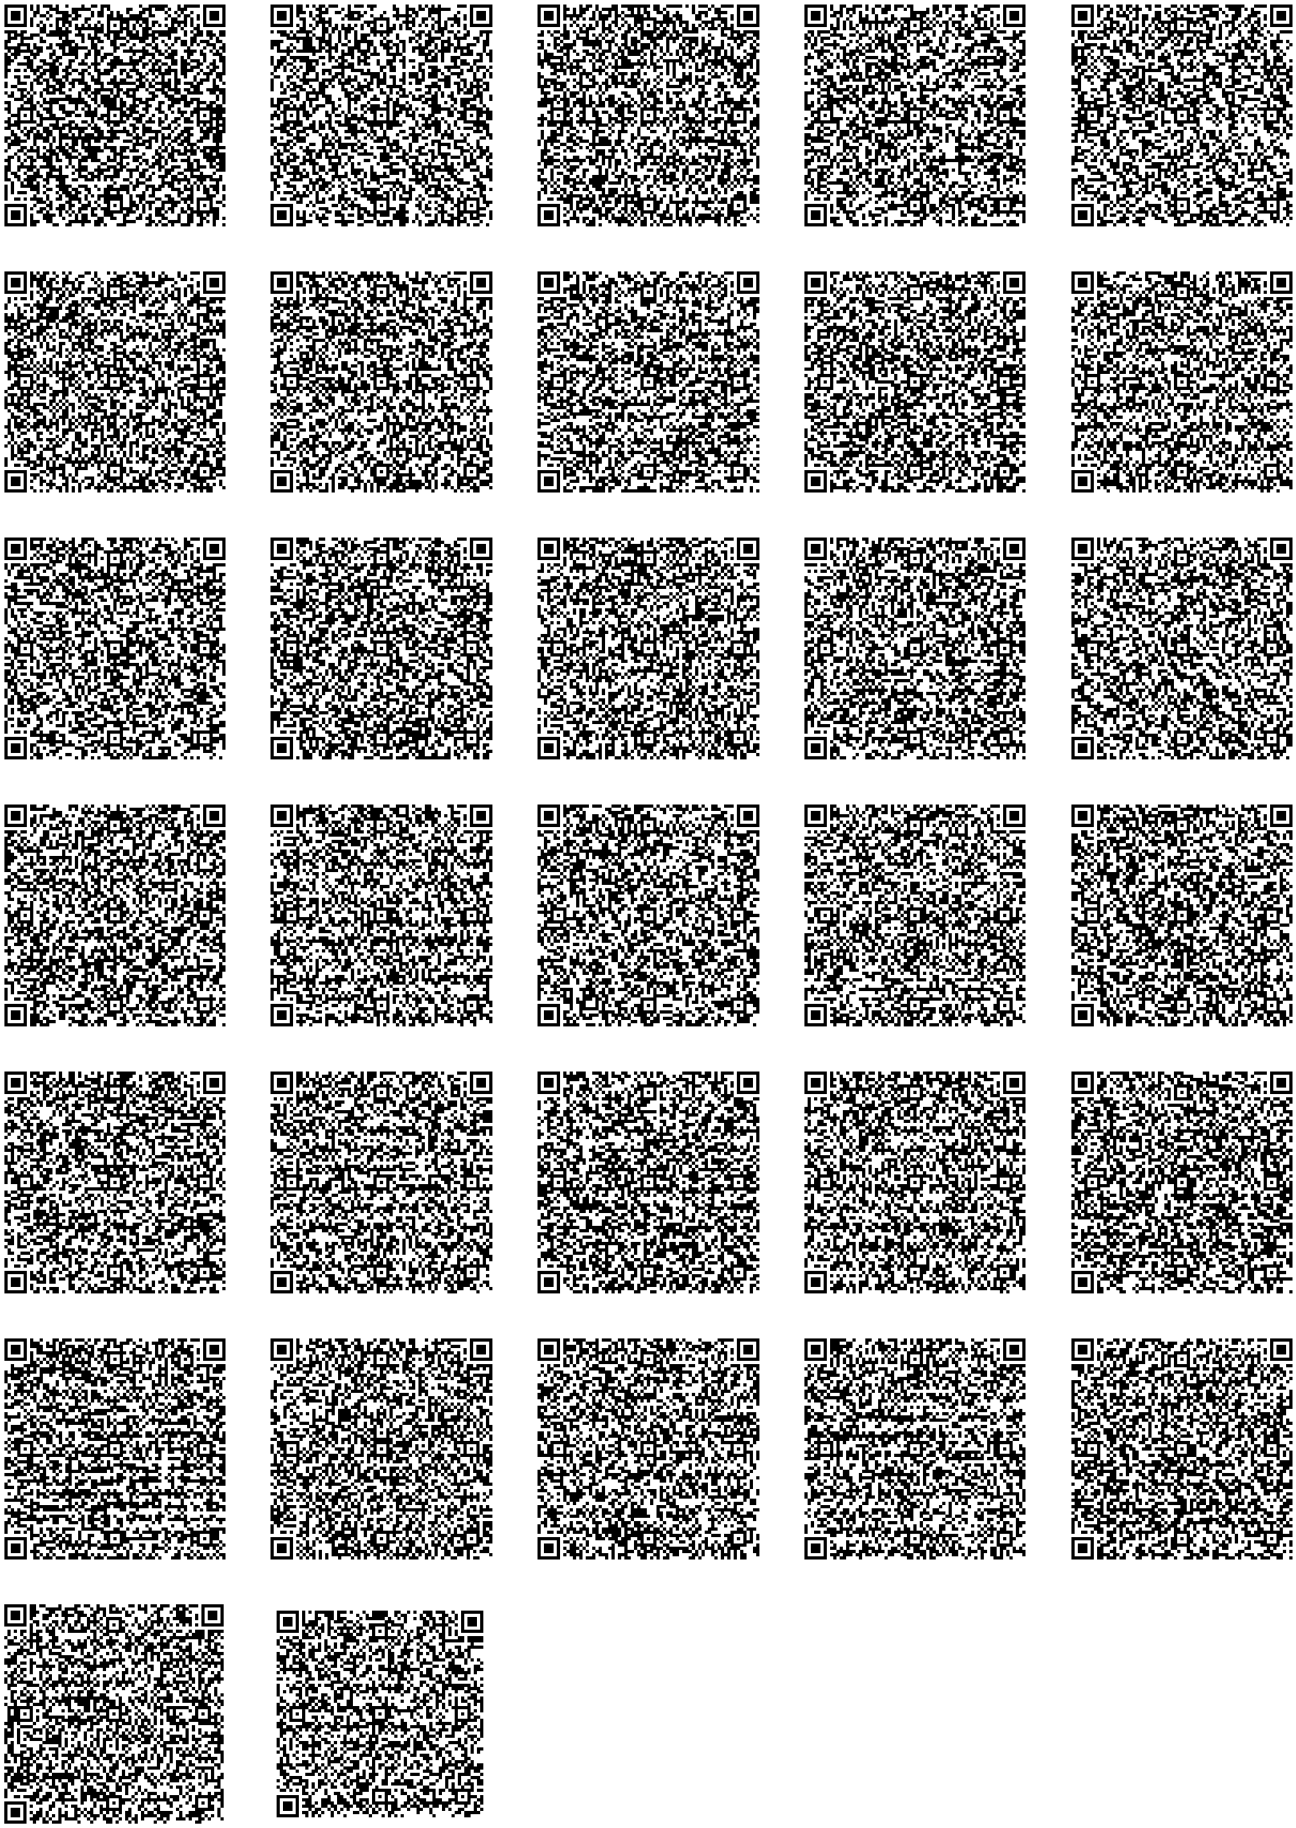
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	28.01.2025 13:17
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	29.01.2025 09:20
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	29.01.2025 16:27
Представители заказчика		
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) отдела смет и ценообразования	31.01.2025 13:49 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	31.01.2025 04:56
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	31.01.2025 06:05
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	30.01.2025 11:46 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	31.01.2025 18:02
