Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Покрытие				
			Раздел: Тартановое(резиновое) покрытие площадок, Тип 6. 4702,15 м2				
1	32	7101-0403-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	м2	4702.15	1 492	7 015 608
2	33	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2 основания	4702.15	1 845	8 675 467
3	34	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103(до 12 см)	м2 основания	4702.15	-267	-1 255 474
4	35	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2 основания	4702.15	1 859	8 741 297
5	36	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м2 основания	4702.15	-898	-4 222 531
6	37	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	4702.15	266	1 250 772
7	38	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	470.215	47 003	22 101 516
8	39	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	7.4764185	68 239	510 183
9	40	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	7.4764185	382 476	2 859 551

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	41	1147-0402-0101 РСНБ РК 2022	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство // 20 мм	м2	4702.15	15 615	73 424 072
			Итого по разделу: Тартановое(резиновое) покрытие площадок, Тип 6. 4702,15 м2				**119 100 461**
			Итого по локальной смете: Покрытие				**119 100 461**
			ИТОГО по акту:				**119 100 461**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)	119100461.000 x 9.40%	11 195 442
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	119100461.000 + 11195442.880	130 295 903
	Сметная прибыль, 5.00%	130295903.880 x 5.00%	6 514 795
	Непредвиденные расходы, 5.000%	130295903.880 x 5.000%	6 514 795
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		143 325 494
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557	143325494.268 x 1.0557	151 308 724
	НДС (12%)	151308724.298 x 12%	18 157 046
	Итого с НДС	151308724.298 + 18157046.916	169 465 771

Лист согласования
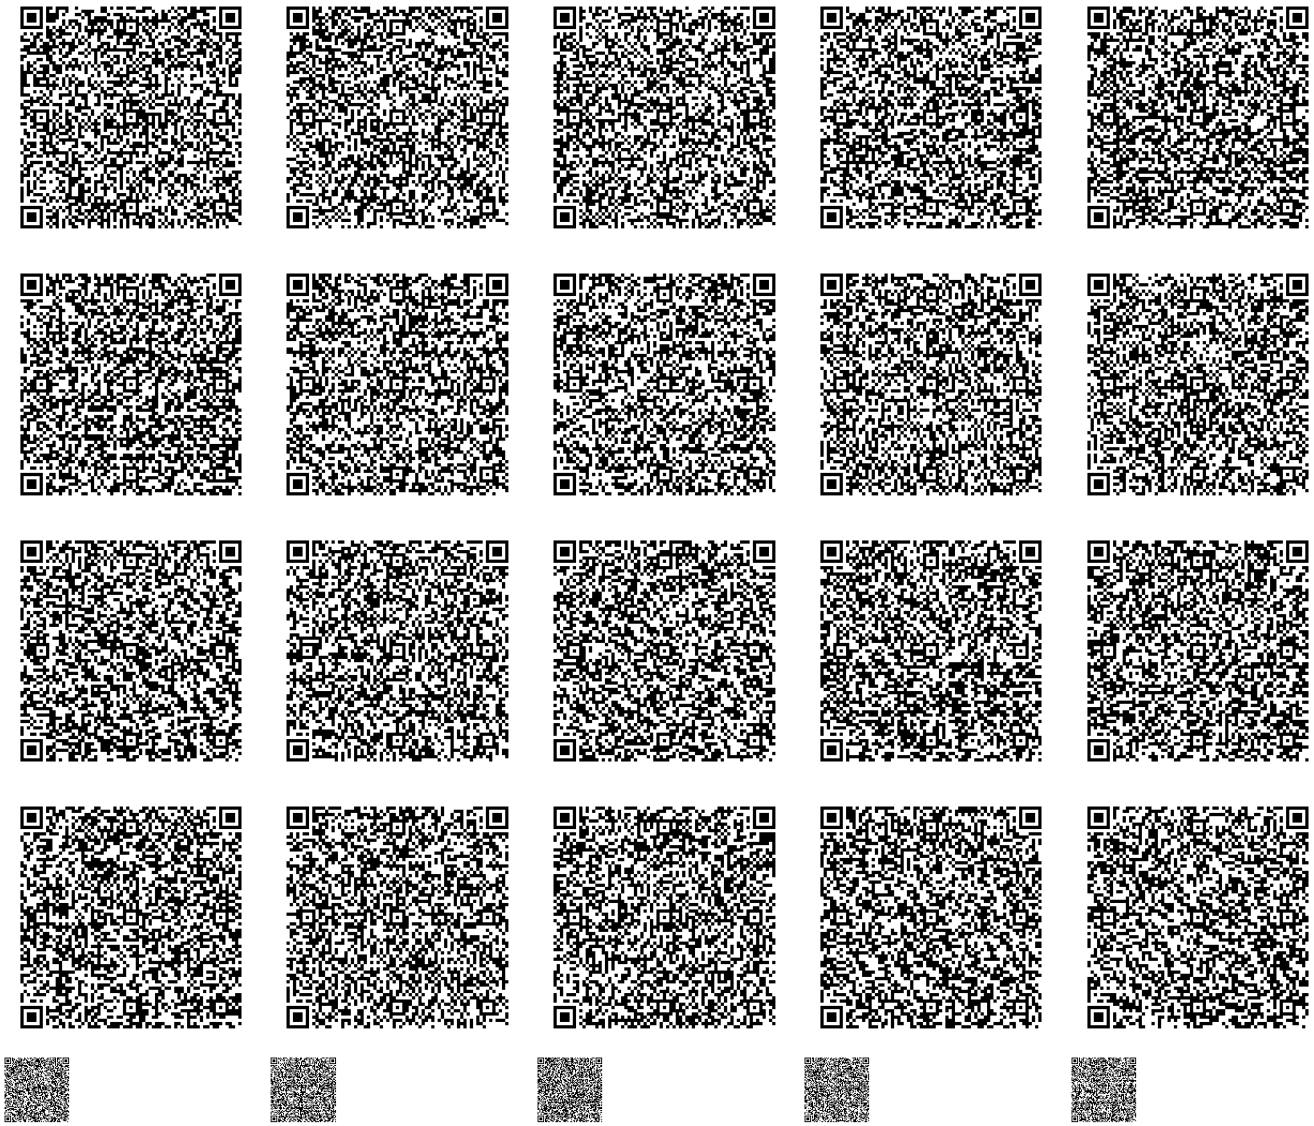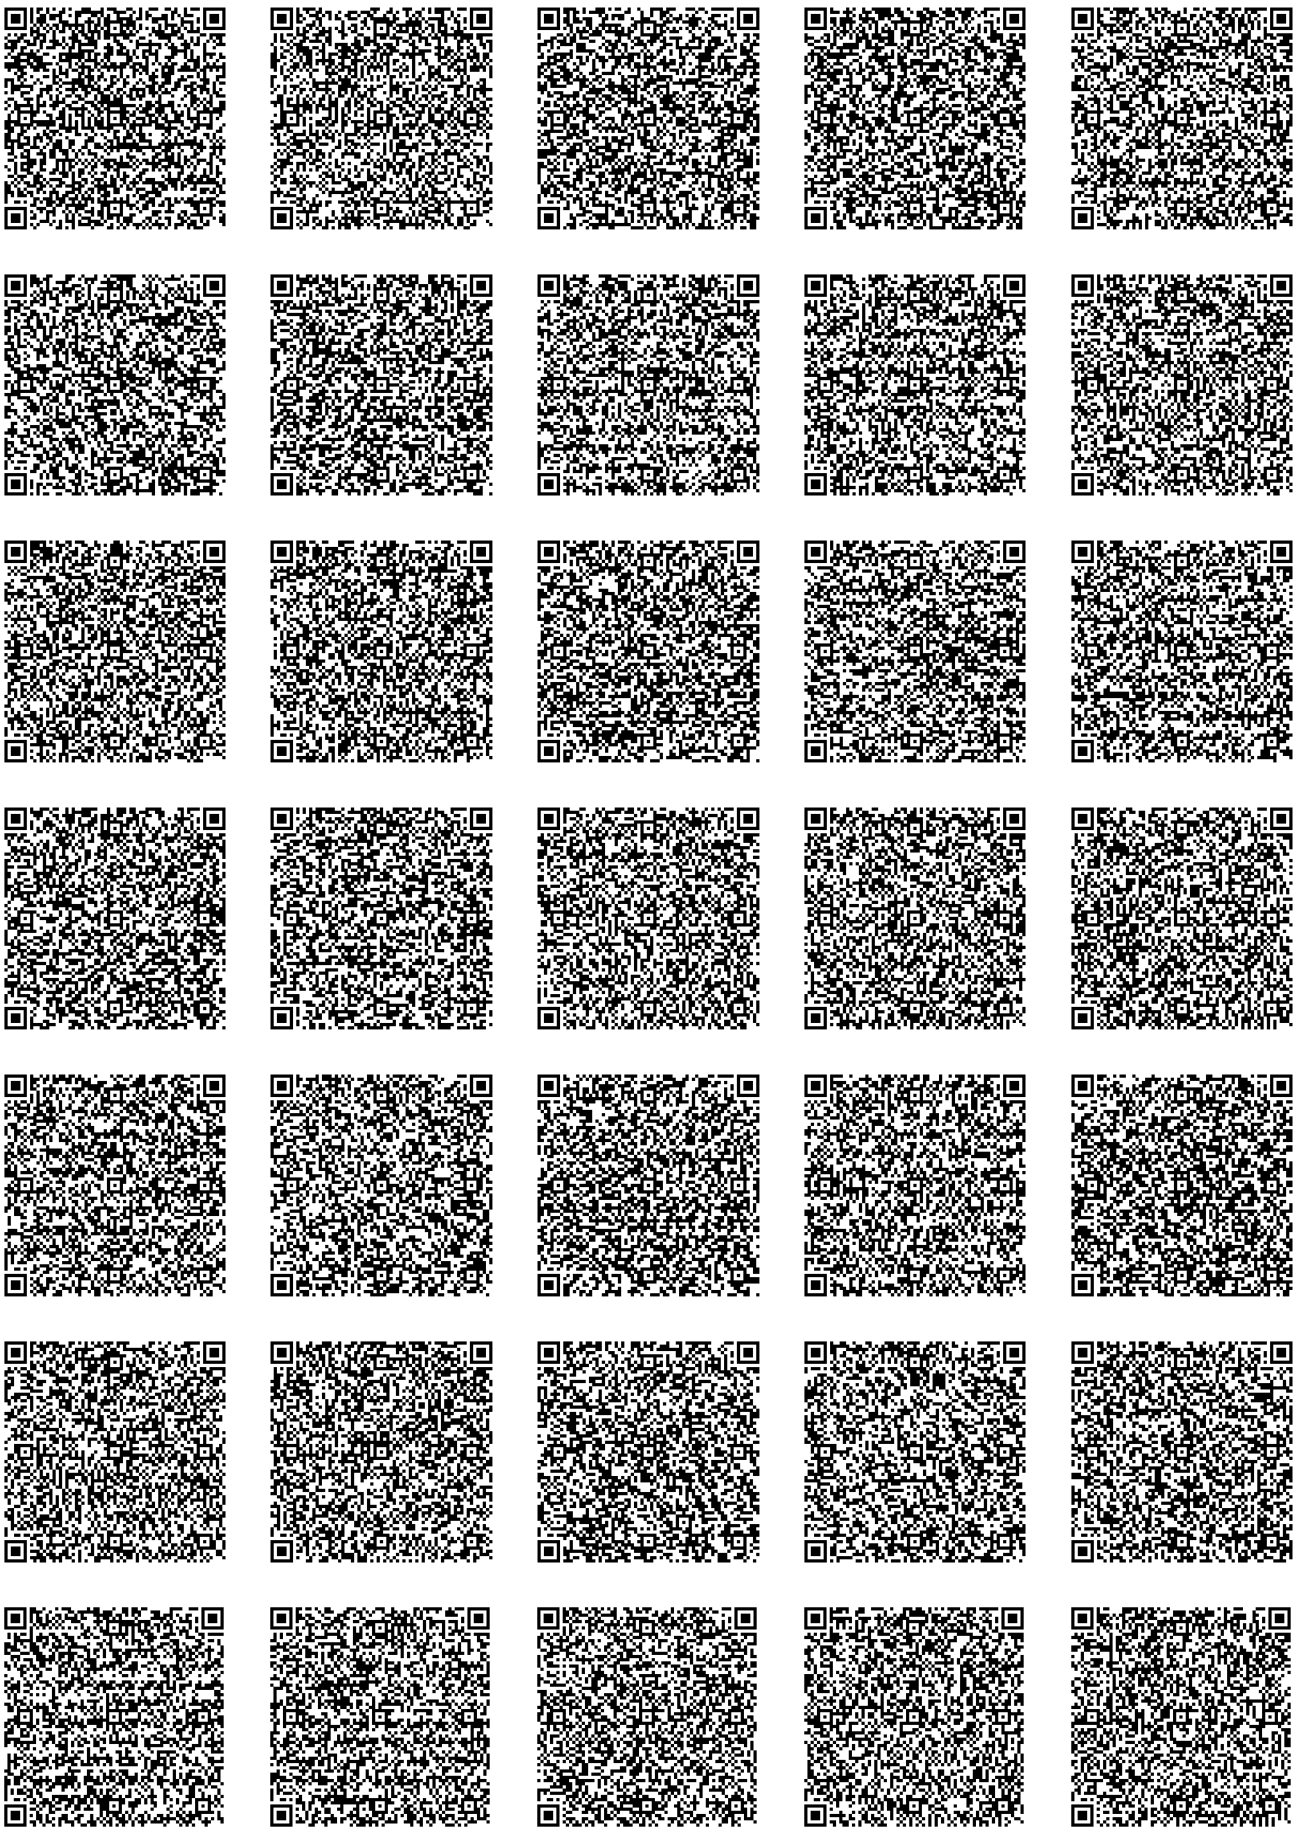
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	01.02.2025 04:51
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	01.02.2025 10:02
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	01.02.2025 08:38
Представители заказчика		
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	06.02.2025 12:24
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	07.02.2025 04:42
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) отдела смет и ценообразования	07.02.2025 06:08 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	07.02.2025 13:15
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	03.02.2025 11:37 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
