Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Насосная станция				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	6101-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м3,группа грунта 2	м3	92.2984785	393	36 273
2	2	6101-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами,группа грунта 2	м3	10.2553865	5 828	59 768
3	5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м3	10.2553865	4 156	42 621
4	6	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	92.2984785	67	6 184
5	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м3	92.2984785	656	60 548
			Итого по разделу: Земляные работы				**205 394**
			Раздел: Фундамент				
			Подраздел: Днище и стены				
6	8	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	1.8	15 072	27 130
7	9	1106-1301-0104РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м3	18.7	53 221	995 233
8	10	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4	м3	18.9805	26 585	504 597
9	11	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.13055	326 417	369 031

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	12	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1278	344 590	44 039
11	13	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м2	39.9	4 022	160 478
12	14	6111-0401-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой.На каждый следующий слой добавлять к норме 6111-0401-0111	м2	39.9	2 230	88 977
			Итого по подразделу: Днище и стены				**2 189 485**
			Итого по разделу: Фундамент				**2 189 485**
			Итого по локальной смете: Насосная станция				**2 394 879**
			ИТОГО по акту:				**2 394 879**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)				2394879.000 x 9.40%	225 118
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				2394879.000 + 225118.617	2 619 997
		Сметная прибыль, 5.00%				2619997.617 x 5.00%	130 999
		Непредвиденные расходы, 5.000%				2619997.617 x 5.000%	130 999
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					2 881 997
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557				2881997.379 x 1.0557	3 042 524
		НДС (12%)				3042524.633 x 12%	365 102
		Итого с НДС				3042524.633 + 365102.956	3 407 627

Лист согласования
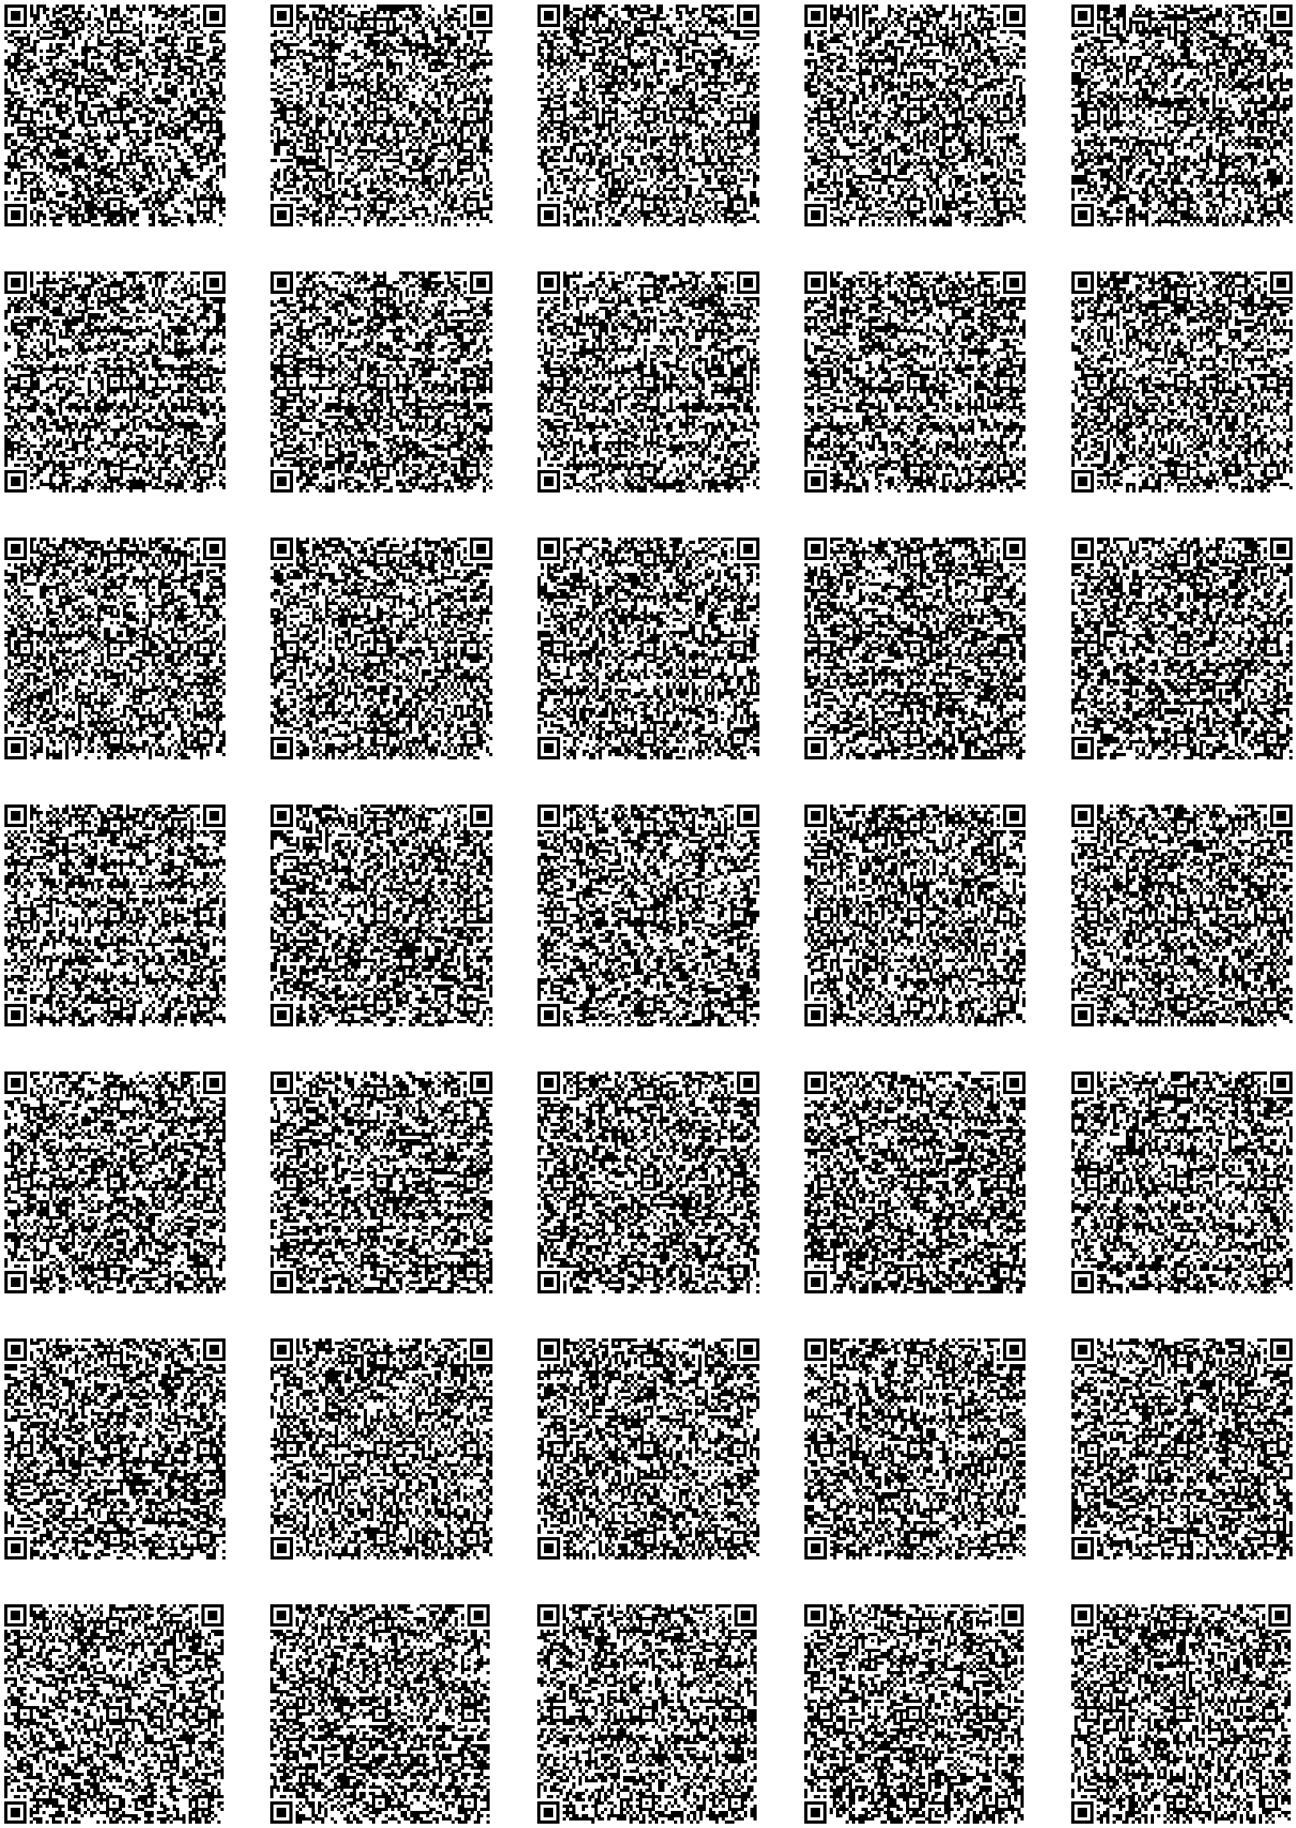
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	19.02.2025 16:42
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	20.02.2025 06:32
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	19.02.2025 16:47
Представители заказчика		
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) отдела смет и ценообразования	24.02.2025 11:00 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	22.02.2025 07:40
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	24.02.2025 05:18
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	28.02.2025 13:47
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	20.02.2025 12:23 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
