Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Тепловые сети				
1	2	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	75.55	376	28 407
2	3	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	7.55	9 558	72 163
3	6	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	67.95	98	6 659
4	7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	7.55	4 156	31 378
5	8	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	67.95	656	44 575
6	9	6123-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм	км	0.268	4 615 801	1 237 035
7	10	241-402-0116 СпрСЦ 04.2024	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	268	13 090	3 508 120
8	12	6123-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	10	93 330	933 300
9	13	241-405-0109 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	10	66 044	660 440

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	14	241-704-0214 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х273 мм	комплект	4	40 352	161 408
11	17	241-408-0107 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	42	11 482	482 244
12	18	6123-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	2	93 330	186 660
13	19	241-406-0509 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм// 57 х 159мм	шт.	2	177 481	354 962
14	20	6123-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	2	60 155	120 310
15	21	242-208-0203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 50-57-2-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	52 346	104 692
16	23	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	36.2046	11 031	399 373
17	24	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	50.54	37 391	1 889 740
18	25	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	30.12	104 893	3 159 377
19	26	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	20.42	106 245	2 169 523
20	32	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	0.809	82 001	66 339
21	33	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	22 435	22 435
22	34	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17 760	35 520
23	35	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13 070	13 070
24	36	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	13 772	13 772

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	37	СТССЦРСНБ РК 2022	Надбавка к стоимости железобетонных изделий из тяжелого бетона класса В15 по водонепроницаемости W6	м3	0.809	788	638
26	46	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	63 066	63 066
27	49	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.01481	1 132 558	16 773
28	50	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0.25	270	68
29	51	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0.25	412	103
30	54	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом// 100 мм	м2	1.524	9 076	13 831
31	55	6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	0.2286	20 605	4 710
32	56	6104-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков цокольных, масса до 1 т	шт.	2	9 512	19 024
33	57	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	0.53	57 613	30 535
34	58	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0.15	49 218	7 383
35	59	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	13 772	41 316
36	60	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 087	21 261
37	61	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352	40 352
38	64	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	м2	5.35	657	3 514
39	65	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0.535	45 854	24 532
			Итого по локальной смете: Тепловые сети				**15 988 611**
			ИТОГО по акту:				**15 988 611**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)			15988611.000 x 9.40%	1 502 929
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			15988611.000 + 1502929.373	17 491 540
			Сметная прибыль, 5.00%			17491540.373 x 5.00%	874 577
			Непредвиденные расходы, 5.000%			17491540.373 x 5.000%	874 577
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				19 240 694
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557			19240694.410 x 1.0557	20 312 401
			НДС (12%)			20312401.089 x 12%	2 437 488
			Итого с НДС			20312401.089 + 2437488.131	22 749 889

Лист согласования
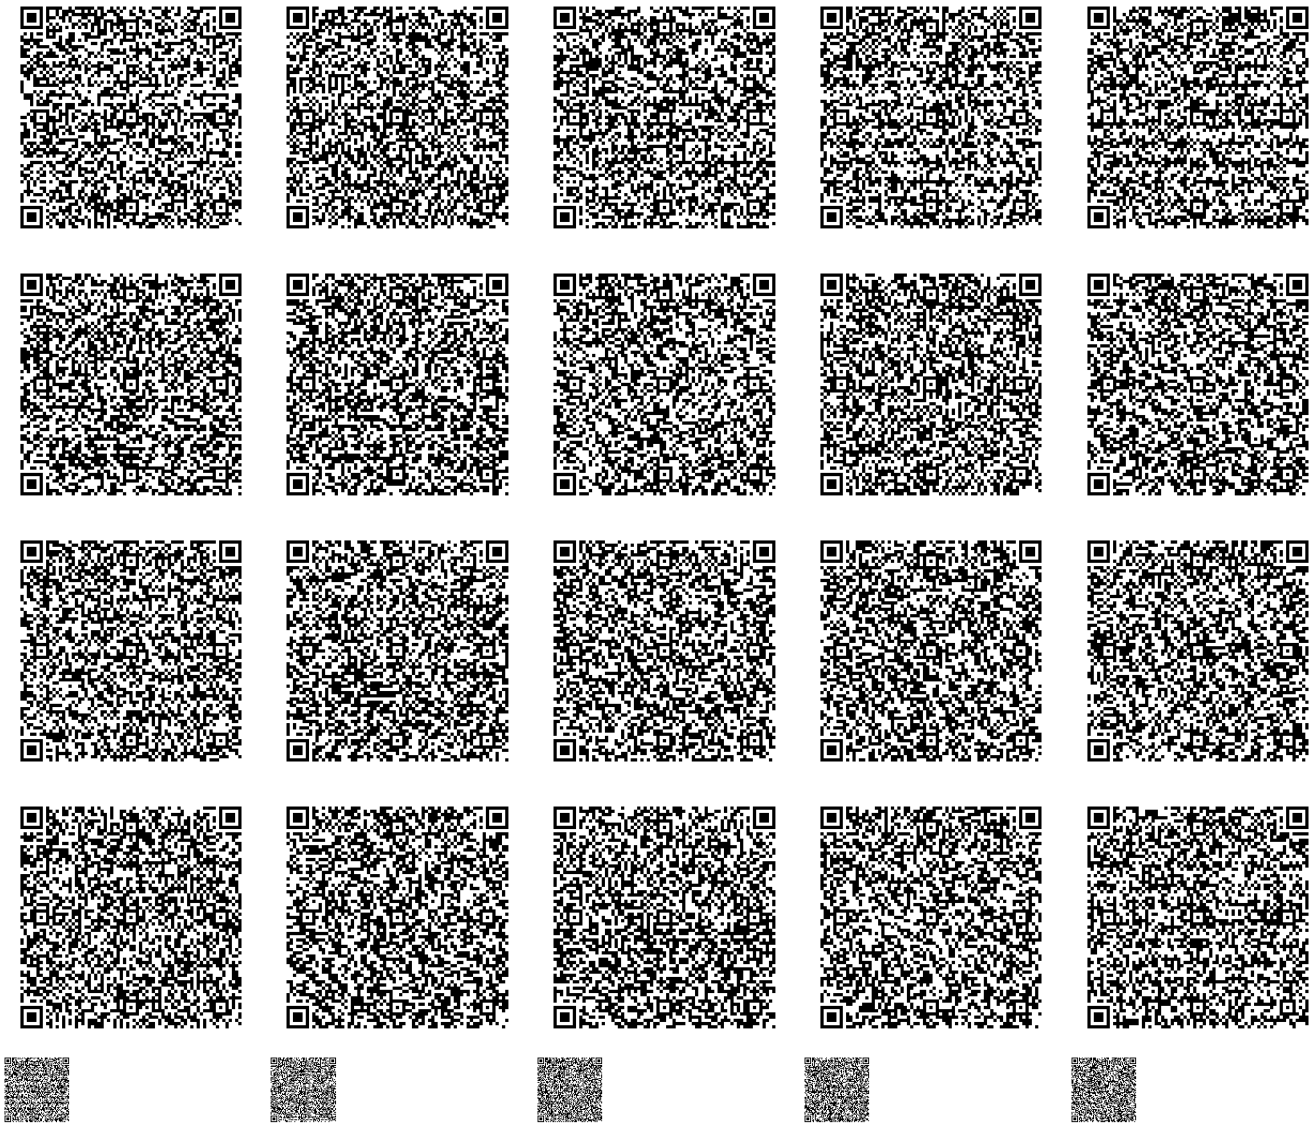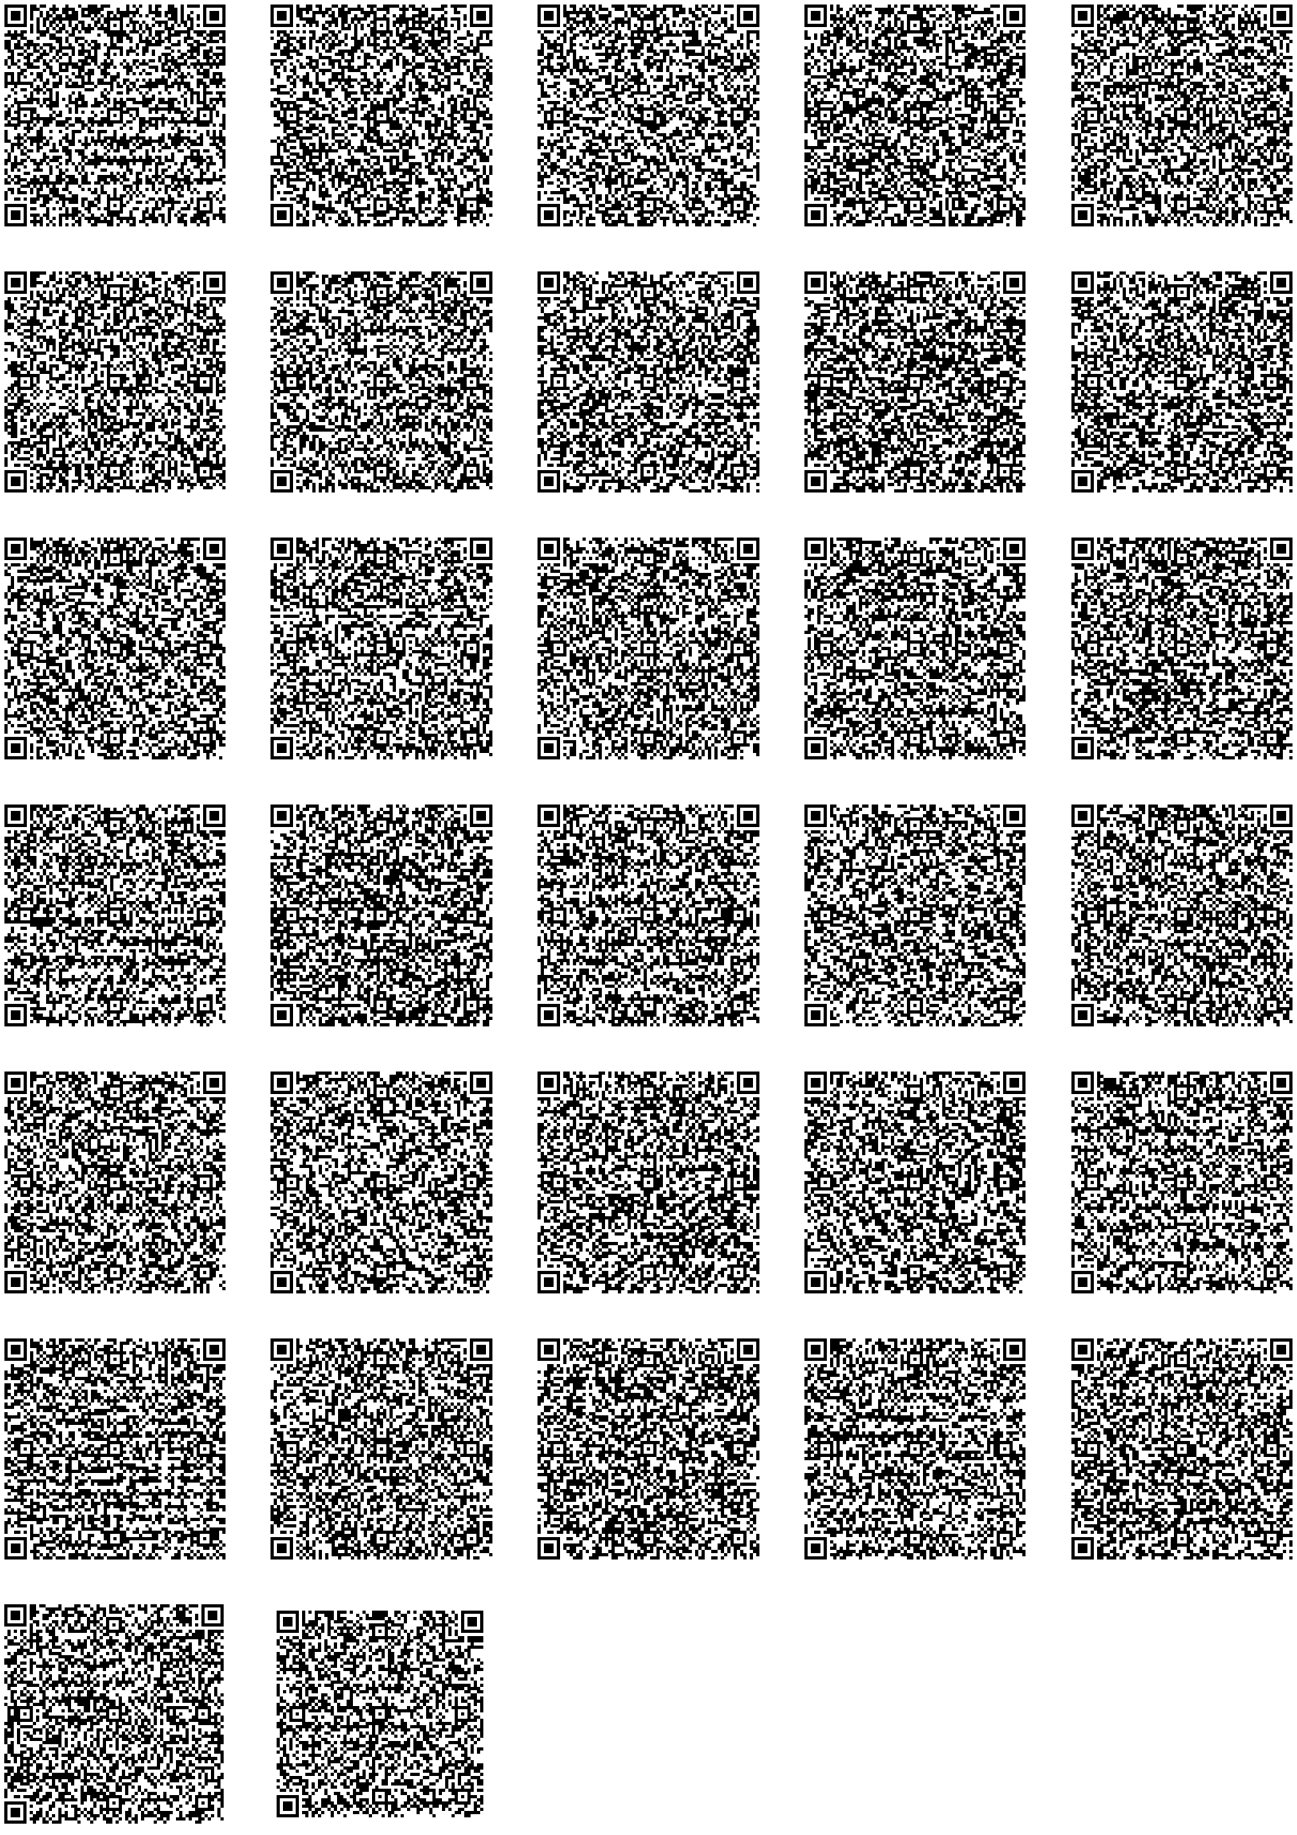
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	20.02.2025 05:44
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	20.02.2025 07:09
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	20.02.2025 07:37
Представители заказчика		
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	20.02.2025 12:25 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	22.02.2025 07:59
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	24.02.2025 05:19
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) отдела смет и ценообразования	24.02.2025 11:01 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	25.02.2025 12:30
