Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Резервуар на 300 м3				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	6101-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м3,группа грунта 2	м3	155.293632	393	61 030
2	2	6101-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами,группа грунта 2	м3	17.254848	5 828	100 561
3	3	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м3,группа грунта 2	м3	615.422912	525	323 097
4	5	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	м3	38.3213312	3 784	145 008
5	6	6101-0106-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1	м3 грунта	344.8919808	56	19 314
6	7	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	383.213312	3 818	1 463 108
7	8	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м3	17.254848	4 156	71 711
8	9	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	155.293632	67	10 405
9	10	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м3	155.293632	656	101 873
			Итого по разделу: Земляные работы				**2 296 107**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаментная плита под резервуар				
			Подраздел: РДнище				
10	11	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	30.06	15 072	453 064
11	12	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	23.72	10 494	248 918
12	13	212-101-1811РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	24.1944	22 594	546 648
13	14	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	69.31	14 521	1 006 451
14	15	212-101-2304РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W10	м3	70.34965	27 807	1 956 213
15	16	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	2.8428	338 700	962 855
16	17	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.14097	344 590	48 577
17	18	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0.63752	1 511 712	963 747
			Итого по подразделу: РДнище				**6 186 474**
			Итого по разделу: Фундаментная плита под резервуар				**6 186 474**
			Итого по локальной смете: Резервуар на 300 м3				**8 482 581**
			ИТОГО по акту:				**8 482 581**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)	8482581.000 x 9.40%	797 362
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	8482581.000 + 797362.582	9 279 943
	Сметная прибыль, 5.00%	9279943.582 x 5.00%	463 997
	Непредвиденные расходы, 5.000%	9279943.582 x 5.000%	463 997
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		10 207 937
	НДС (12%)	10207937.940 x 12%	1 224 952
	Итого с НДС	10207937.940 + 1224952.553	11 432 890

Лист согласования
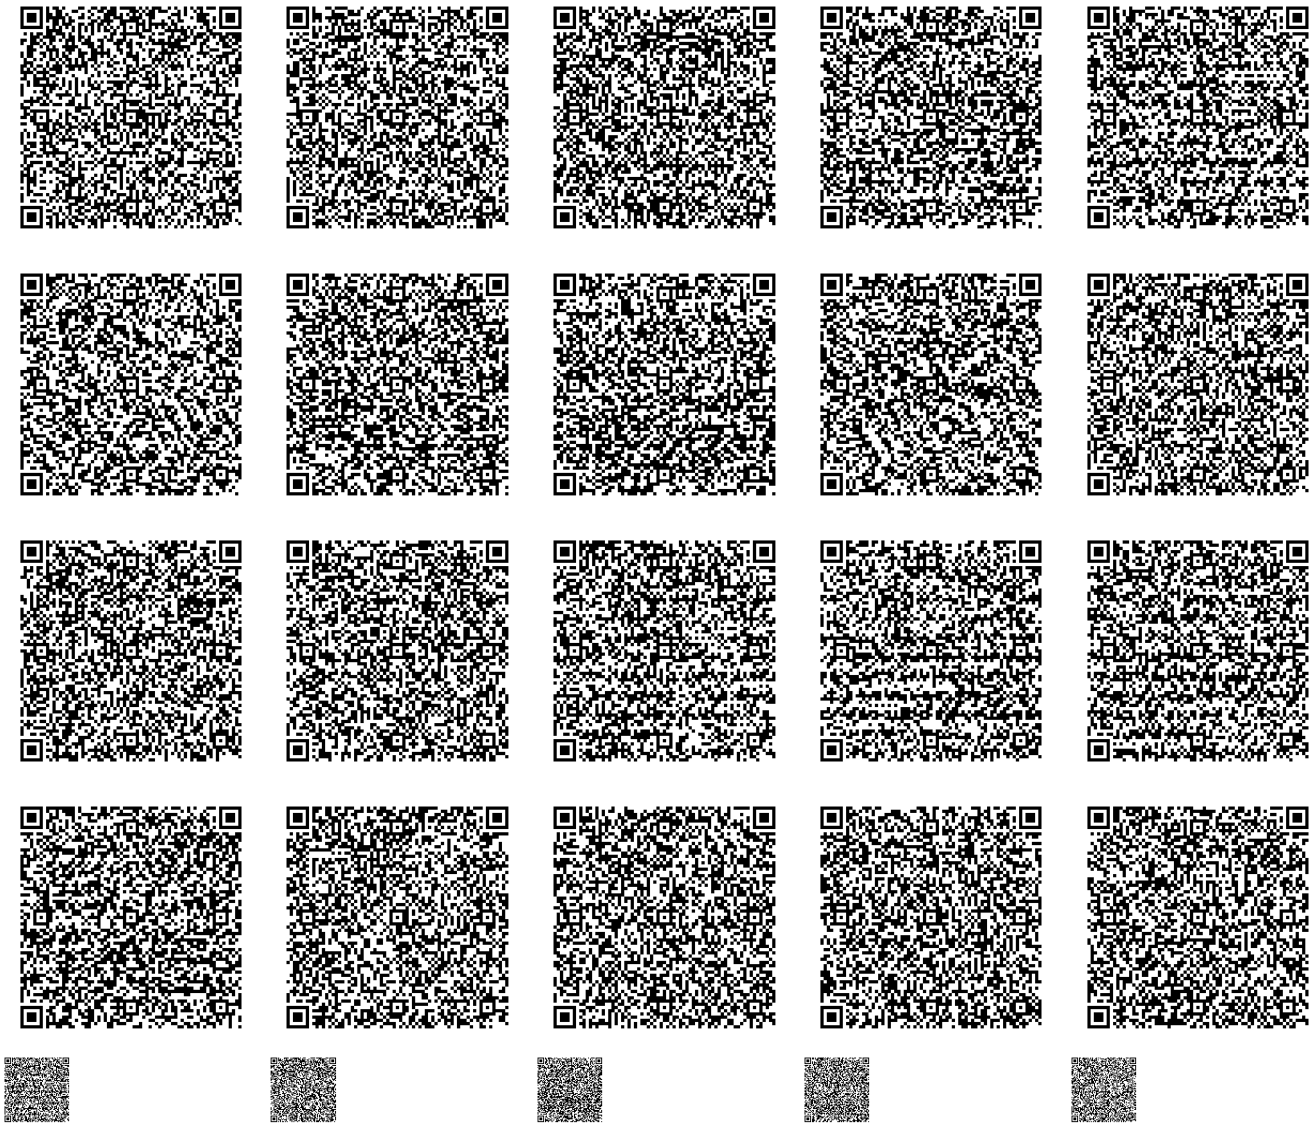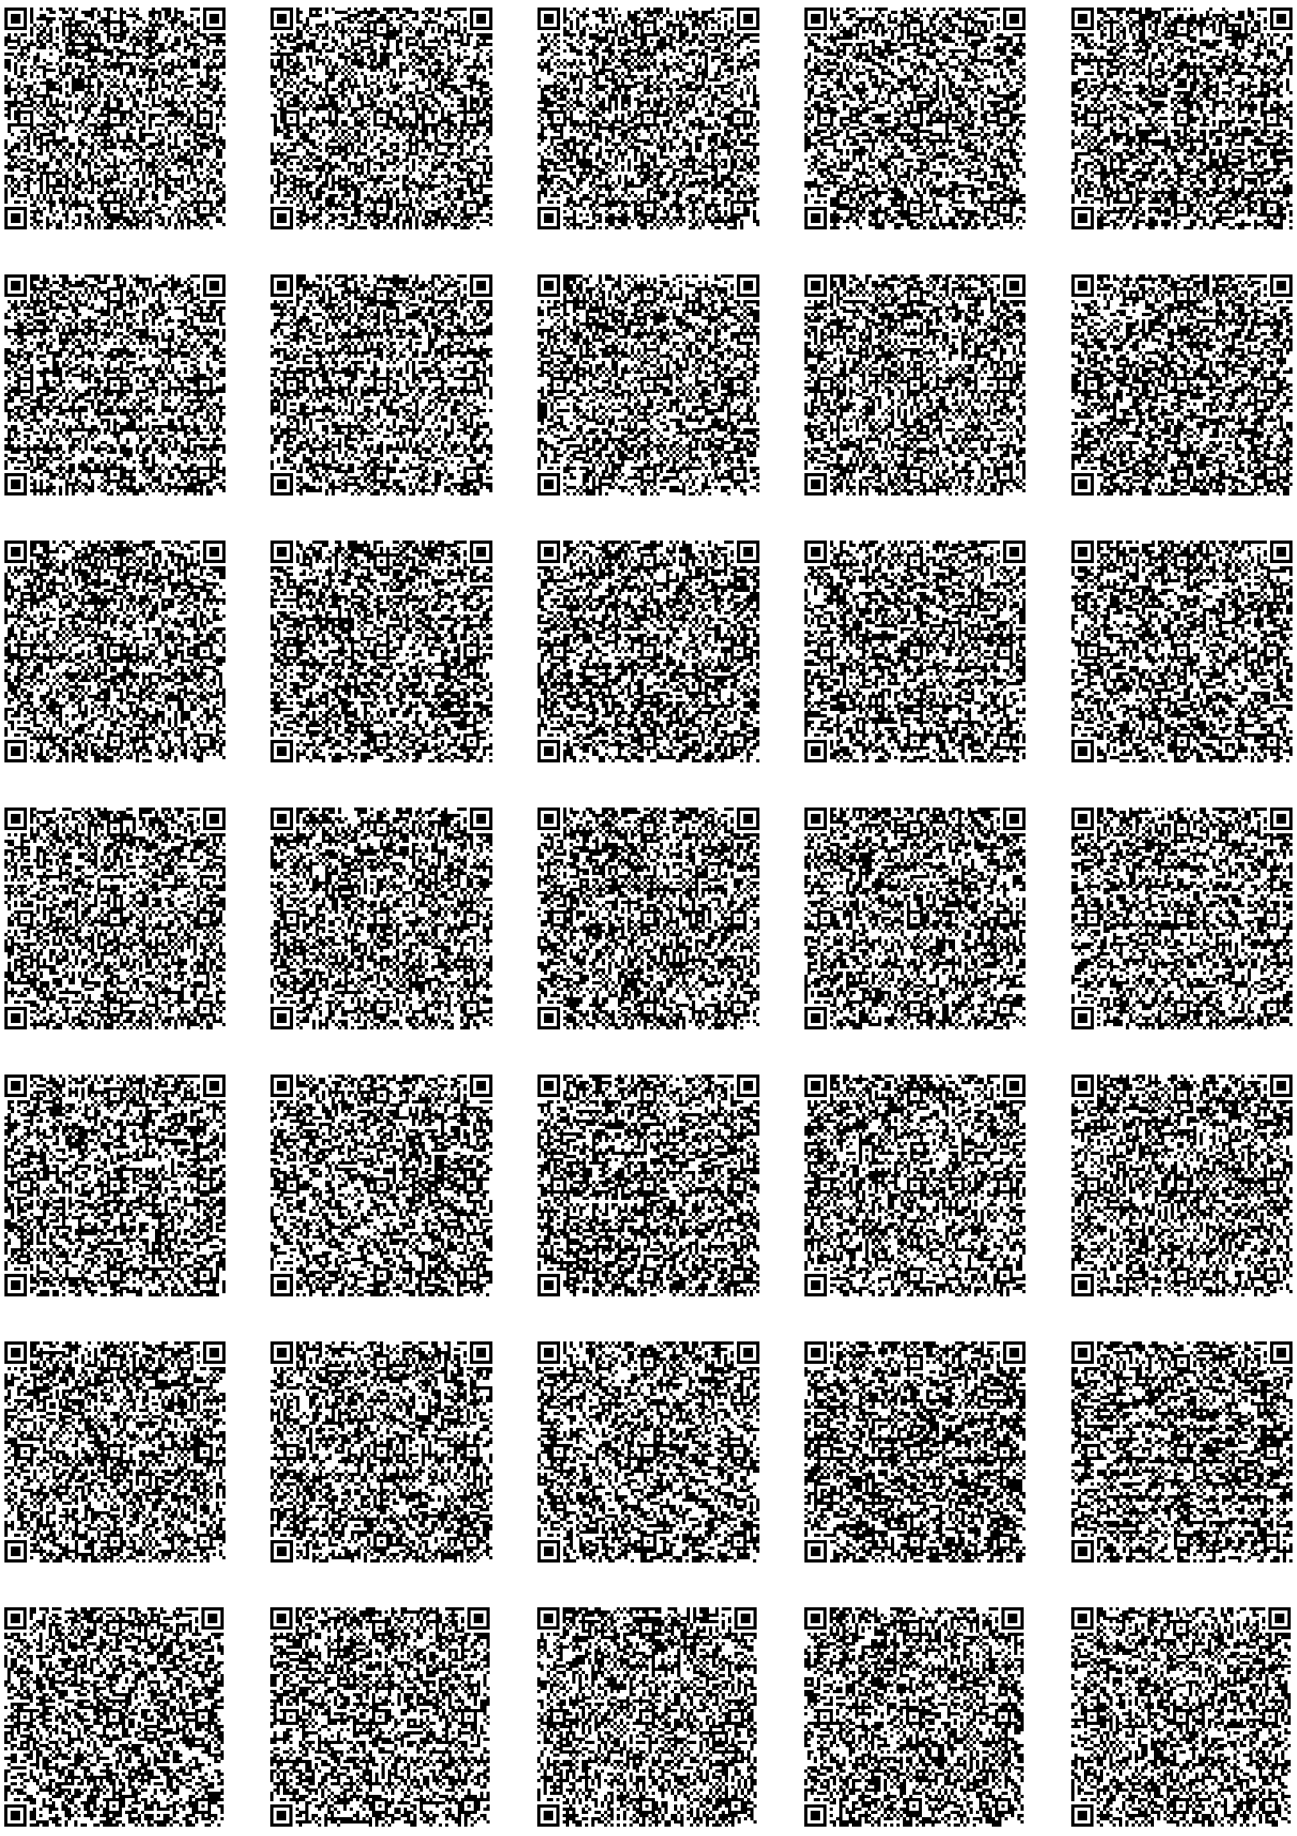
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	23.02.2025 13:24
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	24.02.2025 10:00
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	23.02.2025 13:55
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	28.02.2025 13:49
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	27.02.2025 05:59
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) отдела смет и ценообразования	28.02.2025 06:03 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	25.02.2025 06:52 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	27.02.2025 05:22
