Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Земляные работы,фундаменты				
			Отдел: Блок №1				
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Крыльцо Кр-3 /КЖ-31				
1	73	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	0.96	15 072	14 469
2	74	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	2.67	64 954	173 427
3	75	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	2.71005	24 394	66 109
4	76	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01136	344 590	3 915
5	77	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03356	382 476	12 836
6	78	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.18467	338 700	62 547
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-3 /КЖ-31				**333 304**
			Подраздел: Крыльцо Кр-3/1				
7	79	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	0.96	15 072	14 469
8	80	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	2.67	64 954	173 427
9	81	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	2.71005	24 394	66 109
10	82	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01136	344 590	3 915
11	83	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03356	382 476	12 836

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	84	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.18467	338 700	62 547
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-3/1				**333 304**
			Итого по разделу: Разные работы				**666 608**
			Итого по отделу: Блок №1				**666 608**
			Отдел: Блок №2				
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Крыльцо Кр-10/2				
13	169	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	0.96	15 072	14 469
14	170	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	2.67	64 954	173 427
15	171	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	2.71005	24 394	66 109
16	172	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01136	344 590	3 915
17	173	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03356	382 476	12 836
18	174	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.19106	338 700	64 712
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-10/2				**335 468**
			Итого по разделу: Разные работы				**335 468**
			Итого по отделу: Блок №2				**335 468**
			Отдел: Блок №3				
			Раздел: Фундаменты				
			Подраздел: Крыльцо Кр-5 /КЖ-23/				
19	247	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	1.11	15 072	16 730
20	248	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	3.17	64 954	205 904
21	249	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	3.21755	24 394	78 489
22	250	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01111	344 590	3 828
23	251	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03659	382 476	13 995
24	252	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.20119	338 700	68 143
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-5 /КЖ-23/				**387 089**
			Итого по разделу: Фундаменты				**387 089**
			Итого по отделу: Блок №3				**387 089**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Отдел: Блок №4				
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: РВоздухозаборная шахта "1"				
25	341	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	0.296	15 072	4 461
26	342	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0.59	31 777	18 748
27	343	1106-1301-0104РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м3	3.27	53 221	174 033
28	344	212-101-2001РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.31905	22 708	75 369
29	345	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00372	344 590	1 282
30	346	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.54728	326 417	178 641
31	347	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	14.1	4 271	60 221
32	349	235-102-0101РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1.21	435	526
			Итого по подразделу: РВоздухозаборная шахта "1"				**513 281**
			Подраздел: РКрыльцо №1 /КЖ-46				
33	359	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	4.93	15 072	74 305
34	360	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	4.93	32 774	161 576
35	361	6103-0101-0209ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	м3	23.52	31 048	730 249
36	362	212-101-2304РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W10	м3	23.8728	27 807	663 831
37	365	6104-0202-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	47	5 338	250 886
38	366	6104-0202-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	13	5 853	76 089
39	367	6104-0202-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	32	7 869	251 808
40	368	221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	29.986	57 613	1 727 583
41	369	СТРСНБ РК 2022	Надбавка на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	29.986	284	8 516
42	370	СТССЦРСНБ РК 2022	Надбавка к стоимости бетонных блоков из тяжелого бетона класса В7,5 на водонепроницаемость W4	м3	29.986	405	12 157
43	375	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	14.48	64 954	940 534

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	376	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	14.6972	24 394	358 523
45	377	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.22235	382 476	85 044
46	378	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.72161	338 700	244 409
			Итого по подразделу: РКрыльцо №1 /КЖ-46				**5 585 510**
			Подраздел: Крыльцо Кр-6/1				
47	379	6109-0102-0104ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,щебеночных	м3	0.61	26 445	16 131
48	380	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	1.12	64 954	72 748
49	381	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	1.1368	24 394	27 731
50	382	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02051	382 476	7 845
51	383	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.05124	338 700	17 355
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-6/1				**141 810**
			Итого по разделу: Разные работы				**6 240 601**
			Итого по отделу: Блок №4				**6 240 601**
			Отдел: Блок №5				
			Раздел: Крыльцо КР-11				
52	436	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	1.48	15 072	22 307
53	437	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	7.9	64 954	513 137
54	438	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	8.0185	24 394	195 603
55	439	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01663	344 590	5 731
56	440	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.04518	382 476	17 280
57	441	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.53644	338 700	181 692
58	443	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	28	4 271	119 588
			Итого по разделу: Крыльцо КР-11				**1 055 338**
			Раздел: Крыльцо КР-12				
59	446	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	1.48	15 072	22 307
60	447	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	7.9	64 954	513 137

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	448	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	8.0185	24 394	195 603
62	449	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01663	344 590	5 731
63	450	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.04518	382 476	17 280
64	451	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.53644	338 700	181 692
65	453	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	28	4 271	119 588
			Итого по разделу: Крыльцо КР-12				**1 055 338**
			Итого по отделу: Блок №5				**2 110 676**
			Отдел: Блок №6				
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: РКрыльцо №2 /КЖ-31				
66	537	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	5.27	15 072	79 429
67	538	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	5.27	33 540	176 756
68	539	6103-0101-0209ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	м3	27.92	31 048	866 860
69	540	212-101-2304РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W10	м3	28.3388	27 807	788 017
70	543	6104-0202-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	58	5 338	309 604
71	544	6104-0202-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	26	5 853	152 178
72	545	6104-0202-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	37	7 869	291 153
73	546	221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	38.291	57 613	2 206 059
74	547	СТРСНБ РК 2022	Надбавка на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	38.291	284	10 875
75	548	СТССЦРСНБ РК 2022	Надбавка к стоимости бетонных блоков из тяжелого бетона класса В7,5 на водонепронмцаемость W4	м3	38.291	405	15 524
76	557	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	99.96	4 271	426 929
			Итого по подразделу: РКрыльцо №2 /КЖ-31				**5 323 384**
			Подраздел: Р Крыльцо Кр-4				
77	558	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	0.75	15 072	11 304
78	559	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	2	64 954	129 908

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	560	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	2.03	24 394	49 520
80	561	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.001	344 590	345
81	562	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02338	382 476	8 942
82	563	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.14393	338 700	48 749
83	564	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	1.76	4 271	7 517
			Итого по подразделу: Р Крыльцо Кр-4				**256 285**
			Подраздел: Р Крыльцо Кр-6				
84	565	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	0.46	15 072	6 933
85	566	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	1.41	64 954	91 585
86	567	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	1.43115	24 394	34 911
87	568	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00141	344 590	486
88	569	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.01435	382 476	5 489
89	570	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.12173	338 700	41 230
90	571	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	2.46	4 271	10 507
			Итого по подразделу: Р Крыльцо Кр-6				**191 141**
			Подраздел: РВоздухозаборная шахта "2"				
91	572	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	0.296	15 072	4 461
92	573	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0.59	31 777	18 748
93	574	1106-1301-0104РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м3	3.27	53 221	174 033
94	575	212-101-2001РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.31905	22 708	75 369
95	576	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00372	344 590	1 282
96	577	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.54728	326 417	178 641
97	578	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	13.08	4 271	55 864
98	580	235-102-0101РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1.507	435	656

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: РВоздухозаборная шахта "2"				**509 055**
			Итого по разделу: Разные работы				**6 279 865**
			Итого по отделу: Блок №6				**6 279 865**
			Отдел: Блок №7				
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Крыльцо Кр-10				
99	673	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	0.49	15 072	7 385
100	674	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	1.21	64 954	78 594
101	675	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	1.22815	24 394	29 959
102	676	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.001	344 590	345
103	677	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.01509	382 476	5 772
104	678	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.10275	338 700	34 801
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-10				**156 856**
			Итого по разделу: Разные работы				**156 856**
			Итого по отделу: Блок №7				**156 856**
			Отдел: Блок №8				
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Крыльцо Кр-8 /КЖ-21				
105	748	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	2	15 072	30 144
106	749	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	5.6	64 954	363 742
107	750	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	5.684	24 394	138 655
108	751	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00514	344 590	1 771
109	752	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02464	382 476	9 424
110	753	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.23414	338 700	79 303
111	754	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	6	4 271	25 626
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-8 /КЖ-21				**648 665**
			Подраздел: Крыльцо Кр-13				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	757	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	1	15 072	15 072
113	758	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	2.7	64 954	175 376
114	759	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	2.7405	24 394	66 852
115	760	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00514	344 590	1 771
116	761	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02464	382 476	9 424
117	762	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.14537	338 700	49 237
118	763	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	6	4 271	25 626
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-13				**343 358**
			Итого по разделу: Разные работы				**992 023**
			Итого по отделу: Блок №8				**992 023**
			Отдел: Блок №9				
			Раздел: Фундаменты				
			Подраздел: РВоздухозаборная шахта "3" /КЖ-21				
119	825	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	0.2	15 072	3 014
120	826	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0.34	31 777	10 804
121	827	1106-1301-0104РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м3	2.2	53 221	117 086
122	828	212-101-2001РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.233	22 708	50 707
123	829	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00466	344 590	1 606
124	830	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.25361	326 417	82 783
125	832	235-102-0101РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1.21	435	526
126	833	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	9.7	4 271	41 428
			Итого по подразделу: РВоздухозаборная шахта "3" /КЖ-21				**307 955**
			Подраздел: Крыльцо Кр-7 /КЖ-22				
127	843	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	2.6	15 072	39 187
128	844	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	11.2	64 954	727 485

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
129	845	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	11.368	24 394	277 311
130	846	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03751	344 590	12 926
131	847	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.06714	382 476	25 679
132	848	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.7659	338 700	259 410
133	850	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	22	4 271	93 962
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-7 /КЖ-22				**1 435 960**
			Подраздел: Крыльцо Кр-9				
134	853	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	1.34	15 072	20 196
135	854	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	3.6	64 954	233 834
136	855	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	3.654	24 394	89 136
137	856	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0069	344 590	2 378
138	857	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03234	382 476	12 369
139	858	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.21792	338 700	73 810
140	860	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	6	4 271	25 626
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-9				**457 349**
			Итого по разделу: Фундаменты				**2 201 264**
			Итого по отделу: Блок №9				**2 201 264**
			Отдел: Блок №10				
			Раздел: Фундаменты				
			Подраздел: Крыльцо Кр-5/1 /КЖ-23				
141	935	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	0.61	15 072	9 194
142	936	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м3	1.39	64 954	90 286
143	937	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W10	м3	1.41085	24 394	34 416
144	938	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00813	344 590	2 802
145	939	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0187	382 476	7 151

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
146	940	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.08979	338 700	30 412
147	941	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	4.732	4 271	20 210
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-5/1 /КЖ-23				**194 472**
			Итого по разделу: Фундаменты				**194 472**
			Итого по отделу: Блок №10				**194 472**
			Итого по локальной смете: Земляные работы,фундаменты				**19 564 922**
			ИТОГО по акту:				**19 564 922**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)				19564922.000 x 9.40%	1 839 102
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				19564922.000 + 1839102.593	21 404 024
		Сметная прибыль, 5.00%				21404024.593 x 5.00%	1 070 201
		Непредвиденные расходы, 5.000%				21404024.593 x 5.000%	1 070 201
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					23 544 427
		НДС (12%)				23544427.053 x 12%	2 825 331
		Итого с НДС				23544427.053 + 2825331.246	26 369 758

Лист согласования
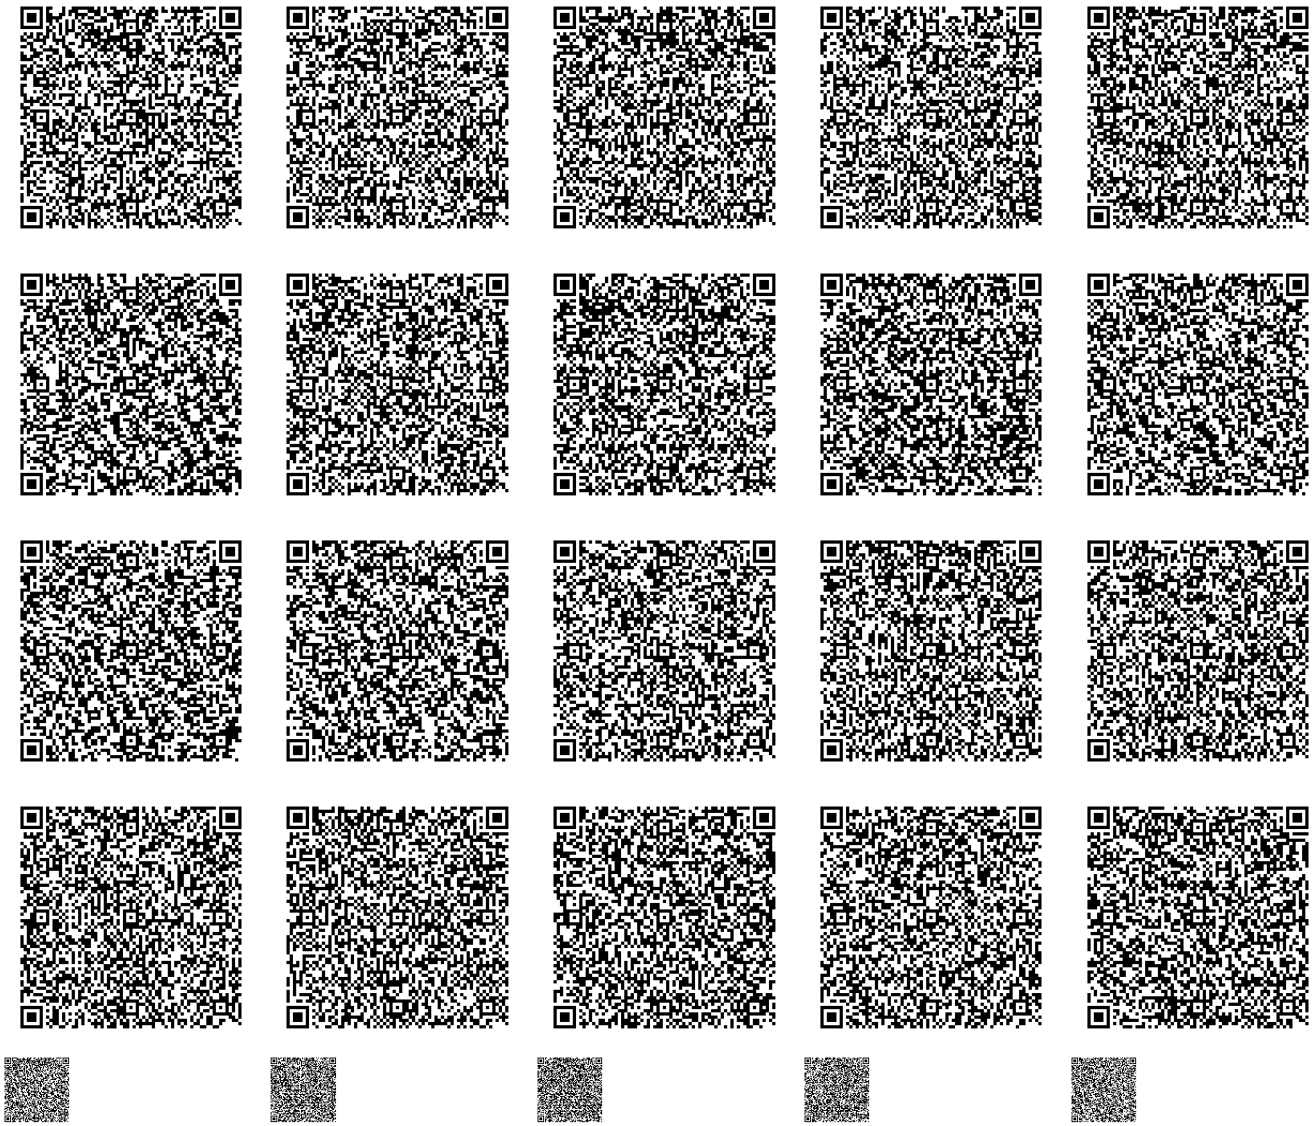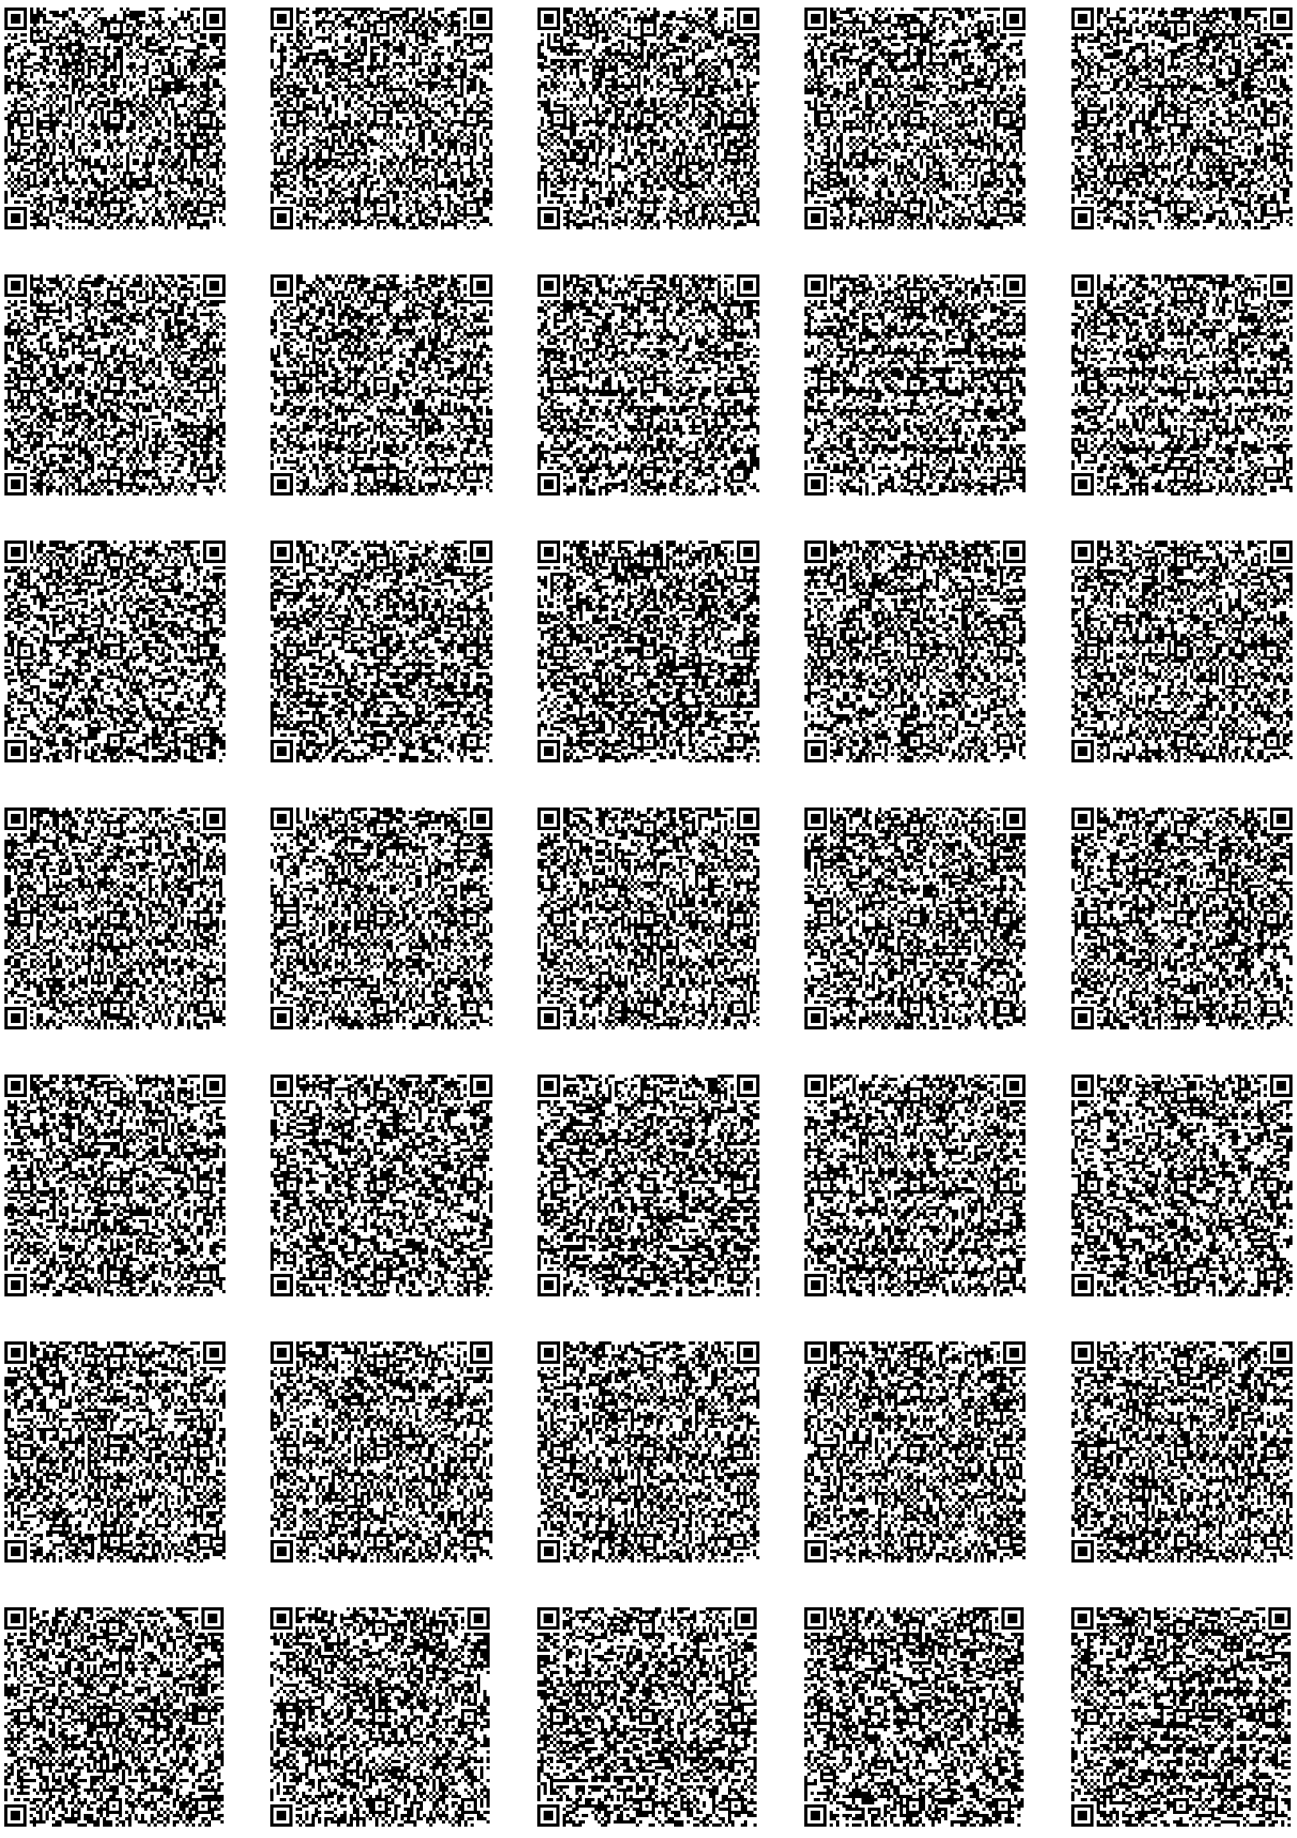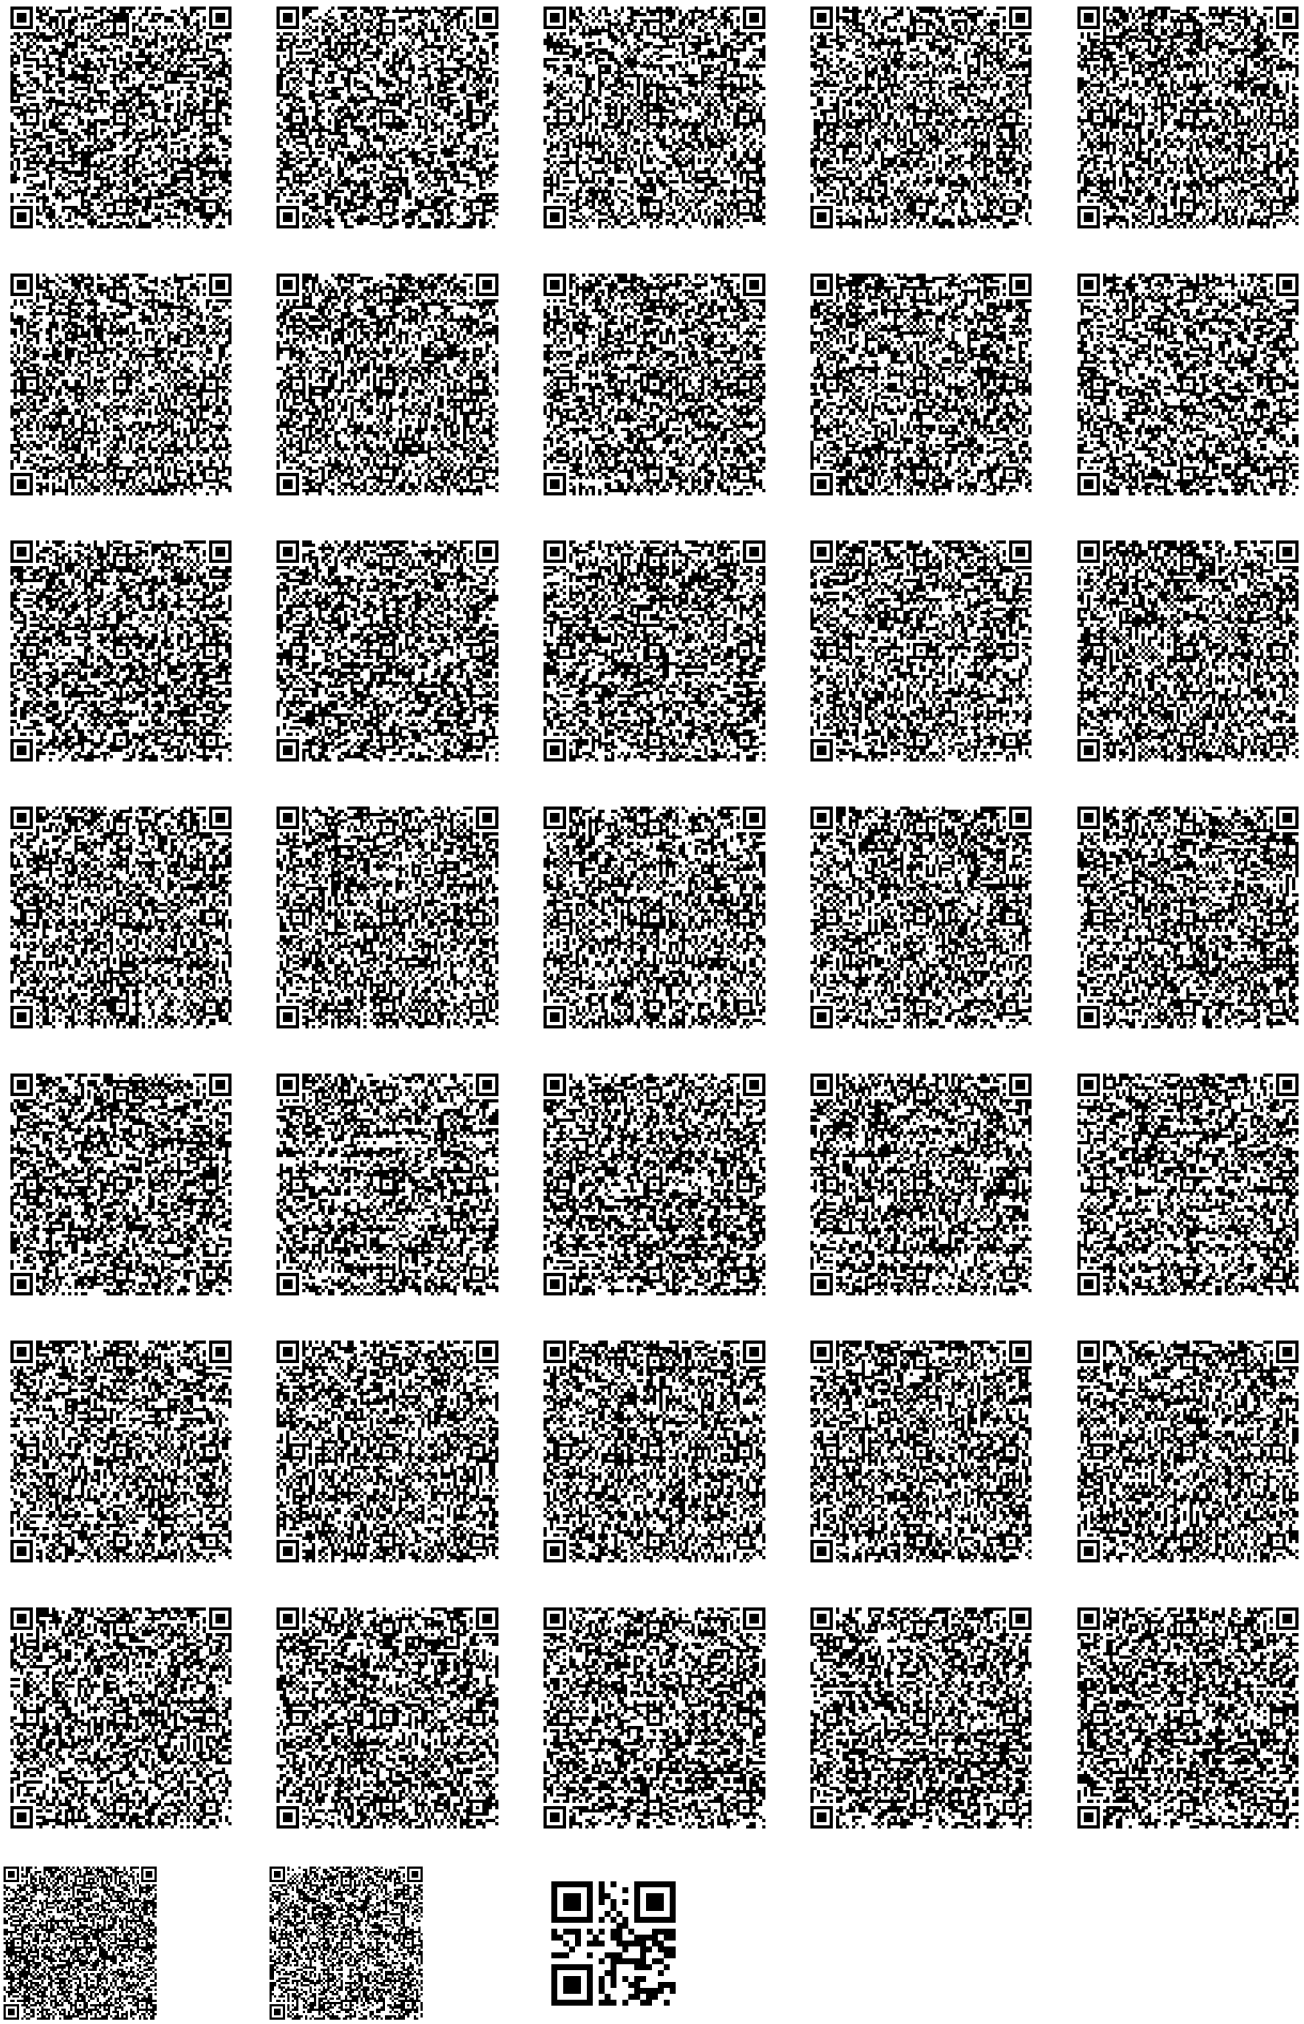
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	23.02.2025 07:09
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	24.02.2025 10:07
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	23.02.2025 12:17
Представители заказчика		
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	27.02.2025 05:57
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	25.02.2025 06:58 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) отдела смет и ценообразования	28.02.2025 05:52 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	28.02.2025 13:54
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	27.02.2025 04:33
