Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструктивная часть здания.Конструкции железобетонные				
			Отдел: Блок 2				
			Раздел: Колонны /КЖ21-КЖ24/				
			Подраздел: РКолонна Км-1 4шт				
1	90	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения,периметр до 3 м	м2	5.92	3 856	22 827
			Итого по подразделу: РКолонна Км-1 4шт				**22 827**
			Подраздел: РКолонна Км-2 4шт				
2	97	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения,периметр до 3 м	м2	7.2	3 856	27 763
			Итого по подразделу: РКолонна Км-2 4шт				**27 763**
			Итого по разделу: Колонны /КЖ21-КЖ24/				**50 590**
			Раздел: Балки				
			Подраздел: РБалка монолитная Бм-1 2шт				
3	112	6103-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	51.52	10 606	546 421
			Итого по подразделу: РБалка монолитная Бм-1 2шт				**546 421**
			Подраздел: РБалка монолитная Бм-2 2шт				
4	120	6103-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	52.08	10 606	552 360
			Итого по подразделу: РБалка монолитная Бм-2 2шт				**552 360**
			Подраздел: РБалка монолитная Бм-3 2шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	128	6103-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	51.52	10 606	546 421
6	129	6103-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0.83654	96 263	80 528
7	130	6103-0401-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	м3	7.52	11 862	89 202
8	131	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7.6328	26 417	201 636
9	132	6103-0401-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	51.52	6 646	342 402
10	133	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.29476	344 590	101 571
11	134	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.54178	326 417	176 846
12	135	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0.02746	1 529 702	42 006
			Итого по подразделу: РБалка монолитная Бм-3 2шт				**1 580 612**
			Подраздел: РБалка монолитная Бм-4 2шт				
13	136	6103-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	52.08	10 606	552 360
14	137	6103-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0.7257	96 263	69 858
15	138	6103-0401-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	м3	7.68	11 862	91 100
16	139	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7.7952	26 417	205 926
17	140	6103-0401-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	52.08	6 646	346 124
18	141	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2968	344 590	102 274
19	142	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4289	326 417	140 000
20	143	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0.02746	1 529 702	42 006
			Итого по подразделу: РБалка монолитная Бм-4 2шт				**1 549 648**
			Подраздел: РБалка монолитная Бм-5 2шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	144	6103-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	52.08	10 606	552 360
22	145	6103-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0.86818	96 263	83 574
23	149	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.26644	344 590	91 813
24	150	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.60174	326 417	196 417
25	151	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0.03662	1 529 702	56 018
26	152	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес более 20 кг	т	0.05024	1 313 412	65 986
			Итого по подразделу: РБалка монолитная Бм-5 2шт				**1 046 169**
			Итого по разделу: Балки				**5 275 210**
			Итого по отделу: Блок 2				**5 325 800**
			Отдел: Блок 7				
			Раздел: Колонны				
			Подраздел: РКолонна Км-1 4шт				
27	558	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения,периметр до 3 м	м2	22	3 856	84 831
			Итого по подразделу: РКолонна Км-1 4шт				**84 831**
			Подраздел: РКолонна Км-2 4шт				
28	565	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения,периметр до 3 м	м2	27	3 856	104 111
			Итого по подразделу: РКолонна Км-2 4шт				**104 111**
			Итого по разделу: Колонны				**188 943**
			Итого по отделу: Блок 7				**188 943**
			Отдел: Блок 8				
			Раздел: Перекрытие				
			Подраздел: РПерекрытие на отметке -0,380 /КЖ-18/				
29	693	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 5 м2	шт.	5	7 739	38 695
30	694	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 м2	шт.	30	9 423	282 690

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	695	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	20.111	12 064	242 619
32	696	222-203-0416РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ,длиной от 7,9 до 9,6 м,высотой сечения 280 мм,под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	361.9279	19 672	7 119 900
33	697	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03683	344 590	12 691
			Итого по подразделу: РПерекрытие на отметке -0,380 /КЖ-18/				**7 696 595**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-1 1шт				
34	698	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.9	81 808	73 627
35	699	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.05509	326 417	17 982
36	700	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03511	344 590	12 099
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-1 1шт				**103 708**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-2 1шт				
37	701	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.4	81 808	32 723
38	702	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.01758	326 417	5 738
39	703	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01963	344 590	6 764
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-2 1шт				**45 225**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-3 1шт				
40	704	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.4	81 808	32 723
41	705	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.02614	326 417	8 533
42	706	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01697	344 590	5 848
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-3 1шт				**47 104**
			Подраздел: РПерекрытие на отметке+3,22 /КЖ-36/				
43	707	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 5 м2	шт.	2	7 739	15 478
44	708	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 м2	шт.	30	9 423	282 690
45	709	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	8.0444	12 064	97 048
46	710	222-203-0416РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ,длиной от 7,9 до 9,6 м,высотой сечения 280 мм,под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	361.9279	19 672	7 119 900

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	711	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03493	344 590	12 037
			Итого по подразделу: РПерекрытие на отметке+3,22 /КЖ-36/				**7 527 153**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-1 1шт				
48	712	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.9	81 808	73 627
49	713	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.05314	326 417	17 346
50	714	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03511	344 590	12 099
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-1 1шт				**103 072**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-2 1шт				
51	715	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.3	81 808	24 542
52	716	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.02492	326 417	8 134
53	717	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01445	344 590	4 979
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-2 1шт				**37 655**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-3 1шт				
54	718	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0.4	81 808	32 723
55	719	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.05996	326 417	19 572
56	720	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01697	344 590	5 848
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-3 1шт				**58 143**
			Подраздел: РПерекрытие на отметке+6,2				
57	721	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 5 м2	шт.	6	7 739	46 434
58	722	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	23.4572	12 064	282 988
59	723	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0076	344 590	2 619
			Итого по подразделу: РПерекрытие на отметке+6,2				**332 041**
			Итого по разделу: Перекрытие				**15 950 696**
			Итого по отделу: Блок 8				**15 950 696**
			Итого по локальной смете: Конструктивная часть здания.Конструкции железобетонные				**21 465 440**
			ИТОГО по акту:				**21 465 440**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)				21465440.552 x 9.40%	2 017 751

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				21465440.552 + 2017751.330	23 483 191
			Сметная прибыль, 5.00%			23483191.882 x 5.00%	1 174 159
			Непредвиденные расходы, 5.000%			23483191.882 x 5.000%	1 174 159
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					25 831 511
			НДС (12%)			25831511.070 x 12%	3 099 781
		Итого с НДС				25831511.070 + 3099781.328	28 931 292

Лист согласования
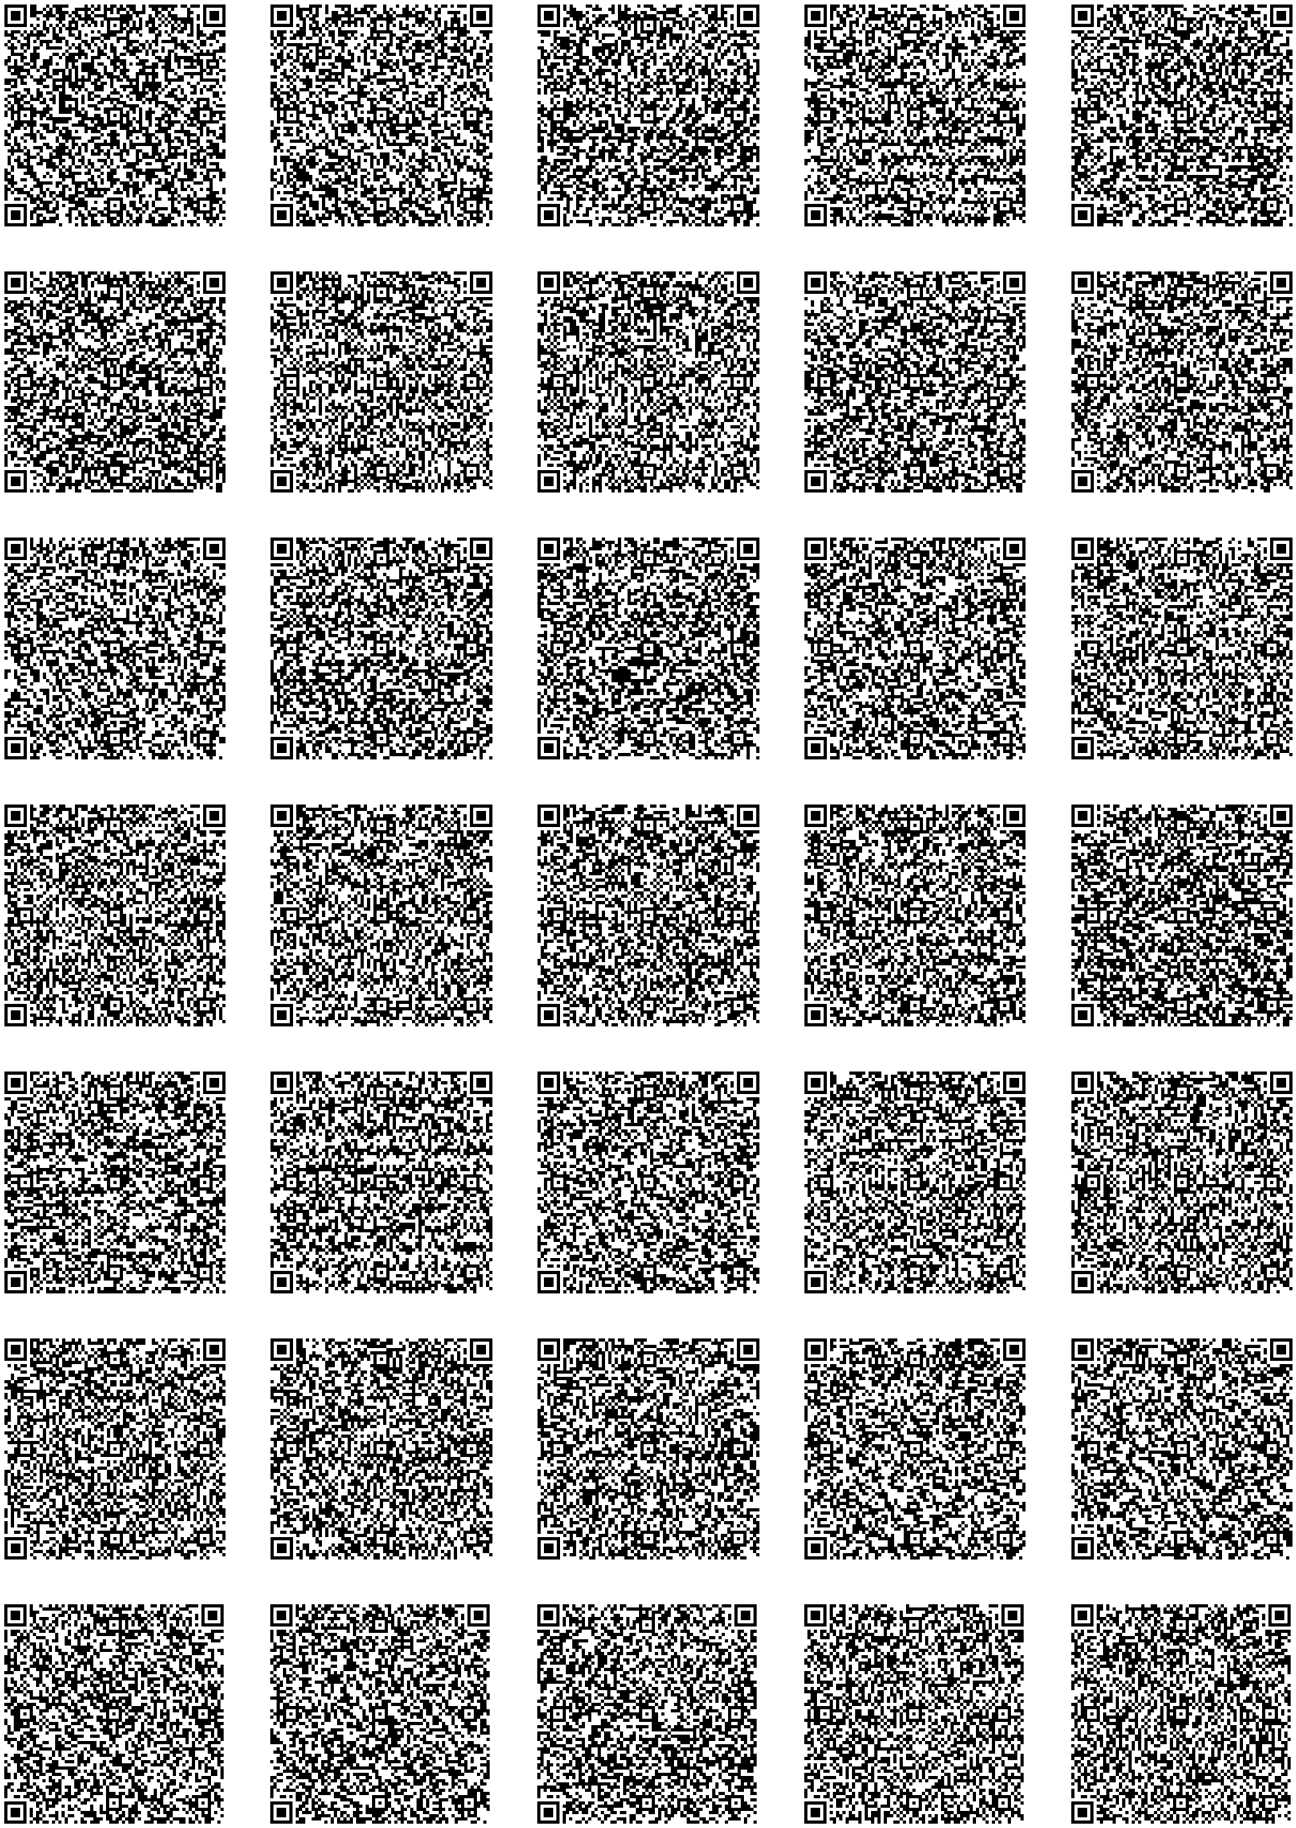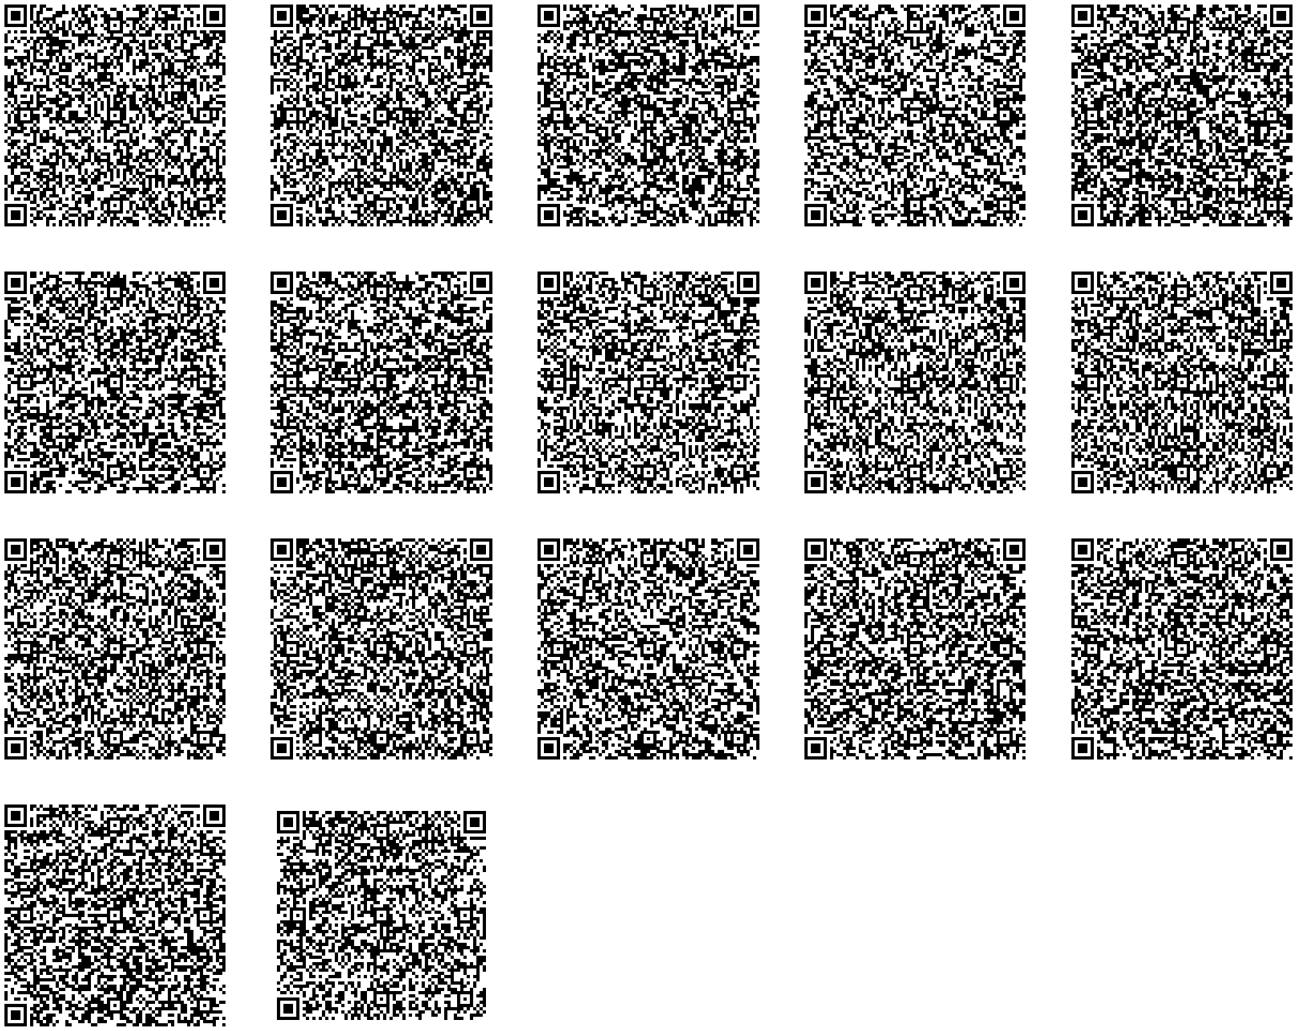
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	28.02.2025 07:26
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	28.02.2025 07:37
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	28.02.2025 07:33
Представители заказчика		
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) отдела смет и ценообразования	28.02.2025 16:04 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	28.02.2025 16:16
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	28.02.2025 10:49
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	28.02.2025 11:16
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	28.02.2025 11:19 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
