Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструктивная часть здания.Конструкции железобетонные				
			Отдел: Блок 1				
			Раздел: Армирование кладки /КЖ-17				
			Подраздел: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 27				
1	3	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0.05692	1 496 849	85 201
2	4	217-101-0301РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	76	33	2 508
3	5	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.06744	65 056	4 387
4	6	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.06744	382 476	25 794
			Итого по подразделу: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 27				**117 890**
			Итого по разделу: Армирование кладки /КЖ-17				**117 890**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Козырек крыльца КР-3 /КЖ-31				
5	52	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0.0096	2 326 559	22 334
6	53	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.17244	78 130	13 473
7	54	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.1668	346 400	57 780
8	55	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00564	335 421	1 892

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	56	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.09632	114 424	11 021
10	57	214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.09632	388 107	37 382
11	58	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0.28002	362 511	101 510
12	59	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.28002	374 529	104 876
13	60	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	29.472588	270	7 958
14	61	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	29.472588	414	12 202
15	62	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0.045	209 993	9 450
16	64	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	8.04	5 743	46 174
17	66	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	8.14	2 336	19 015
18	67	224-102-0506РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	9.361	2 604	24 376
19	68	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1	7 715	7 715
20	69	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство желобов подвесных	м	2.1	4 036	8 476
21	70	1208-0101-1901РСНБ РК 2022	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3.3	3 877	12 794
			Итого по подразделу: Козырек крыльца КР-3 /КЖ-31				**498 429**
			Подраздел: Козырек крыльца КР-3/1				
22	71	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0.0096	2 326 559	22 334
23	72	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.17244	78 130	13 473
24	73	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.1668	346 400	57 780

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	74	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00564	335 421	1 892
26	75	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.09632	114 424	11 021
27	76	214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.09632	388 107	37 382
28	77	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0.28002	362 511	101 510
29	78	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.28002	374 529	104 876
30	79	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	29.472588	270	7 958
31	80	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	29.472588	414	12 202
32	81	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0.045	209 993	9 450
33	83	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	8.04	5 743	46 174
34	85	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	8.14	2 336	19 015
35	86	224-102-0506РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	9.361	2 604	24 376
36	87	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1	7 715	7 715
37	88	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство желобов подвесных	м	2.1	4 036	8 476
38	89	1208-0101-1901РСНБ РК 2022	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3.3	3 877	12 794
			Итого по подразделу: Козырек крыльца КР-3/1				**498 429**
			Итого по разделу: Разные работы				**996 858**
			Итого по отделу: Блок 1				**1 114 748**
			Отдел: Блок 2				
			Раздел: Балки				
			Подраздел: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 17/1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	157	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0.01266	1 496 849	18 950
40	158	217-105-0103РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1.4	1 086	1 520
41	159	6111-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м2	6.8	2 945	20 026
42	160	234-101-0205РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0.34	37 936	12 898
43	161	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.02049	65 056	1 333
44	162	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02049	382 476	7 837
			Итого по подразделу: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 17/1				**62 564**
			Итого по разделу: Балки				**62 564**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Козырек крыльца КР-10/2 /КЖ-14				
45	165	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0.0096	2 326 559	22 334
46	166	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.16892	78 130	13 198
47	167	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.16328	346 400	56 560
48	168	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00564	335 421	1 892
49	169	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.09757	114 424	11 164
50	170	214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.09757	388 107	37 868
51	171	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0.24507	362 511	88 841
52	172	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.24507	374 529	91 786
53	173	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	27.491063	270	7 423
54	174	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	27.491063	414	11 381

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	175	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0.042	209 993	8 820
56	177	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	7.65	5 743	43 934
57	179	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	7.75	2 336	18 104
58	180	224-102-0506РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	8.9125	2 604	23 208
59	181	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1	7 715	7 715
60	182	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство желобов подвесных	м	2.4	4 036	9 686
61	183	1208-0101-1901РСНБ РК 2022	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3.3	3 877	12 794
62	184	6106-0306-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами	м2	7.75	18 790	145 622
63	185	214-204-0616РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8.9125	3 501	31 203
			Итого по подразделу: Козырек крыльца КР-10/2 /КЖ-14				**643 534**
			Итого по разделу: Разные работы				**643 534**
			Итого по отделу: Блок 2				**706 098**
			Отдел: Блок 3				
			Раздел: Армирование кладки /КЖ-26				
			Подраздел: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 27				
64	188	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0.05392	1 496 849	80 710
65	189	217-101-0301РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	96	33	3 168
66	190	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.08194	65 056	5 331
67	191	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.08194	382 476	31 340
			Итого по подразделу: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 27				**120 549**
			Итого по разделу: Армирование кладки /КЖ-26				**120 549**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Козырек крыльца КР-5				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	249	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0.0096	2 326 559	22 334
69	250	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.16892	78 130	13 198
70	251	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.16328	346 400	56 560
71	252	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00564	335 421	1 892
72	253	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.0786	114 424	8 994
73	254	214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.0785	388 107	30 466
74	255	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0.4069	362 511	147 506
75	256	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.4069	374 529	152 396
76	257	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	35.058264	270	9 466
77	258	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	35.058264	414	14 514
78	259	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0.038	209 993	7 980
79	261	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	7.8	5 743	44 795
80	263	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	7.02	2 336	16 399
81	264	224-102-0506РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	8.073	2 604	21 022
82	265	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1	7 715	7 715
83	266	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство желобов подвесных	м	2.1	4 036	8 476
84	267	1208-0101-1901РСНБ РК 2022	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3.8	3 877	14 733

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	268	6106-0306-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами	м2	8.71	18 790	163 661
86	269	214-204-0616РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	10.0165	3 501	35 068
			Итого по подразделу: Козырек крыльца КР-5				**777 176**
			Итого по разделу: Разные работы				**777 176**
			Итого по отделу: Блок 3				**897 725**
			Отдел: Блок 4				
			Раздел: Армирование кладки /КЖ-25				
			Подраздел: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 26				
87	272	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0.20895	1 496 849	312 767
88	273	217-101-0301РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	279	33	9 207
89	274	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.24642	65 056	16 031
90	275	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.24642	382 476	94 250
			Итого по подразделу: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 26				**432 255**
			Итого по разделу: Армирование кладки /КЖ-25				**432 255**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Козырек крыльца КР-6/1				
91	351	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0.0096	2 326 559	22 334
92	352	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.15485	78 130	12 098
93	353	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.14921	346 400	51 685
94	354	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00564	335 421	1 892
95	355	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.05796	114 424	6 632
96	356	214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.05796	388 107	22 495
97	357	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0.20993	362 511	76 102

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	358	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.20993	374 529	78 625
99	359	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	24.110779	270	6 509
100	360	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	24.110779	414	9 982
101	361	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0.027	209 993	5 670
102	363	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	5.03	5 743	28 887
103	365	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	4.94	2 336	11 540
104	366	224-102-0506РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	5.681	2 604	14 793
105	367	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1	7 715	7 715
106	368	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство желобов подвесных	м	2.1	4 036	8 476
107	369	1208-0101-1901РСНБ РК 2022	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3	3 877	11 631
108	370	6106-0306-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами	м2	5.32	18 790	99 963
109	371	214-204-0616РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	6.118	3 501	21 419
			Итого по подразделу: Козырек крыльца КР-6/1				**498 451**
			Итого по разделу: Разные работы				**498 451**
			Итого по отделу: Блок 4				**930 706**
			Отдел: Блок 5				
			Раздел: Армирование кладки /КЖ-20				
			Подраздел: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 20/1				
110	374	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0.15615	1 496 849	233 733
111	375	217-101-0301РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	278	33	9 174

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	376	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.26203	65 056	17 047
113	377	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.16203	382 476	61 973
			Итого по подразделу: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 20/1				**321 927**
			Итого по разделу: Армирование кладки /КЖ-20				**321 927**
			Итого по отделу: Блок 5				**321 927**
			Отдел: Блок 6				
			Раздел: Армирование кладки /КЖ-19				
			Подраздел: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 19/1				
114	455	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0.10054	1 496 849	150 493
115	456	217-101-0301РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	179	33	5 907
116	457	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.1556	65 056	10 123
117	458	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1556	382 476	59 513
			Итого по подразделу: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 19/1				**226 036**
			Итого по разделу: Армирование кладки /КЖ-19				**226 036**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Козырек крыльца КР-4				
118	516	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0.0096	2 326 559	22 334
119	517	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.16892	78 130	13 198
120	518	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.16328	346 400	56 560
121	519	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00564	335 421	1 892
122	520	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.09907	114 424	11 336
123	521	214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.09907	388 107	38 450
124	522	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0.24507	362 511	88 841

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
125	523	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.24507	374 529	91 786
126	524	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	27.558113	270	7 441
127	525	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	27.558113	414	11 409
128	526	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0.042	209 993	8 820
129	528	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	7.65	5 743	43 934
130	530	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	7.75	2 336	18 104
131	531	224-102-0506РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	8.9125	2 604	23 208
132	532	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1	7 715	7 715
133	533	6106-0306-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами	м2	7.75	18 790	145 622
134	534	214-204-0616РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8.9125	3 501	31 203
135	535	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство желобов подвесных	м	2.1	4 036	8 476
136	536	1208-0101-1901РСНБ РК 2022	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3.3	3 877	12 794
			Итого по подразделу: Козырек крыльца КР-4				**643 124**
			Подраздел: Козырек крыльца КР-6				
137	537	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0.0096	2 326 559	22 334
138	538	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.15485	78 130	12 098
139	539	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.14921	346 400	51 685
140	540	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00564	335 421	1 892

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	541	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.07069	114 424	8 089
142	542	214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.07069	388 107	27 435
143	543	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0.17399	362 511	63 072
144	544	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.17399	374 529	65 164
145	545	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	21.713992	270	5 863
146	546	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	21.713992	414	8 990
147	547	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0.027	209 993	5 670
148	549	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	7.65	5 743	43 934
149	551	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	4.84	2 336	11 306
150	552	224-102-0506РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	5.566	2 604	14 494
151	553	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1	7 715	7 715
152	554	6106-0306-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами	м2	7.65	18 790	143 744
153	555	214-204-0616РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8.7975	3 501	30 800
154	556	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство желобов подвесных	м	2.1	4 036	8 476
155	557	1208-0101-1901РСНБ РК 2022	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3.3	3 877	12 794
			Итого по подразделу: Козырек крыльца КР-6				**545 558**
			Итого по разделу: Разные работы				**1 188 682**
			Итого по отделу: Блок 6				**1 414 718**
			Отдел: Блок 7				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перемычки ПР-1 1шт				
			Подраздел: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 17/1				
156	625	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0.01266	1 496 849	18 950
157	626	217-105-0103РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1.4	1 086	1 520
158	627	6111-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м2	6.8	2 945	20 026
159	628	234-101-0205РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0.34	37 936	12 898
160	629	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.02049	65 056	1 333
161	630	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02049	382 476	7 837
			Итого по подразделу: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 17/1				**62 564**
			Итого по разделу: Перемычки ПР-1 1шт				**62 564**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Козырек крыльца КР-10 /КЖ-14				
162	633	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0.0096	2 326 559	22 334
163	634	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.28866	78 130	22 553
164	635	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.28302	346 400	98 038
165	636	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00564	335 421	1 892
166	637	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.06962	114 424	7 966
167	638	214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.06962	388 107	27 020
168	639	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0.17399	362 511	63 072
169	640	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.17399	374 529	65 164
170	641	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	30.029288	270	8 108

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
171	642	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	30.029288	414	12 432
172	643	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0.027	209 993	5 670
173	645	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	4.74	5 743	27 222
174	647	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	4.84	2 336	11 306
175	648	224-102-0506РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	5.566	2 604	14 494
176	649	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1	7 715	7 715
177	650	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство желобов подвесных	м	2.3	4 036	9 283
178	651	1208-0101-1901РСНБ РК 2022	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3.3	3 877	12 794
179	652	6106-0306-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами	м2	4.84	18 790	90 944
180	653	214-204-0616РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	5.566	3 501	19 487
			Итого по подразделу: Козырек крыльца КР-10 /КЖ-14				**527 496**
			Итого по разделу: Разные работы				**527 496**
			Итого по отделу: Блок 7				**590 060**
			Отдел: Блок 8				
			Раздел: Армирование кладки /КЖ-26				
			Подраздел: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 27				
181	656	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0.00112	1 496 849	1 676
182	657	217-101-0301РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	2	33	66
183	658	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.00587	65 056	382
184	659	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00587	382 476	2 245
			Итого по подразделу: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 27				**4 369**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Армирование кладки /КЖ-26				**4 369**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Козырек крыльца КР-8 /КЖ-21/				
185	729	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0.0192	2 326 559	44 669
186	730	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.30688	78 130	23 977
187	731	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.2956	346 400	102 396
188	732	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.01128	335 421	3 784
189	733	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.15839	114 424	18 124
190	734	214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.15839	388 107	61 472
191	735	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0.26246	362 511	95 145
192	736	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.26246	374 529	98 299
193	737	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	56.133791	270	15 156
194	738	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	56.133791	414	23 239
195	739	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0.045	209 993	9 450
196	741	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	11.5	5 743	66 044
197	743	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	11.5	2 336	26 864
198	744	224-102-0506РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	13.225	2 604	34 438
199	745	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	2.6	7 715	20 059

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
200	746	6106-0306-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами	м2	11.6	18 790	217 964
201	747	214-204-0616РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	13.34	3 501	46 703
202	748	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство желобов подвесных	м	11.7	4 036	47 221
203	749	1208-0101-1901РСНБ РК 2022	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3.3	3 877	12 794
			Итого по подразделу: Козырек крыльца КР-8 /КЖ-21/				**967 799**
			Подраздел: Козырек крыльца КР-13				
204	750	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0.0096	2 326 559	22 334
205	751	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.31358	78 130	24 499
206	752	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.30794	346 400	106 670
207	753	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00564	335 421	1 892
208	754	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.09063	114 424	10 370
209	755	214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.09063	388 107	35 174
210	756	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0.2924	362 511	105 998
211	757	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.2924	374 529	109 512
212	758	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	38.683255	270	10 444
213	759	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	38.683255	414	16 015
214	760	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0.035	209 993	7 350
215	762	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	7.8	5 743	44 795

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
216	764	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	8	2 336	18 688
217	765	224-102-0506РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	9.2	2 604	23 957
218	766	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.6	7 715	12 344
219	767	6106-0306-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами	м2	8	18 790	150 320
220	768	214-204-0616РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9.2	3 501	32 209
221	769	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство желобов подвесных	м	3.4	4 036	13 722
222	770	1208-0101-1901РСНБ РК 2022	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3.3	3 877	12 794
			Итого по подразделу: Козырек крыльца КР-13				**759 089**
			Итого по разделу: Разные работы				**1 726 888**
			Итого по отделу: Блок 8				**1 731 257**
			Отдел: Блок 9				
			Раздел: Армирование кладки /КЖ-27				
			Подраздел: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 27				
223	773	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0.12413	1 496 849	185 804
224	774	217-101-0301РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	221	33	7 293
225	775	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.12846	65 056	8 357
226	776	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.12846	382 476	49 133
			Итого по подразделу: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 27				**250 587**
			Итого по разделу: Армирование кладки /КЖ-27				**250 587**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Козырек крыльца КР-7 /КЖ-22/				
227	804	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0.0096	2 326 559	22 334
228	805	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.16728	78 130	13 069

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
229	806	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.15882	346 400	55 015
230	807	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00846	335 421	2 838
231	808	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.08342	114 424	9 545
232	809	214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.08342	388 107	32 376
233	810	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0.16873	362 511	61 166
234	811	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.16873	374 529	63 194
235	812	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	22.70065	270	6 129
236	813	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	22.70065	414	9 398
237	814	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0.025	209 993	5 250
238	816	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	5.3	5 743	30 438
239	818	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	5.5	2 336	12 848
240	819	224-102-0506РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	6.325	2 604	16 470
241	820	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.6	7 715	12 344
242	821	6106-0306-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами	м2	5.5	18 790	103 345
243	822	214-204-0616РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	6.325	3 501	22 144
244	823	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство желобов подвесных	м	2.8	4 036	11 301
245	824	1208-0101-1901РСНБ РК 2022	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3.3	3 877	12 794
			Итого по подразделу: Козырек крыльца КР-7 /КЖ-22/				**502 000**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Козырек крыльца КР-9 /КЖ-24/				
246	825	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0.0144	2 326 559	33 502
247	826	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.23438	78 130	18 312
248	827	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.22592	346 400	78 259
249	828	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00846	335 421	2 838
250	829	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.16082	114 424	18 402
251	830	214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.16082	388 107	62 415
252	831	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0.26246	362 511	95 145
253	832	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.26246	374 529	98 299
254	833	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	35.22814	270	9 512
255	834	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	35.22814	414	14 584
256	835	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0.045	209 993	9 450
257	837	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	8.5	5 743	48 816
258	839	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	8.7	2 336	20 323
259	840	224-102-0506РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	10.005	2 604	26 053
260	841	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	2.6	7 715	20 059
261	842	6106-0306-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами	м2	8.7	18 790	163 473
262	843	214-204-0616РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	10.005	3 501	35 028

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
263	844	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство желобов подвесных	м	5	4 036	20 180
264	845	1208-0101-1901РСНБ РК 2022	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3.3	3 877	12 794
			Итого по подразделу: Козырек крыльца КР-9 /КЖ-24/				**787 444**
			Итого по разделу: Разные работы				**1 289 444**
			Итого по отделу: Блок 9				**1 540 031**
			Отдел: Блок 10				
			Раздел: Армирование кладки /КЖ-26				
			Подраздел: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 27				
265	848	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0.10391	1 496 849	155 538
266	849	217-101-0301РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	185	33	6 105
267	850	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.15968	65 056	10 388
268	851	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.15968	382 476	61 074
			Итого по подразделу: РКрепление кирпичной стены к колонне КЖ 27				**233 105**
			Итого по разделу: Армирование кладки /КЖ-26				**233 105**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Козырек крыльца КР-5/1				
269	905	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0.0096	2 326 559	22 334
270	906	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.15836	78 130	12 373
271	907	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.15272	346 400	52 902
272	908	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00564	335 421	1 892
273	909	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.07723	114 424	8 837
274	910	214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.07723	388 107	29 974
275	911	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0.20722	362 511	75 120

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
276	912	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.20722	374 529	77 610
277	913	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	23.953665	270	6 467
278	914	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	23.953665	414	9 917
279	915	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0.035	209 993	7 350
280	917	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	5.68	5 743	32 620
281	919	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	5.5	2 336	12 848
282	920	224-102-0506РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	6.325	2 604	16 470
283	921	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1	7 715	7 715
284	922	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство желобов подвесных	м	2.1	4 036	8 476
285	923	1208-0101-1901РСНБ РК 2022	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3.4	3 877	13 182
286	924	6106-0306-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами	м2	6.05	18 790	113 680
287	925	214-204-0616РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	6.9575	3 501	24 358
			Итого по подразделу: Козырек крыльца КР-5/1				**534 126**
			Итого по разделу: Разные работы				**534 126**
			Итого по отделу: Блок 10				**767 231**
			Итого по локальной смете: Конструктивная часть здания.Конструкции железобетонные				**10 014 501**
			ИТОГО по акту:				**10 014 501**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (9.400%)				10014501.000 x 9.40%	941 363
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				10014501.000 + 941363.056	10 955 864
		Сметная прибыль, (5.00%)				10955864.056 x 5.00%	547 793
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				10955864.056 x 5.000%	547 793
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					12 051 450

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС (12%)				12051450.461 x 12%	1 446 174
		Итого с НДС				12051450.461 + 1446174.055	13 497 624

Лист согласования
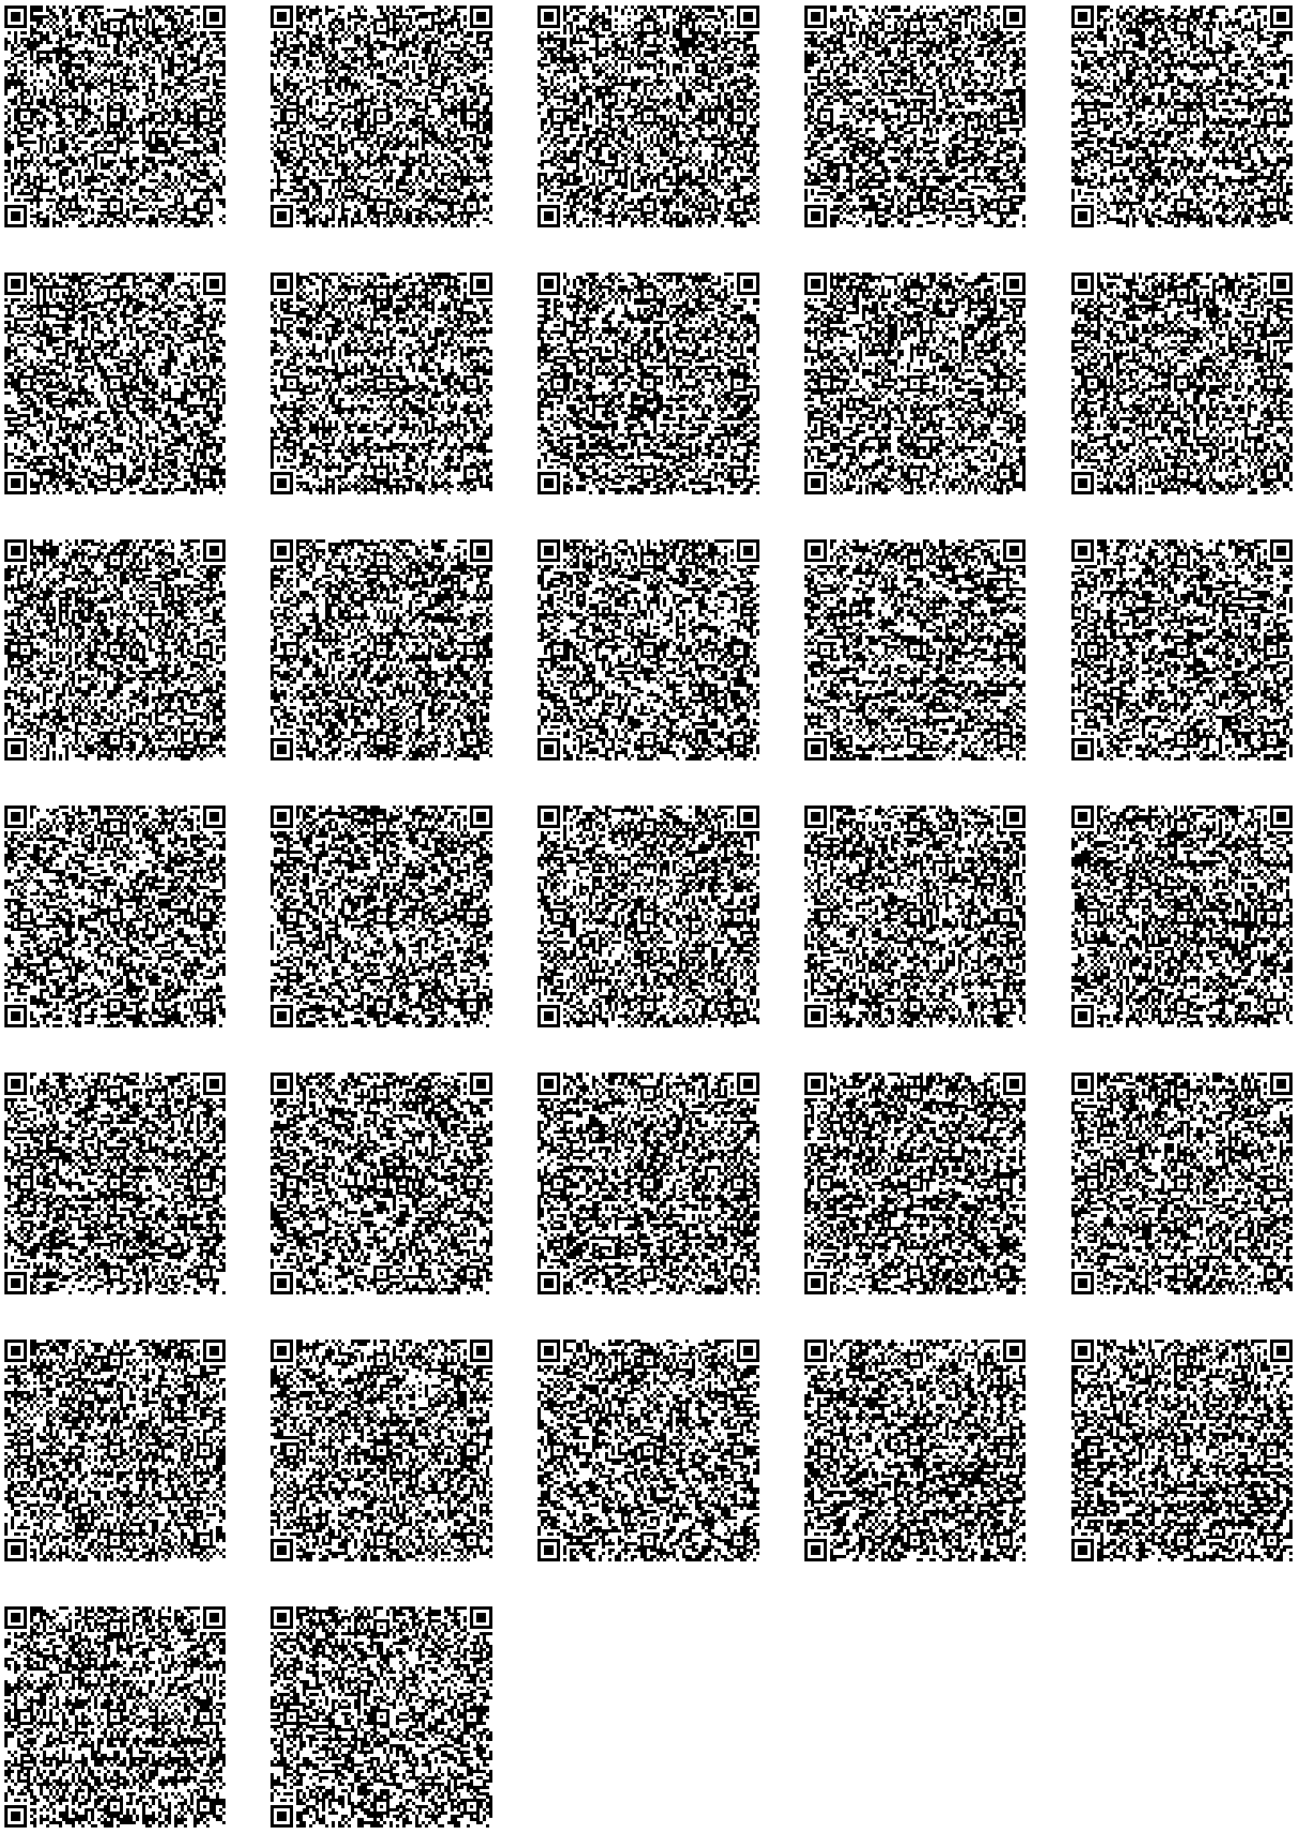
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	04.03.2025 12:22
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	04.03.2025 18:38
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	04.03.2025 18:14
Представители заказчика		
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	05.03.2025 13:27
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	05.03.2025 18:31 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	05.03.2025 11:18 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	06.03.2025 12:49
