Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Котельная				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	6101-0102-0114ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6.111	376	2 298
2	2	6101-0201-0202ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.189	7 965	1 505
3	3	6101-0206-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м3	0.63	4 156	2 618
4	4	6101-0106-0105ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	5.67	67	380
5	5	6101-0107-0501ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5.67	656	3 720
			Итого по разделу: Земляные работы				**10 521**
			Раздел: Фундамент				
			Подраздел: Плита монолитная ПМ1				
6	6	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	42.84	15 072	645 684
7	7	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	23.2	14 521	336 887
8	8	212-101-2304РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W10	м3	23.548	27 807	654 799
9	9	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры,диаметр до 16 мм	т	0.529	91 769	48 546
10	10	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.529	326 417	172 675
11	11	6103-0701-0808ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0.07659	1 529 702	117 160

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	12.64	4 271	53 985
			Итого по подразделу: Плита монолитная ПМ1				**2 029 736**
			Подраздел: Фундамент Фм1				
13	13	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	1.587	15 072	23 919
14	14	6103-0101-0204ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 25 м3	м3	7.01	17 276	121 104
15	15	212-101-2304РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W10	м3	7.11515	27 807	197 851
16	16	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры,диаметр до 16 мм	т	0.12813	91 769	11 758
17	17	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.12813	326 417	41 824
18	18	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00749	344 590	2 581
19	19	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.0788	326 417	25 722
20	20	6103-0701-0804ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0.07464	206 793	15 435
21	21	217-101-0107РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.07464	954 056	71 211
22	22	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	6.12	4 271	26 139
23	23	1109-0601-0102РСНБ РК 2022	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж крышки приямка	т конструкций	0.011131	254 272	2 830
24	24	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.00754	374 529	2 824
25	25	214-105-0102РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.003591	454 411	1 632
26	26	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.322799	206	66
			Итого по подразделу: Фундамент Фм1				**544 897**
			Итого по разделу: Фундамент				**2 574 633**
			Итого по локальной смете: Котельная				**2 585 154**
			ИТОГО по акту:				**2 585 154**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (9.400%)	2585154.000 x 9.40%	243 004
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	2585154.000 + 243004.466	2 828 158
	Сметная прибыль, (5.00%)	2828158.466 x 5.00%	141 407
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	2828158.466 x 5.000%	141 407
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		3 110 974

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557				3110974.313 x 1.0557	3 284 255
		НДС (12%)				3284255.582 x 12%	394 110
		Итого с НДС				3284255.582 + 394110.670	3 678 366

Лист согласования
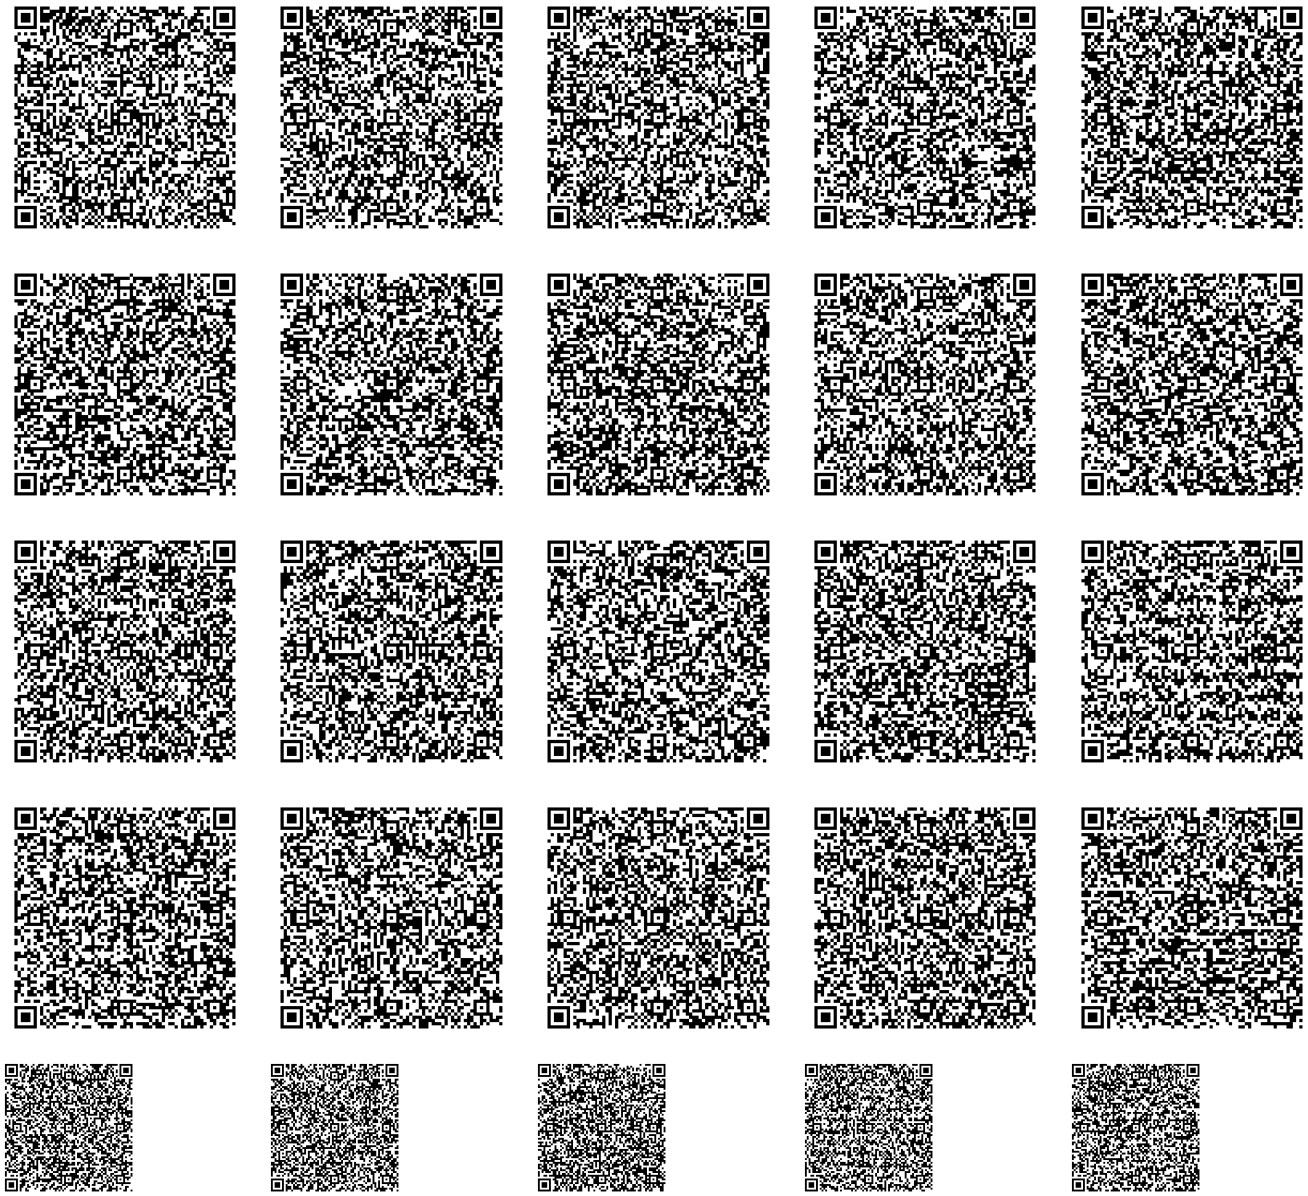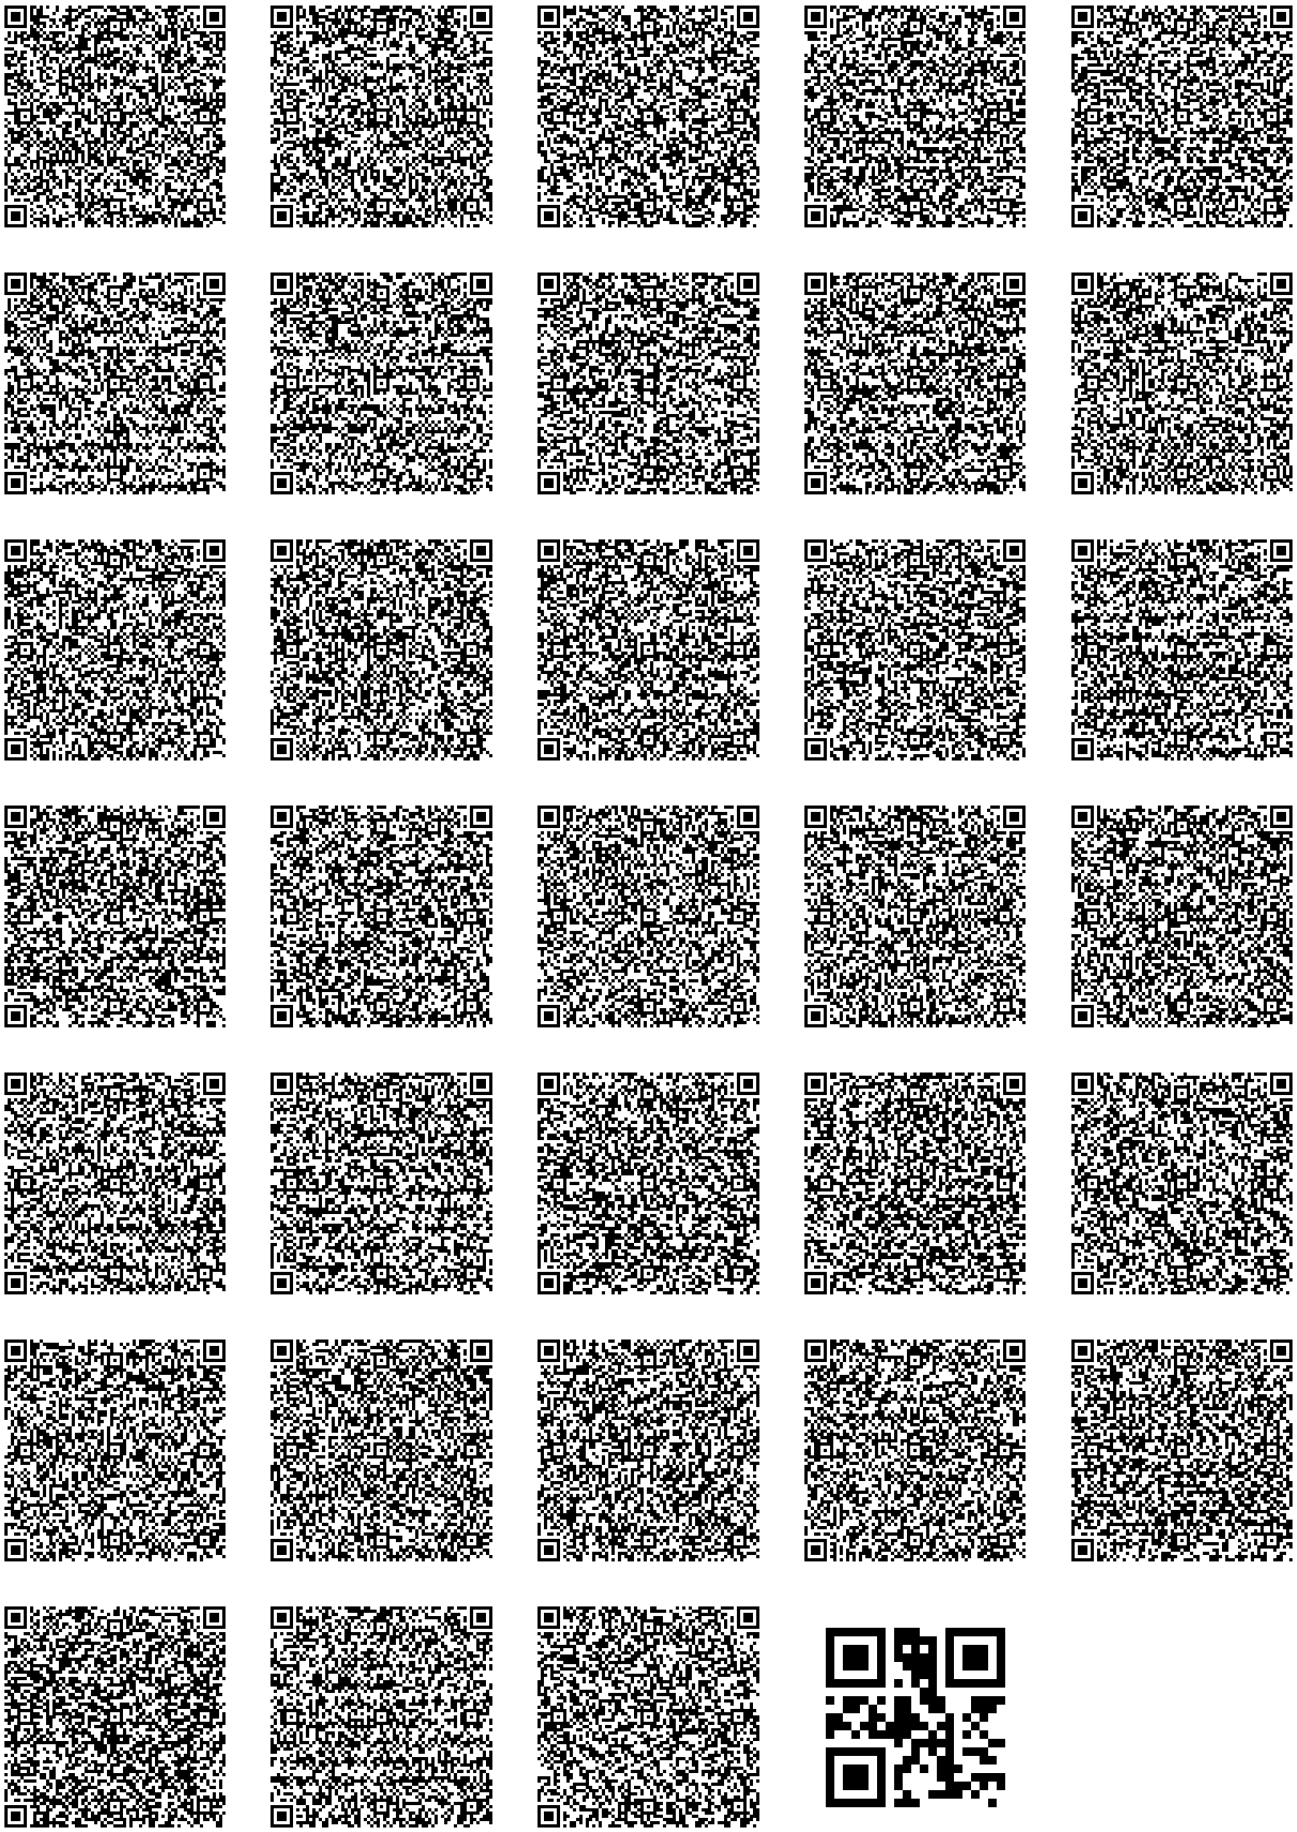
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	06.03.2025 09:52
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	06.03.2025 15:02
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	06.03.2025 14:02
Представители заказчика		
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	07.03.2025 11:38 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	07.03.2025 08:56
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	07.03.2025 14:48 Комментарий: расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	08.03.2025 12:32
