Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети газоснабжения				
			Раздел: Резервуарная установка сжиженного углеводородного газа				
			Подраздел: РЗемляные работы. Резервуары				
1	1	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	424	525	222 600
2	2	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.	м3	13	11 730	152 490
3	3	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	104.8	525	55 020
4	4	412-101-0112РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	2075.04	78	161 853
5	5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	30	4 156	124 679
6	6	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	55	98	5 390
7	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	55	656	36 080
			Итого по подразделу: РЗемляные работы. Резервуары				**758 112**
			Подраздел: РПодземные трубопроводы				
8	8	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	132	505	66 660

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	4.1	9 558	39 188
10	10	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	11.1	4 156	46 132
11	11	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	125	98	12 250
			Итого по подразделу: РПодземные трубопроводы				**164 230**
			Подраздел: РФундамент Фм1 1шт				
12	13	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом/ 300 мм	м2	104	27 228	2 831 712
13	14	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	10.8	10 494	113 334
14	15	212-101-1813РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	11.016	22 025	242 627
15	18	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.1278	1 536 702	196 391
16	19	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.1529	336 177	723 755
17	20	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1015	344 590	34 976
			Итого по подразделу: РФундамент Фм1 1шт				**4 142 796**
			Подраздел: РФундамент Фм2 2 шт				
18	22	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	11	42 680	469 480
19	23	212-101-2013РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	11.165	23 769	265 381
20	24	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0192	2 333 559	44 804
21	25	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0612	336 177	20 574
22	26	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0878	344 590	30 255
23	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	29.6	4 271	126 422
			Итого по подразделу: РФундамент Фм2 2 шт				**956 916**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: РФундамент Фм3 1 шт				
24	28	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	2.1	42 680	89 628
25	29	212-101-2013РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2.1315	23 769	50 664
26	30	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0096	2 333 559	22 402
27	31	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0233	336 177	7 833
28	32	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0185	344 590	6 375
29	33	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	9.3	4 271	39 720
			Итого по подразделу: РФундамент Фм3 1 шт				**216 622**
			Подраздел: РОграждение резервуарной установки				
30	52	6104-0801-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	47	12 187	572 789
31	53	212-101-2013РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	3.68	23 769	87 470
32	54	222-526-0106РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Стойки СТ-1 с МС1-МС4	т	0.04208	1 192 498	50 180
33	55	222-509-1601РСНБ РК 2022	Сварные сетчатые панели ограждения	т	0.8404	932 114	783 349
34	56	6104-0801-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 283	4 283
35	57	222-509-1601РСНБ РК 2022	Сварные сетчатые панели ограждения-калитка	т	0.0248	932 114	23 116
			Итого по подразделу: РОграждение резервуарной установки				**1 521 187**
			Итого по разделу: Резервуарная установка сжиженного углеводородного газа				**7 759 863**
			Итого по локальной смете: Наружные сети газоснабжения				**7 759 863**
			ИТОГО по акту:				**7 759 863**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (9.400%)	7759863.978 x 9.40%	729 427
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	7759863.978 + 729427.184	8 489 291
	Сметная прибыль, (5.00%)	8489291.163 x 5.00%	424 464
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	8489291.163 x 5.000%	424 464
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		9 338 220

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557				9338220.279 x 1.0557	9 858 359
		НДС (12%)				9858359.149 x 12%	1 183 003
		Итого с НДС				9858359.149 + 1183003.098	11 041 362

Лист согласования
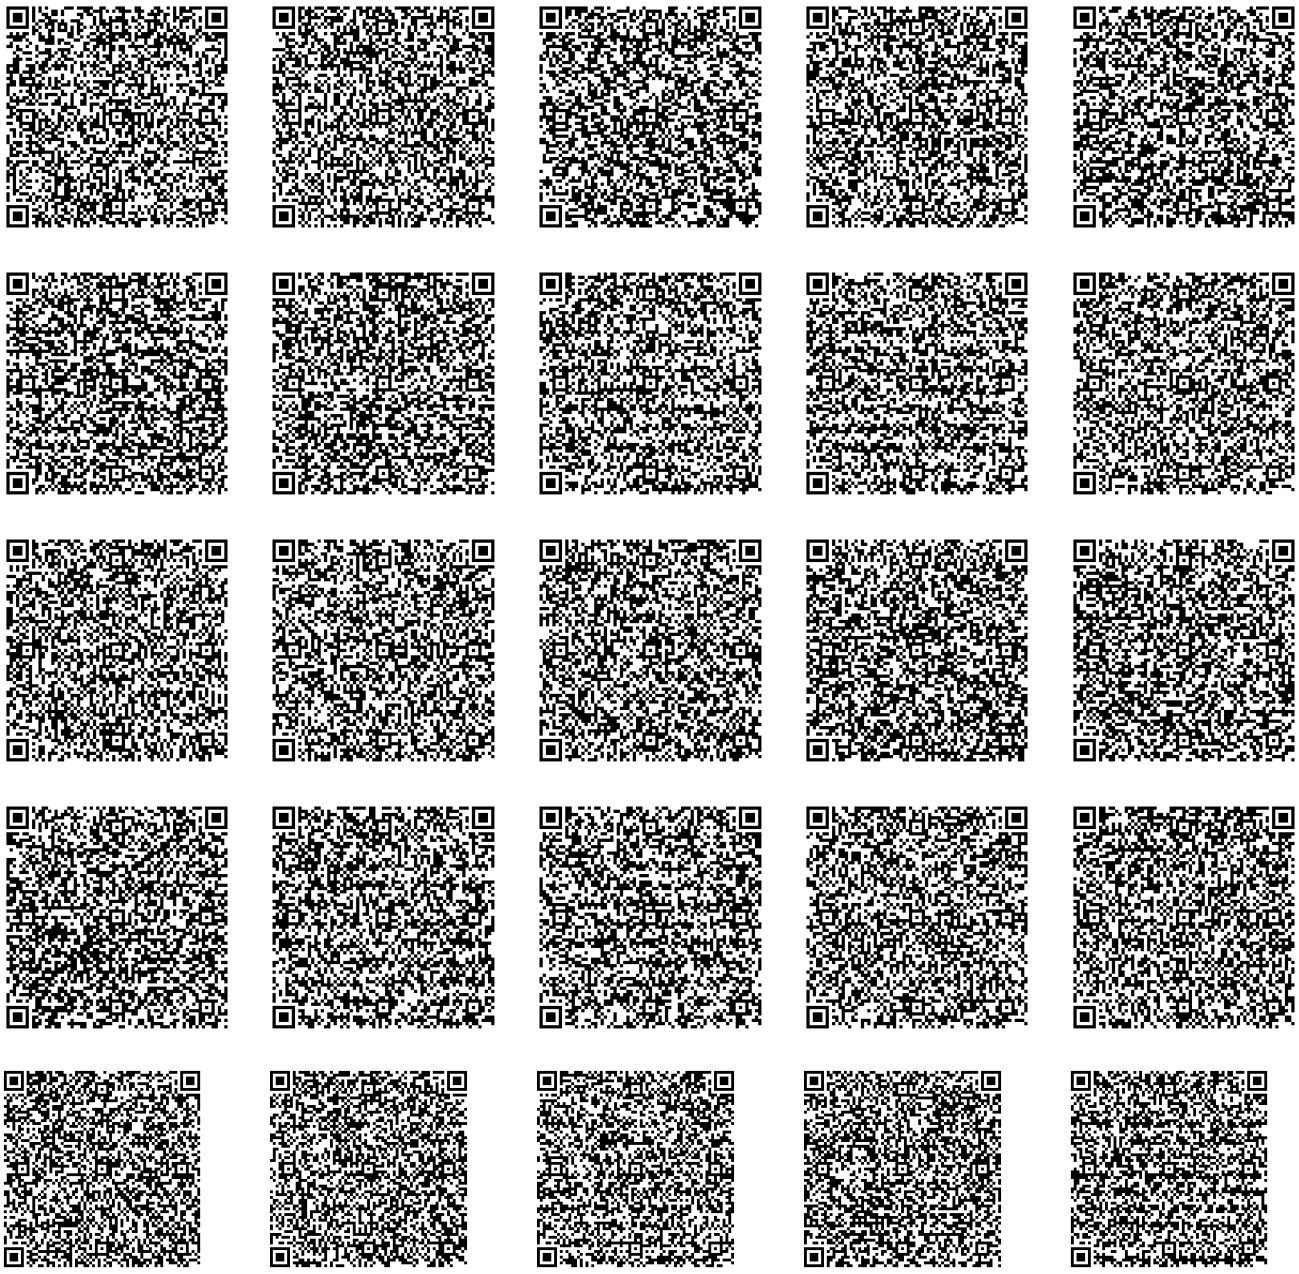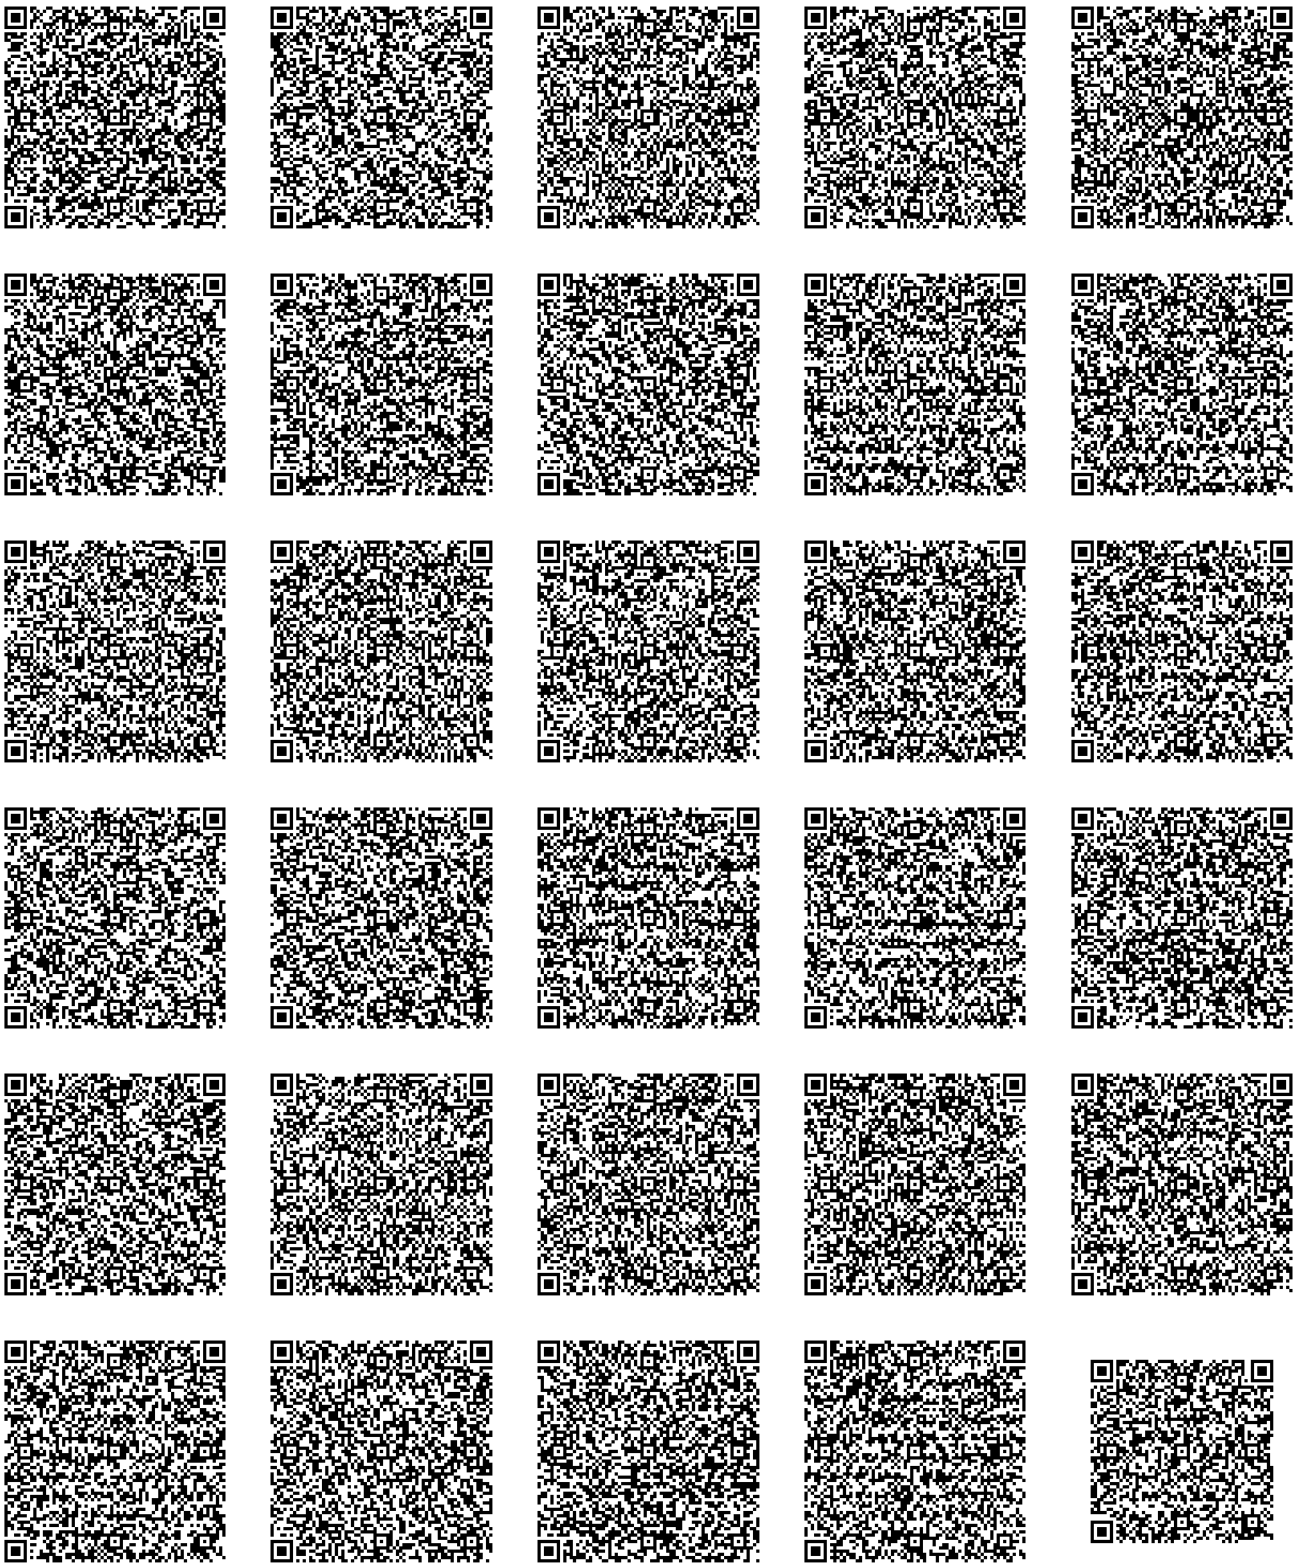
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	17.03.2025 18:01
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	18.03.2025 13:52
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	17.03.2025 20:28
Представители заказчика		
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	19.03.2025 15:32
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	27.03.2025 11:01
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	26.03.2025 17:25 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
