Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Фасадное электроосвещение				
1	1	6119-0602-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	23 269	23 269
2	2	247-201-0802РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 027	13 027
3	3	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 609	59 481
4	4	247-204-9033РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	1	1 912	1 912
5	5	247-217-3109СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 10A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	7	5 047	35 329
6	6	247-204-9001РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P C1A 4.5kA	шт.	1	878	878
7	7	6124-0202-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка аппарата пускорегулирующего	шт.	3	8 449	25 347
8	8	247-208-2927СпрСЦ 04.2024	Контактор NXC-18 18A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	1	5 768	5 768
9	9	247-211-1626СпрСЦ 04.2024	Реле тепловое защитное NXR-25 17-25A (R)	шт.	1	3 910	3 910
10	10	247-206-0206РСНБ РК 2022	Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003),типа ПЕ-22 3 фиксированных положений I-O-II удлиненная ручка 1НО+1	шт.	1	1 704	1 704
11	11	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	3	7 150	21 450
12	12	247-212-0401РСНБ РК 2022	Выключатель кнопочный типа ВК-22 ABLF 22 мм 220В/Кнопка SB-7 Пуск	шт.	2	683	1 366

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	247-216-0801РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная,ADDS 22 мм LED 220В	шт.	1	588	588
14	14	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609	6 609
15	15	247-103-3604СпрСЦ 04.2024	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	1	2 377	2 377
16	16	247-216-0201РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	шт.	1	132	132
17	17	6124-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные.	шт.	34	16 137	548 658
18	18	247-105-1603СпрСЦ 04.2024	Светильник для фасадного освещения LED B250 20W Grey,мощность 20Вт,IP54,230В	шт.	34	48 960	1 664 640
19	19	6124-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	48	15 346	736 608
20	20	247-103-0986СпрСЦ 04.2024	Прожектор LED B2152 2x10W 3000K,светодиодный,мощность 20Вт,220В,IP54	шт.	48	21 797	1 046 256
			Итого по локальной смете: Фасадное электроосвещение				**4 199 309**
			ИТОГО по акту:				**4 199 309**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (9.400%)	4199309.000 x 9.40%	394 735
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	4199309.000 + 394735.030	4 594 044
	Сметная прибыль, (5.00%)	4594044.030 x 5.00%	229 702
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	4594044.030 x 5.000%	229 702
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		5 053 448
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557	5053448.433 x 1.0557	5 334 925
	НДС (12%)	5334925.511 x 12%	640 191
	Итого с НДС	5334925.511 + 640191.061	5 975 116

Лист согласования
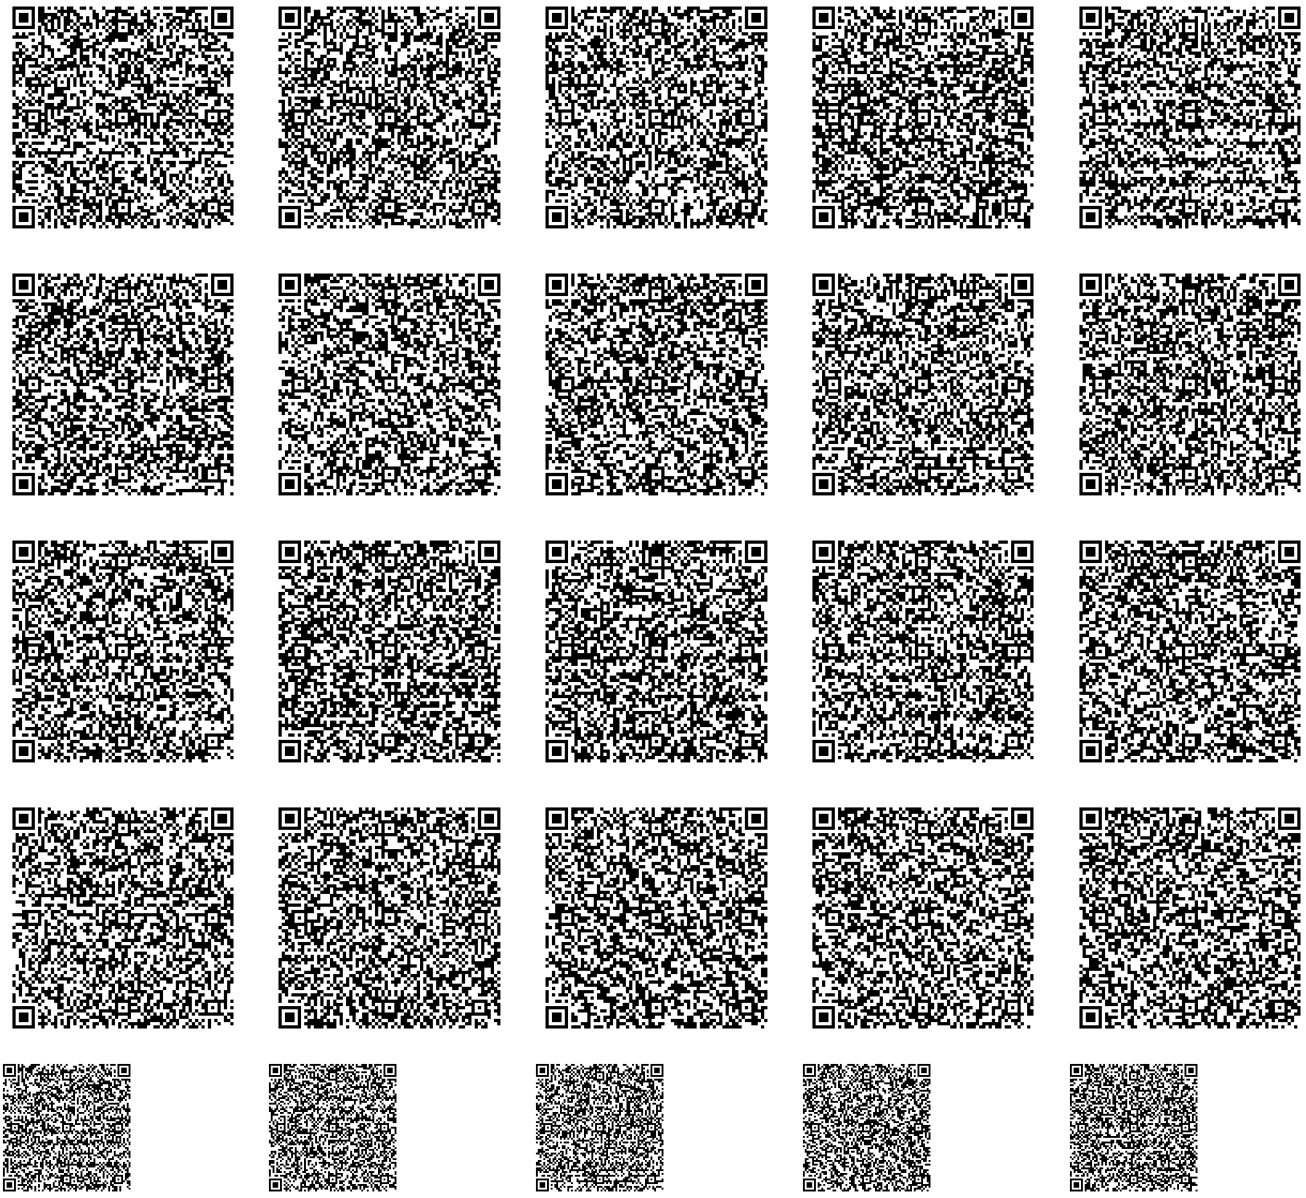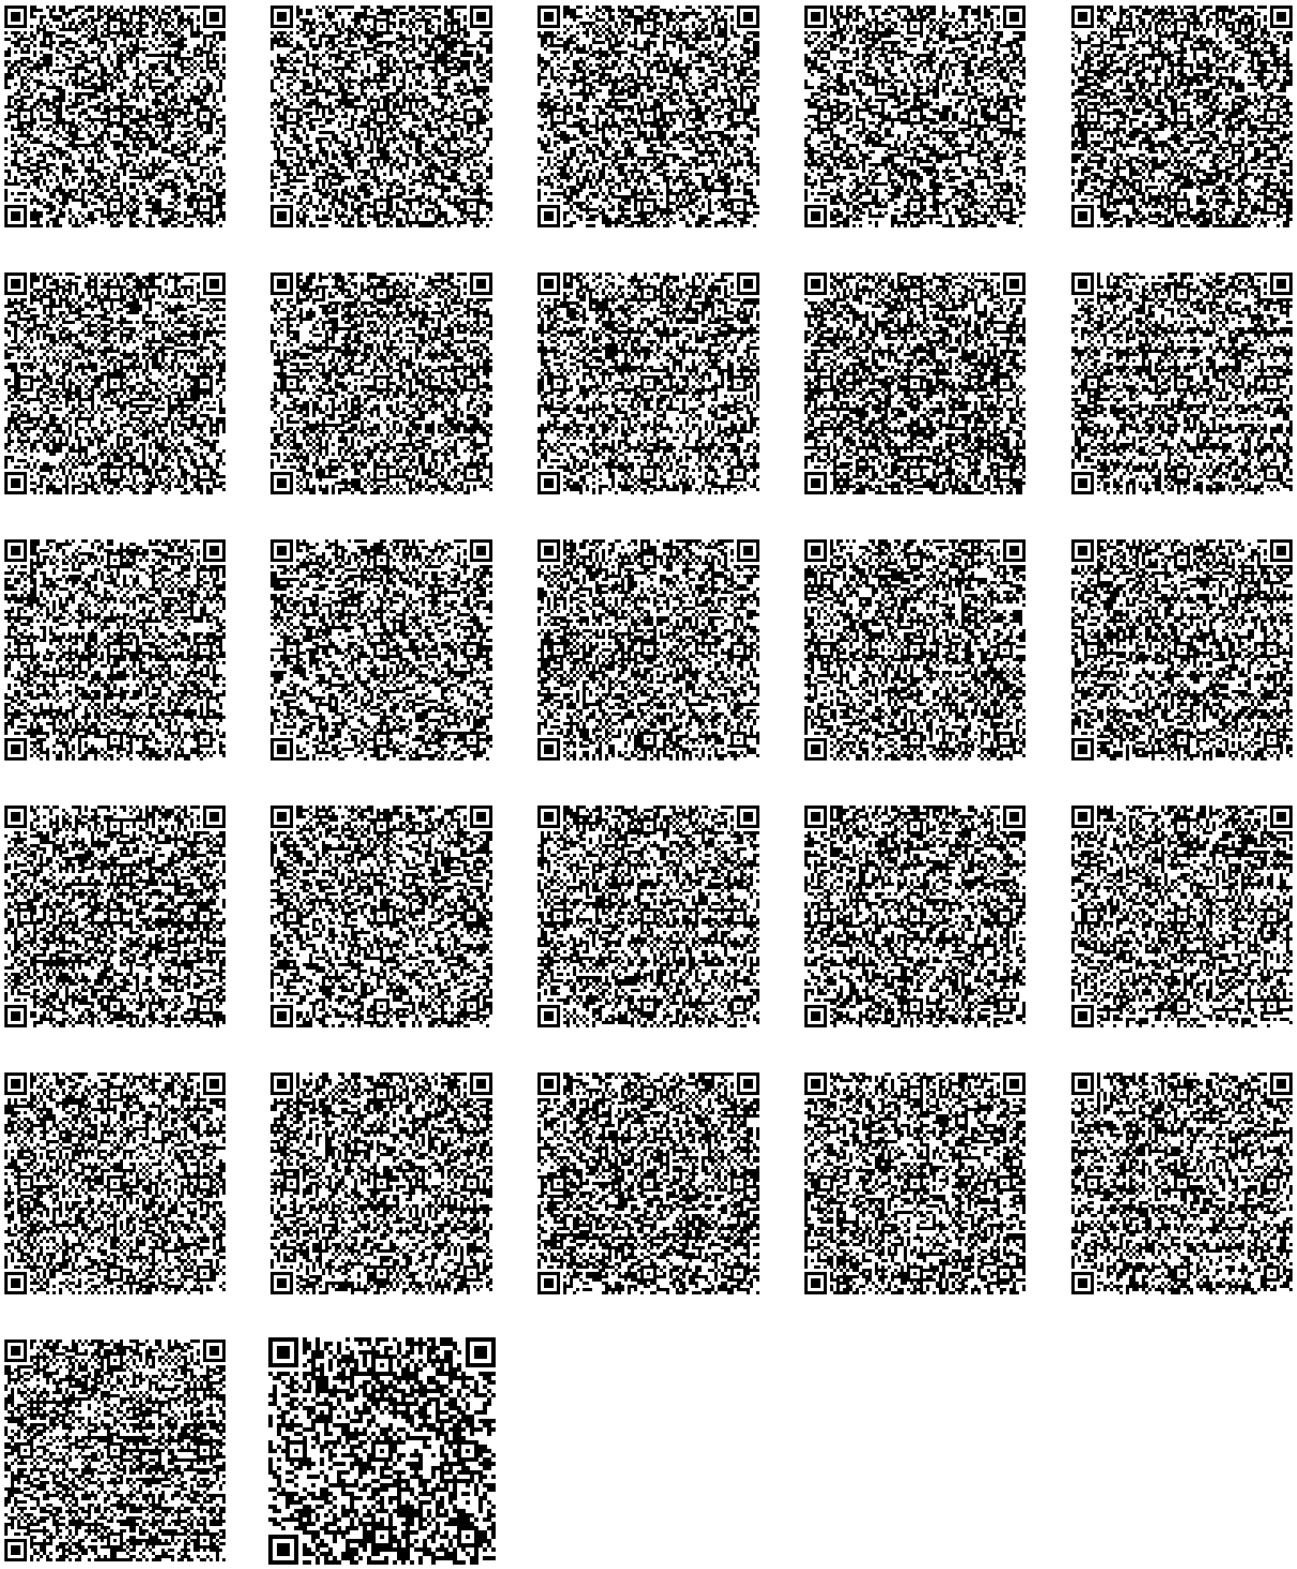
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	11.03.2025 18:02
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	12.03.2025 13:54
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	11.03.2025 18:09
Представители заказчика		
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	14.03.2025 19:36 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	18.03.2025 15:08
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	13.03.2025 08:11 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	14.03.2025 17:06
