Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление, вентиляция				
			Раздел: Вентиляция				
			Подраздел: РСистема вентиляции В1				
1	213	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	10	6 863	68 630
2	214	246-302-0504 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	10	6 181	61 810
3	215	6118-0203-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	2	7 765	15 530
4	216	246-302-0685 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	20 167	40 334
5	217	6118-0202-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,36 м2 в конструкцию подвесных потолков	шт.	10	3 663	36 630
6	218	СТЕСЦ РСНБ РК 2024	Потолочный диффузор вытяжной 4АПН 450х450	шт.	10	23 987	239 871
7	219	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	40.62	14 792	600 851
8	220	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	55.66	13 122	730 371
9	221	6118-0101-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м2	85.17	12 111	1 031 494

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	222	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	8.0384	14 483	116 420
11	223	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	67.1	5 438	364 890
12	224	234-304-2602 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 10 мм	м2	5.39	6 343	34 189
13	225	234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	68.42	5 004	342 374
14	226	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	60.9	775	47 198
			Итого по подразделу: РСистема вентиляции В1				**3 730 592**
			Итого по разделу: Вентиляция				**3 730 592**
			Раздел: Приточная установка П8				
			Подраздел: РСистема вентиляции ДВ1				
15	674	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34 195	34 195
16	675	514-202-0468 РСНБ РК 2022	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока вверх RFF-1000-SE-7,5/6-GP	шт.	1	1 851 868	1 851 868
17	676	246-309-0109 РСНБ РК 2022	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 1000-го типоразмера	шт.	1	184 330	184 330
18	677	6118-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных диаметр до 1000 мм	шт.	1	20 317	20 317
19	678	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	32 903	32 903
20	679	246-302-1416 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 1000 мм	шт.	1	155 776	155 776
21	681	6118-0101-0415 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	м2	20.7	8 743	180 980
22	682	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4.2	775	3 255

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	683	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	20.7	5 438	112 567
24	684	234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	22.77	5 004	113 941
			Итого по подразделу: РСистема вентиляции ДВ1				**2 690 132**
			Подраздел: РСистема вентиляции ДВ2				
25	685	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34 195	34 195
26	686	514-202-0441 РСНБ РК 2022	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока вверх RFF-630-SE-4,0/4-GP	шт.	1	696 561	696 561
27	687	246-309-0106 РСНБ РК 2022	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 710-го типоразмера	шт.	1	123 899	123 899
28	688	6118-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных диаметр до 1000 мм	шт.	3	20 317	60 951
29	689	246-302-1413 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 630 мм	шт.	1	89 494	89 494
30	691	6118-0101-0415 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	м2	22.8	8 743	199 340
31	692	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5.7	775	4 418
32	693	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	22.8	5 438	123 986
33	694	234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	25.08	5 004	125 500
			Итого по подразделу: РСистема вентиляции ДВ2				**1 458 344**
			Подраздел: РСистема вентиляции ДП1				
34	695	6118-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т	шт.	1	39 913	39 913
35	696	514-103-0317 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения осевой объемный типоразмерами 400-710 AXF-450- B-3/2-G P	шт.	1	251 517	251 517

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	697	246-309-0104 РСНБ РК 2022	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 450-го типоразмера	шт.	1	62 462	62 462
37	698	6118-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных диаметр до 1000 мм	шт.	1	20 317	20 317
38	699	246-302-1411 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 450 мм	шт.	1	66 403	66 403
39	700	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 662	23 662
40	701	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43 952	43 952
41	702	246-301-0305 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 450 мм/Зонт для крышного вентилятора	шт.	1	21 921	21 921
42	703	1120-2601-0401 РСНБ РК 2022	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1	55 590	55 590
43	704	СТРСНБ РК 2022	Канальный электрический нагреватель диаметром 160мм, наружного монтажа, N±3кВт	шт.	1	40 943	40 944
44	705	6118-0203-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных периметр до 2400 мм	шт.	1	11 858	11 858
45	706	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	2	32 903	65 806
46	707	246-302-1519 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 700х400 мм	шт.	1	66 316	66 316
47	709	6118-0101-0415 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	м2	15.58	8 743	136 216
48	710	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4.9	775	3 798
49	711	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	15.6	5 438	84 833
50	712	234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	17.16	5 004	85 869
			Итого по подразделу: РСистема вентиляции ДП1				**1 081 377**
			Подраздел: РСистема вентиляции ДП2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	713	6118-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т	шт.	1	39 913	39 913
52	714	514-103-0316 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения осевой объемный типоразмерами 400-710 AXF-450-A-2,2/2-GP	шт.	1	208 755	208 755
53	715	246-309-0104 РСНБ РК 2022	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 450-го типоразмера	шт.	1	62 462	62 462
54	716	246-301-0305 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 450 мм/Зонт для крышного вентилятора	шт.	1	21 921	21 921
55	717	6118-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных диаметр до 560 мм	шт.	1	7 778	7 778
56	718	246-302-1411 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 450 мм	шт.	1	66 403	66 403
57	719	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 662	23 662
58	720	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43 952	43 952
59	721	1120-2601-0401 РСНБ РК 2022	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1	55 590	55 590
60	722	СТРСНБ РК 2022	Канальный электрический нагреватель диаметром 160мм, наружного монтажа, N±3кВт	шт.	1	40 943	40 944
61	723	6118-0203-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных периметр до 2400 мм	шт.	1	11 858	11 858
62	724	246-302-1519 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 450 мм	шт.	1	66 316	66 316
63	725	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	2	32 903	65 806
64	727	6118-0101-0415 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	м2	15.39	8 743	134 555
65	728	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4.9	775	3 798

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	729	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	15.4	5 438	83 745
67	730	234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	16.94	5 004	84 768
			Итого по подразделу: РСистема вентиляции ДП2				**1 022 226**
			Подраздел: РСистема вентиляции ДП3				
68	731	6118-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т	шт.	1	39 913	39 913
69	732	514-103-0317 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения осевой объемный типоразмерами 400-710 AXF-450- B-3/2-G P	шт.	1	251 517	251 517
70	733	246-309-0104 РСНБ РК 2022	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 450-го типоразмера	шт.	1	62 462	62 462
71	734	246-301-0305 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 450 мм/Зонт для крышного вентилятора	шт.	1	21 921	21 921
72	735	6118-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных диаметр до 560 мм	шт.	1	7 778	7 778
73	736	246-302-1411 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 450 мм	шт.	1	66 403	66 403
74	737	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 662	23 662
75	738	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый K 160	шт.	1	43 952	43 952
76	739	1120-2601-0401 РСНБ РК 2022	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1	55 590	55 590
77	740	СТРСНБ РК 2022	Канальный электрический нагреватель диаметром 160мм, наружного монтажа, N±3кВт	шт.	1	40 943	40 944
78	741	6118-0203-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных периметр до 2400 мм	шт.	1	11 858	11 858
79	742	246-302-1519 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 700х400 мм/ 700х250 мм	шт.	1	66 316	66 316
80	743	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	2	32 903	65 806

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	745	6118-0101-0415 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	м2	22.23	8 743	194 357
82	746	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	7.1	775	5 503
83	747	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	22.2	5 438	120 723
84	748	234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	24.42	5 004	122 198
			Итого по подразделу: РСистема вентиляции ДП3				**1 200 904**
			Подраздел: РСистема вентиляции ДПЕ1				
85	749	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	2	32 903	65 806
86	751	6118-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 м2.	шт.	1	8 987	8 987
87	752	246-304-0969 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм	шт.	1	54 500	54 500
			Итого по подразделу: РСистема вентиляции ДПЕ1				**129 293**
			Подраздел: РСистема вентиляции ДПЕ2				
88	753	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	2	32 903	65 806
89	755	6118-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 м2.	шт.	1	8 987	8 987
90	756	246-304-0969 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм	шт.	1	54 500	54 500
			Итого по подразделу: РСистема вентиляции ДПЕ2				**129 293**
			Итого по разделу: Приточная установка П8				**7 711 569**
			Раздел: Теплоснабжение приточных установок				
91	757	6116-0501-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т	шт.	2	111 143	222 286
92	760	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	18	1 883	33 894

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	761	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм/ до 65 мм	шт.	14	9 490	132 860
94	762	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 530	45 540
95	763	242-202-0106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	47 006	94 012
96	764	242-202-0107 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	36 406	145 624
97	765	242-202-0108 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	8	72 852	582 816
98	766	6116-0605-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	2	7 438	14 876
99	767	242-404-0307 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	59 755	119 510
100	768	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм/ до 65 мм	шт.	4	9 490	37 960
101	769	242-304-1103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	4	75 365	301 460
102	770	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	5	1 959	9 795
103	771	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5	5 565	27 825
104	772	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	10.8	2 259	24 397
105	773	241-101-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	10.8	1 434	15 486
106	774	6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	30.5	4 050	123 525
107	775	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	256.7	4 674	1 199 816

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
108	776	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	39.8	5 184	206 323
109	777	6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	28.1	5 184	145 670
110	778	6114-0102-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	35.2	6 984	245 837
111	779	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	30.5	1 731	52 796
112	780	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	256.7	2 301	590 667
113	781	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	39.8	2 706	107 699
114	782	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	28.1	3 789	106 471
115	783	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	35.2	4 780	168 256
116	786	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	401.1	1 638	657 002
117	787	234-303-1008 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	13.068	988	12 911
118	788	234-303-1010 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	36.905	1 274	47 017
119	789	234-303-1012 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	310.607	1 587	492 933
120	790	234-303-1013 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	48.158	1 987	95 690
121	791	234-303-1014 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	34.001	3 018	102 615
122	792	234-303-1516 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 133 мм	м	42.592	14 128	601 740

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	793	234-304-2703 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	27	5 106	137 862
124	794	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	266.8	708	188 894
125	795	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	120.1	512	61 491
126	796	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	109.2	270	29 484
			Итого по разделу: Теплоснабжение приточных установок				**7 183 041**
			Раздел: Воздушно-тепловая завеса				
127	818	6118-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	5	44 854	224 270
128	819	245-901-0501 СпрСЦ 04.2024	Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений E100 (АС), с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 м3/ч	комплект	5	210 487	1 052 435
			Итого по разделу: Воздушно-тепловая завеса				**1 276 705**
			Итого по локальной смете: Отопление, вентиляция				**19 901 907**
			ИТОГО по акту:				**19 901 907**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (%.3f%%) (9.400%)	16509833.000 x 9.40%	1 551 924
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	19901907.000 + 1551924.239	21 453 831
	Сметная прибыль, (5.00%)	18061757.239 x 5.00%	903 087
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	21453831.239 x 5.000%	1 072 691
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		23 429 610
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557	23429610.663 x 1.0557	24 734 639
	НДС (12%)	24734639.977 x 12%	2 968 156
	Итого с НДС	24734639.977 + 2968156.797	27 702 796

Лист согласования
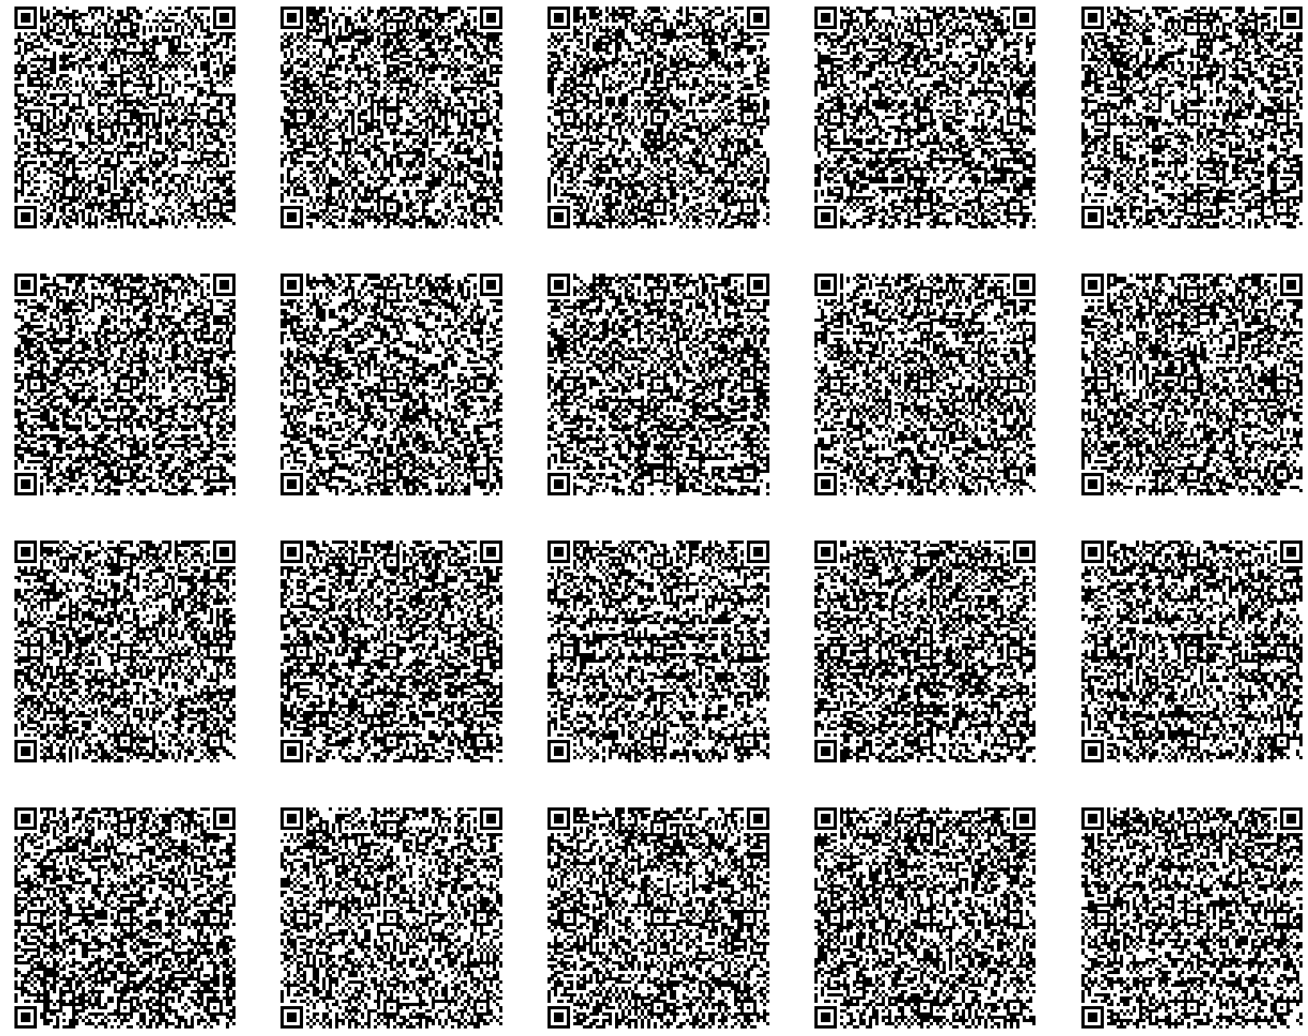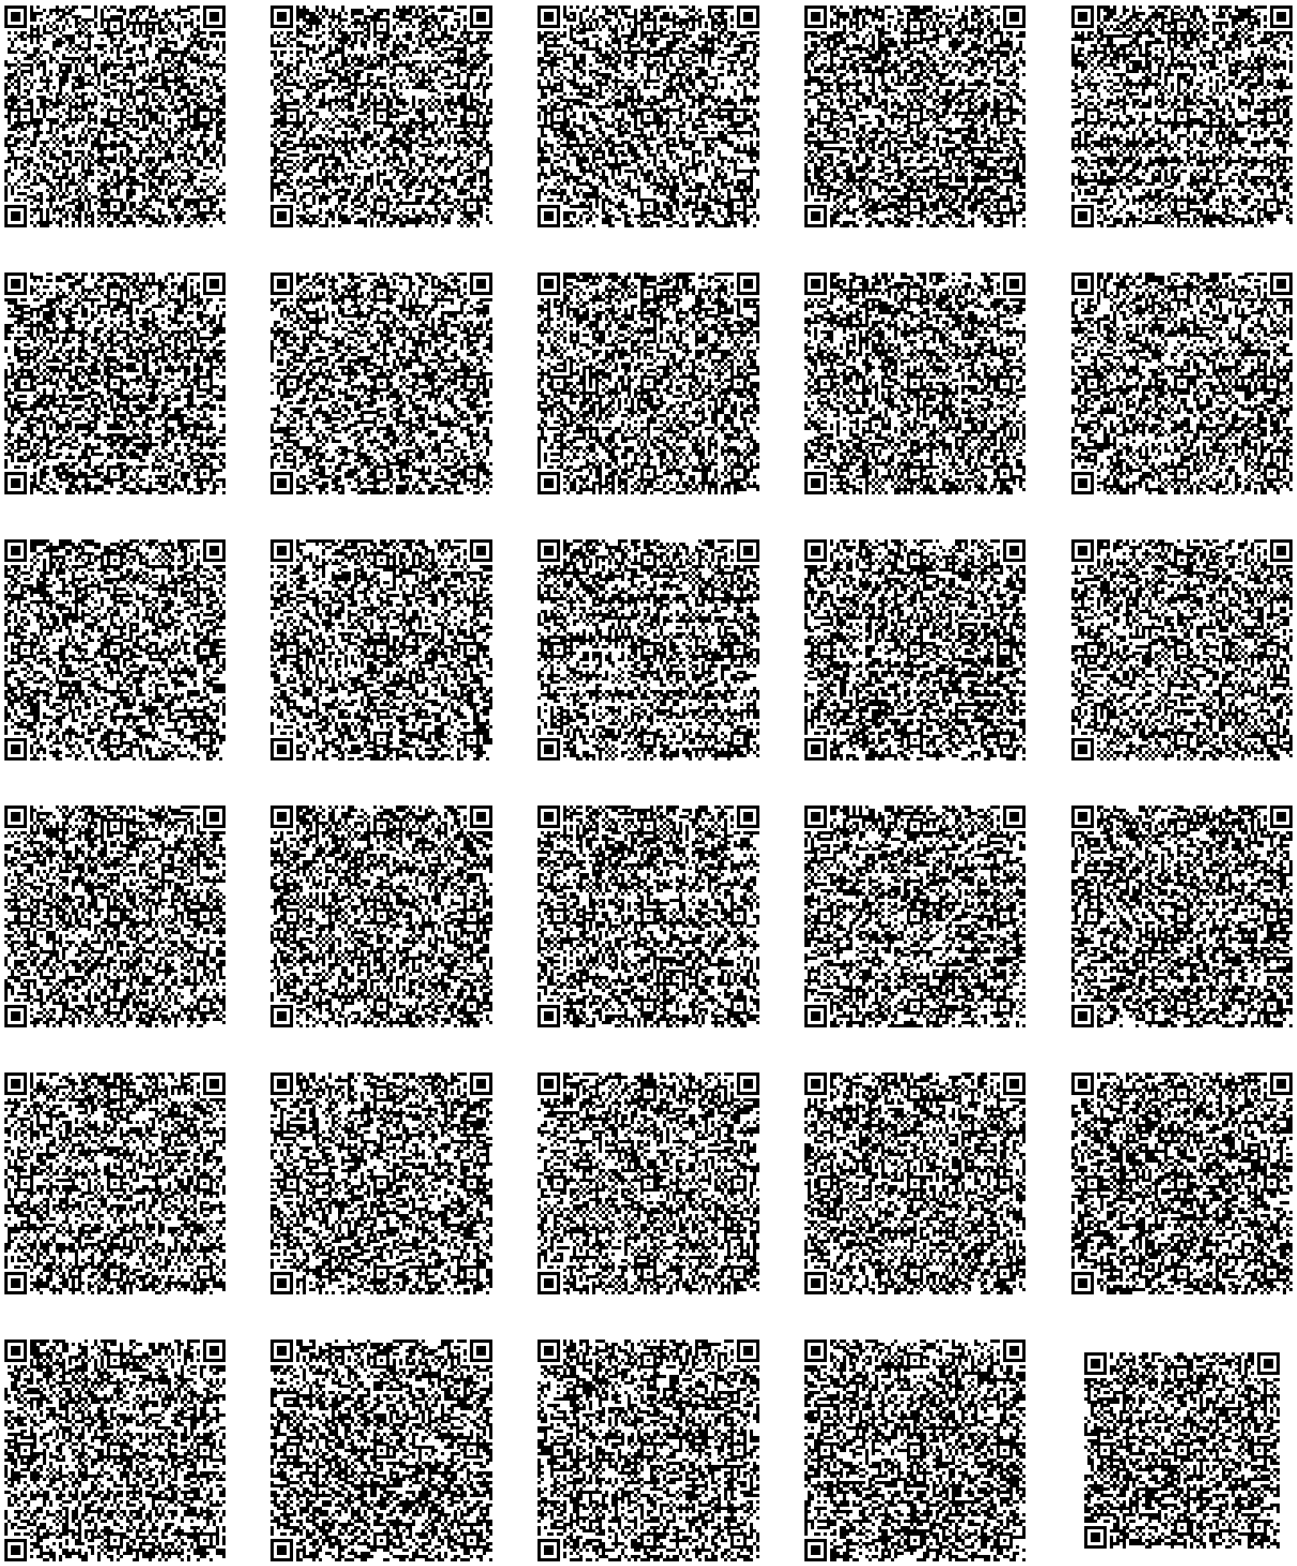
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	11.03.2025 18:55
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	12.03.2025 13:55
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	11.03.2025 21:46
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	18.03.2025 15:16
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	14.03.2025 17:20
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	14.03.2025 20:34 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	13.03.2025 08:09 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
