Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **010240000335 - ТОО "ПРОМКОМПЛЕКТ-Б"**

Стройка: **Строительство школы в селе Узынагаш Узынагашского сельского округа Жамбылского района, Алматинской области на 1500 мест**

Договор подряда (контракт) №: **313 от 19.10.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания				
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип 2				
1	2069	6109-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм	м2	224.76	7 228	1 624 565
2	2070	6109-0202-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203	м2	224.76	10 255	2 304 914
			Итого по подразделу: Тип 2				**3 929 479**
			Подраздел: Тип 3				
3	2079	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	1070.58	2 094	2 241 795
4	2080	233-101-0106РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1091.9916	3 354	3 662 540
			Итого по подразделу: Тип 3				**5 904 335**
			Подраздел: Тип 4				
5	2089	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	110.65	2 094	231 700
6	2090	233-101-0105РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	112.863	5 214	588 468
			Итого по подразделу: Тип 4				**820 169**
			Подраздел: Тип 5				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	2099	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	186.65	2 094	390 845
8	2100	233-101-0409СпрСЦ 02.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гомогенный электростатический, толщиной 2 мм и защитным слоем 2 мм, класс 34, 43 типа GRABO Conducto S	м2	190.383	24 403	4 645 916
			Итого по подразделу: Тип 5				**5 036 761**
			Подраздел: Полы по грунту, л.АР-63, прим.1				
9	2115	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	980.55	2 094	2 053 272
10	2116	233-101-0114СпрСЦ 02.2024	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 1 мм, класс 23, 34, 43 типа Bigfoot	м2	1000.161	7 235	7 236 165
			Итого по подразделу: Полы по грунту, л.АР-63, прим.1				**9 289 437**
			Подраздел: Тип 2				
11	2182	6109-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм	м2	14.9	7 228	107 697
12	2183	6109-0202-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203	м2	14.9	10 255	152 800
			Итого по подразделу: Тип 2				**260 497**
			Подраздел: Тип 3/2				
13	2192	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	1418.12	2 094	2 969 542
14	2193	233-101-0106РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1446.4824	3 354	4 851 502
			Итого по подразделу: Тип 3/2				**7 821 045**
			Подраздел: Тип 4				
15	2202	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	59.24	2 094	124 048
16	2203	233-101-0105РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	60.4248	5 214	315 055
			Итого по подразделу: Тип 4				**439 104**
			Подраздел: Тип 4/2				
17	2212	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	265.45	2 094	555 852
18	2213	233-101-0105РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	270.759	5 214	1 411 737
			Итого по подразделу: Тип 4/2				**1 967 589**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Тип 5				
19	2222	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	37.7216	2 094	78 988
20	2223	233-101-0409СпрСЦ 02.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гомогенный электростатический, толщиной 2 мм и защитным слоем 2 мм, класс 34, 43 типа GRABO Conducto S	м2	38.476032	24 403	938 930
			Итого по подразделу: Тип 5				**1 017 919**
			Подраздел: Тип 5/2				
21	2232	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	360.546	2 094	754 983
22	2233	233-101-0409СпрСЦ 02.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гомогенный электростатический, толщиной 2 мм и защитным слоем 2 мм, класс 34, 43 типа GRABO Conducto S	м2	367.75692	24 403	8 974 372
			Итого по подразделу: Тип 5/2				**9 729 355**
			Подраздел: Тип 6/2				
23	2242	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	167.09	2 094	349 886
24	2243	233-101-0114СпрСЦ 02.2024	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 1 мм, класс 23, 34, 43 типа Bigfoot	м2	170.4318	7 235	1 233 074
			Итого по подразделу: Тип 6/2				**1 582 960**
			Подраздел: Тип 13				
25	2290	6109-0307-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из паркетных досок	м2	54.98	7 288	400 694
26	2291	215-301-0807РСНБ РК 2022	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм	м2	112.1592	6 053	678 900
27	2292	233-201-1005СпрСЦ 02.2024	Система спортивного паркета трехслойная, общая толщина 28 мм типа GRABO SmartFit	м2	56.0796	50 967	2 858 209
28	2293	236-104-0502РСНБ РК 2022	Клей под покрытия двухкомпонентный из полиуретана для паркета	кг	35.737	2 591	92 595
			Итого по подразделу: Тип 13				**4 030 398**
			Подраздел: Тип 3				
29	2312	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	45.87	2 094	96 052
30	2313	233-101-0106РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	46.7874	3 354	156 925
			Итого по подразделу: Тип 3				**252 977**
			Подраздел: Тип 3/2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	2322	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	1391.01	2 094	2 912 775
32	2323	233-101-0106РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1418.8302	3 354	4 758 756
			Итого по подразделу: Тип 3/2				**7 671 531**
			Подраздел: Тип 4				
33	2332	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	40.88	2 094	85 603
34	2333	233-101-0105РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	41.6976	5 214	217 411
			Итого по подразделу: Тип 4				**303 014**
			Подраздел: Тип 4/2				
35	2342	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	173.17	2 094	362 617
36	2343	233-101-0105РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	176.6334	5 214	920 967
			Итого по подразделу: Тип 4/2				**1 283 585**
			Подраздел: Тип 5				
37	2352	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	19.001	2 094	39 788
38	2353	233-101-0409СпрСЦ 02.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гомогенный электростатический, толщиной 2 мм и защитным слоем 2 мм, класс 34, 43 типа GRABO Conducto S	м2	19.38102	24 403	472 955
			Итого по подразделу: Тип 5				**512 743**
			Подраздел: Тип 5/2				
39	2362	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	142.2819	2 094	297 938
40	2363	233-101-0409СпрСЦ 02.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гомогенный электростатический, толщиной 2 мм и защитным слоем 2 мм, класс 34, 43 типа GRABO Conducto S	м2	145.127538	24 403	3 541 547
			Итого по подразделу: Тип 5/2				**3 839 485**
			Подраздел: РПлинтус, л.АР-62				
41	2408	6109-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса деревянного	м	16.52	374	6 178
42	2409	233-204-0103РСНБ РК 2022	Плинтус из МДФ	м	16.8504	1 510	25 444

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	2412	6106-0306-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж стального плинтуса из гнутого профиля	м	3839.39	742	2 848 827
44	2413	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	3839.39	1 833	7 037 602
45	2414	6109-0308-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ковровых покрытий на клее из готовых ковров на комнату	м2	58.779	2 862	168 225
46	2415	233-102-0102РСНБ РК 2022	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33	м2	59.95458	3 798	227 707
47	2416	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	325.16	2 094	680 885
48	2417	233-101-0106РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	331.6632	3 354	1 112 398
			Итого по подразделу: РПлинтус, л.АР-62				**12 107 266**
			Итого по разделу: Полы				**77 799 650**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания				**77 799 650**
			ИТОГО по акту:				**77 799 650**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.600%)	77799650.000 x 6.60%	5 134 776
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	77799650.000 + 5134776.826	82 934 426
	Сметная прибыль, 5.00%	82934426.826 x 5.00%	4 146 721
	Непредвиденные расходы, 5.000%	82934426.826 x 5.000%	4 146 721
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		91 227 869
	Сумма к инд за 2024 год, к = 1.0750	91227869.508 x 1.0750	98 069 959
	НДС (12%)	98069959.722 x 12%	11 768 395
	Итого с НДС	98069959.722 + 11768395.167	109 838 354

Лист согласования
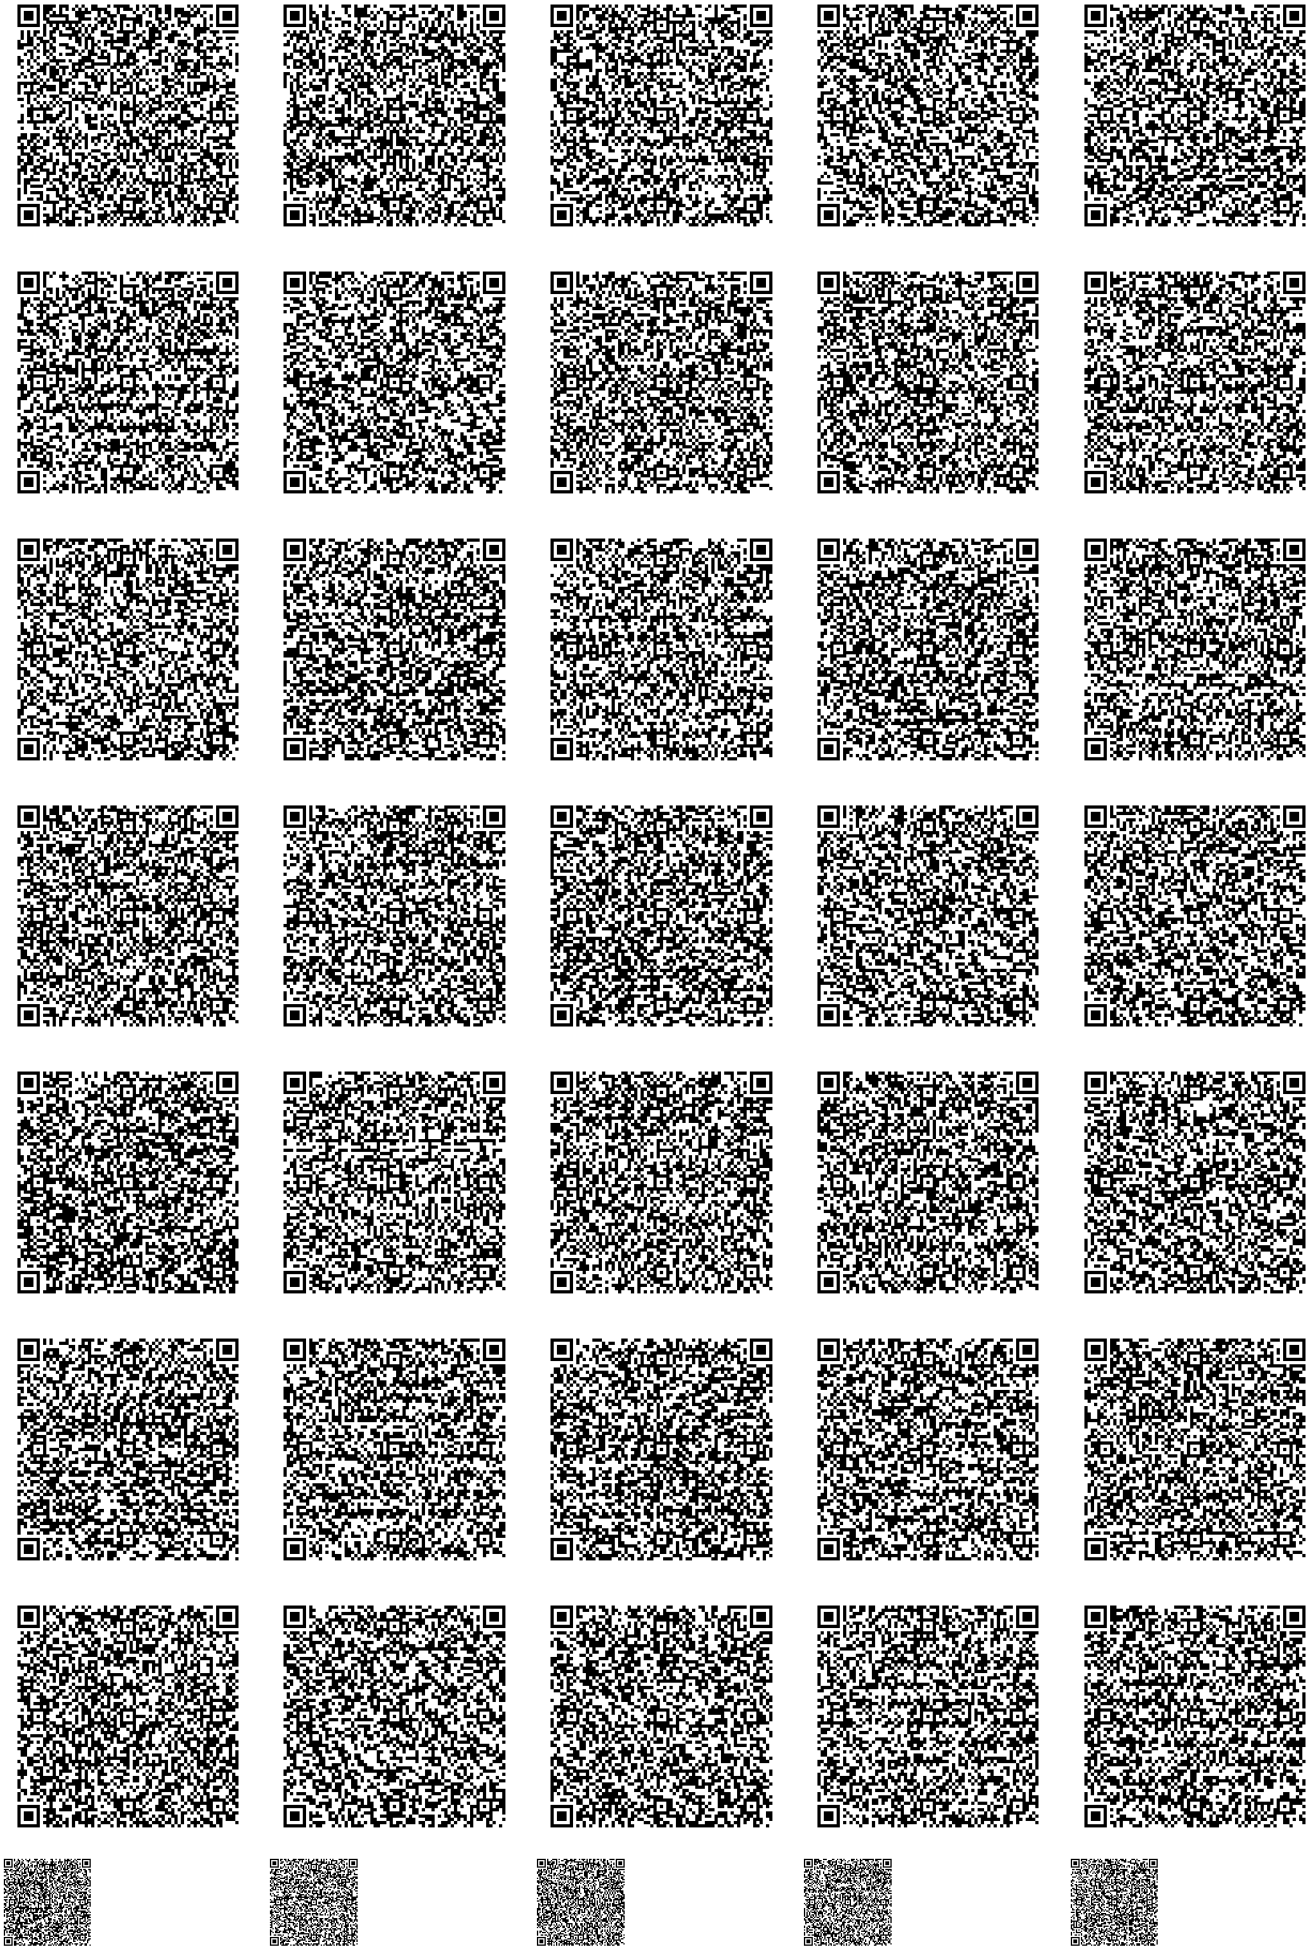
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
601115300767 - СЛЯМГАЛИЕВ БЕРИККАН РАХЫМКАНОВИЧ	Генеральный директор	03.12.2024 08:49
Представители технического надзора		
650801303509 - ОМАРОВ СЕРИК ИЛЕСБЕКОВИЧ	Технический Надзор	09.12.2024 04:39
Представители авторского надзора		
790818300238 - ОСПАНОВ НУРЛАН АЗИМОВИЧ	Авторский надзор	03.12.2024 16:31
Представители заказчика		
840322300709 - АНУАРБЕКОВ АСЕТ АНУАРБЕКОВИЧ	Ведущий специалист	09.12.2024 05:28
960501300895 - ТҰРЫСБЕК МЕДЕТ БЕЙБІТЖАНҰЛЫ	Ведущий специалист ПТО	09.12.2024 10:03 Комментарий: объемы не превышает
920702300583 - САБИТОВ АЯТ САБИТҰЛЫ	Директор регионального подразделения	13.12.2024 09:56
880713402398 - КАСКАРАУОВА АЙГЕРИМ КАЙЫРГАЛИЕВНА	Ведущий специалист Сметчик	12.12.2024 05:31 Комментарий: расценки верны
800606301684 - АМАНОВ ЕРЛАН КУРАДОВИЧ	ведущий специалист	09.12.2024 06:32
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	начальник отдела смет и ценообразования	12.12.2024 13:36 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
