Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **010240000335 - ТОО "ПРОМКОМПЛЕКТ-Б"**

Стройка: **Строительство школы в селе Узынагаш Узынагашского сельского округа Жамбылского района, Алматинской области на 1500 мест**

Договор подряда (контракт) №: **313 от 19.10.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания				
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип 1/2а				
1	2001	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	13.032	6 547	85 320
2	2002	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	13.29264	3 632	48 278
			Итого по подразделу: Тип 1/2а				**133 599**
			Подраздел: Тип 1/4				
3	2040	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	1.293	6 547	8 465
4	2041	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	1.31886	3 632	4 790
			Итого по подразделу: Тип 1/4				**13 255**
			Подраздел: Тип 1/5				
5	2049	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	1.498	6 547	9 807
6	2050	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	1.52796	3 632	5 549
			Итого по подразделу: Тип 1/5				**15 357**
			Подраздел: Тип 1/6				
7	2059	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	0.254	6 547	1 662
8	2060	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	0.25908	3 632	940
			Итого по подразделу: Тип 1/6				**2 603**
			Подраздел: Тип 7				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	2125	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	221.155	6 547	1 447 901
10	2126	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	225.5781	3 632	819 299
			Итого по подразделу: Тип 7				**2 267 201**
			Подраздел: Тип 8				
11	2137	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	59.175	6 547	387 418
12	2138	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	60.3585	3 632	219 222
			Итого по подразделу: Тип 8				**606 640**
			Подраздел: Тип 9				
13	2147	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	11.717	6 547	76 711
14	2148	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	11.95134	3 632	43 407
			Итого по подразделу: Тип 9				**120 118**
			Подраздел: Тип 12. Лестничные площадки и марши				
15	2173	6109-0306-0602ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	29.581	10 909	322 699
16	2174	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	38.95993	3 632	141 502
			Итого по подразделу: Тип 12. Лестничные площадки и марши				**464 201**
			Подраздел: Тип 7				
17	2248	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	23.88158	6 547	156 352
18	2249	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	24.3592116	3 632	88 472
			Итого по подразделу: Тип 7				**244 825**
			Подраздел: Тип 7/2				
19	2258	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	127.93089	6 547	837 563
20	2259	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	130.4895078	3 632	473 937
			Итого по подразделу: Тип 7/2				**1 311 501**
			Подраздел: Тип 8				
21	2266	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	21.453	6 547	140 452
22	2267	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	21.88206	3 632	79 475
			Итого по подразделу: Тип 8				**219 928**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Тип 1/3				
23	2302	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	3.138	6 547	20 544
24	2303	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	3.20076	3 632	11 625
			Итого по подразделу: Тип 1/3				**32 169**
			Подраздел: Тип 7				
25	2368	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	16.497	6 547	108 005
26	2369	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	16.82694	3 632	61 115
			Итого по подразделу: Тип 7				**169 121**
			Подраздел: Тип 7/2				
27	2378	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	11.0892	6 547	72 600
28	2379	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	11.310984	3 632	41 081
			Итого по подразделу: Тип 7/2				**113 682**
			Подраздел: Тип 8				
29	2386	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	14.507	6 547	94 977
30	2387	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	14.79714	3 632	53 743
			Итого по подразделу: Тип 8				**148 720**
			Подраздел: Тип 7				
31	2406	6109-0306-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	1.507	6 547	9 866
32	2407	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	1.53714	3 632	5 582
			Итого по подразделу: Тип 7				**15 449**
			Подраздел: РПлинтус, л.АР-62				
33	2410	6109-0401-0402ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из керамогранита	м	283.948	1 347	382 477
34	2411	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	28.3769916	3 632	103 065
			Итого по подразделу: РПлинтус, л.АР-62				**485 543**
			Итого по разделу: Полы				**6 363 919**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания				**6 363 919**
			ИТОГО по акту:				**6 363 919**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.600%)				6363919.674 x 6.60%	420 018

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				6363919.674 + 420018.692	6 783 938
		Сметная прибыль, 5.00%				6783938.366 x 5.00%	339 196
		Непредвиденные расходы, 5.000%				6783938.366 x 5.000%	339 196
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					7 462 332
		Сумма к инд за 2024 год, к = 1.0557				7462332.203 x 1.0557	7 877 984
		НДС (12%)				7877984.107 x 12%	945 358
		Итого с НДС				7877984.107 + 945358.093	8 823 342

Лист согласования
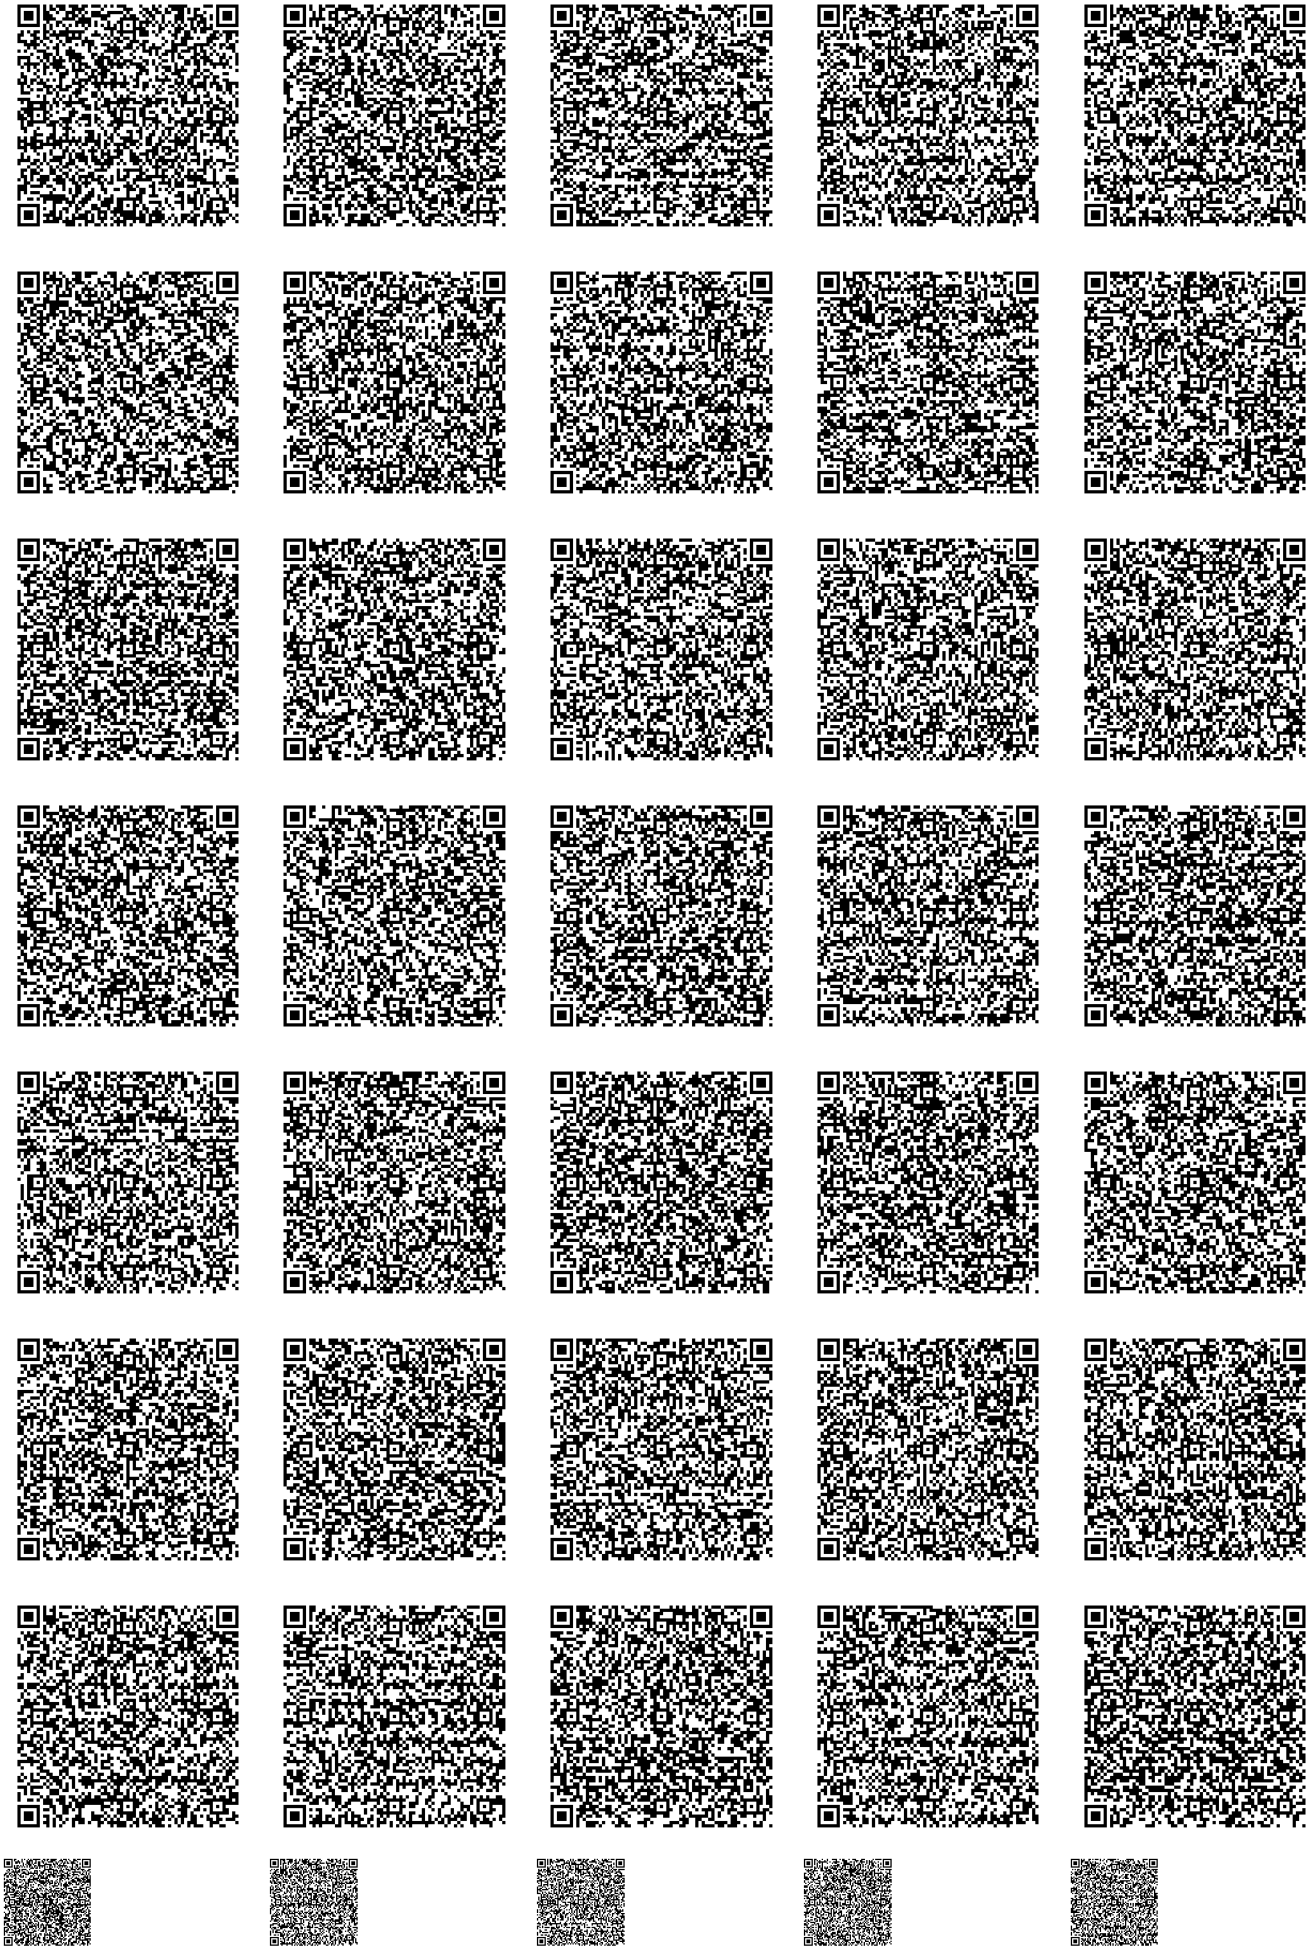
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
601115300767 - СЛЯМГАЛИЕВ БЕРИККАН РАХЫМКАНОВИЧ	Генеральный директор	03.12.2024 08:49
Представители технического надзора		
650801303509 - ОМАРОВ СЕРИК ИЛЕСБЕКОВИЧ	Технический Надзор	09.12.2024 04:40
Представители авторского надзора		
790818300238 - ОСПАНОВ НУРЛАН АЗИМОВИЧ	Авторский надзор	03.12.2024 16:30
Представители заказчика		
920702300583 - САБИТОВ АЯТ САБИТҰЛЫ	Директор регионального подразделения	13.12.2024 09:55
880713402398 - КАСКАРАУОВА АЙГЕРИМ КАЙЫРГАЛИЕВНА	Ведущий специалист Сметчик	12.12.2024 05:09 Комментарий: расценки верны
800606301684 - АМАНОВ ЕРЛАН КУРАДОВИЧ	ведущий специалист	09.12.2024 06:29
960501300895 - ТҰРЫСБЕК МЕДЕТ БЕЙБІТЖАНҰЛЫ	Ведущий специалист ПТО	09.12.2024 10:01 Комментарий: объемы не превышает
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	начальник отдела смет и ценообразования	12.12.2024 13:21 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
840322300709 - АНУАРБЕКОВ АСЕТ АНУАРБЕКОВИЧ	Ведущий специалист	09.12.2024 05:26
