Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабря 2024 года

Заказчик ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», руководитель Галеев Кайрола Тюлюевич, БИН030140002400, 150000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.: 87152462231;***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от «30» декабря 2024 года, ТОО «Севимсталькон», директор Газдиев Султанбек Мустафаевич, Лицензия II категория, №24036482 от 27.12.2024 г. III категория, №21001368 от 21.01.2021 г. почтовый индекс 150009, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Строительная, 23 а БИН 040940009984, тел. 87152522190***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от «30» декабря 2024 года, ТОО «Alem Construction Group», эксперт по техническому надзору Исаков Еркебулан Сериккалиевич, аттестат аттестат №KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.; № KZ89VJE00023912 от 10.03.2017 г.; № KZ81VJE00081286 от 15.06.2023года., БИН 130440021578, тел. 87073207229***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***от «30» декабря 2024 года, ТОО «Севгражданпроект», Каирбеков Алибек Тоганбекович, аттестат № KZ44VJE00046450 от 13.05.2019; БИН980340001576, тел.: 87152366610***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Петровка, Есильского района СКО "(привязка)(Без наружных инженерных сетей)», новое строительство, уровень ответственности II (нормальный).***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Есильский район с.Петровка, ул.Жаркова, 101А***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «30» декабря 2024 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) ***правоустанавливающего документа на земельный участок КГУ «Аппарат акима Петровского сельского округа Есильского района Северо-Казахстанской области» от «27» февраля 2023 года №06;***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) ***от 2 марта 2023 года №KZ81VUA00849214, выданное КГУ«Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области»***

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области»: KZ18REA00394947 от 04.06.2024 г., KZ05REA00424863 от 14.10.2024 г, KZ14REA00434304 от 27.11.2024 г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***АО КазНИИСА», 000006 от 14.10.2022 г. заказа 158.5***

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденного(й) приказом ***№11 от 18.01.2024 г. КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»***

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***июнь 2024 года***;

окончание работ: ***декабрь 2024 года***;

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4***;

фактически, месяц: ***7***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
мощность	Посещений смену	40		40	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период июнь месяц;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Фельдшерско-акушерский пункт имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	261,8	261,8
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	1472,78	1472,78
В том числе ниже ноля	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Фельдшерско-акушерский пункт предназначен для медицинского обслуживания населения, обеспечивает оказание амбулаторной помощи. Имеет прямоугольную форму с размерами 22,0х12,2м. Высота этажа 3,0м.

Основные конструкции здания:

Фундамент – монолитный ленточный. Наружные стены - из керамического кирпича 510 мм, утеплитель 150 мм. Внутренняя несущая стена - из полнотелого керамического кирпича толщиной 380мм. Внутренние перегородки-из керамического кирпича. Перемычки-железобетонные. Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит 220мм. Кровля-скатная. Из профилированных листов по деревянным стропилам. Дверные блоки- деревянные, металлические; Оконные блоки – из ПВХ профиля. Отмостка – по периметру здания предусмотрена бетонная.

Все помещения объединены вестибюлем и коридорами. Здание имеет два выхода, что удовлетворяет пожарные и санитарные требования.

Все помещения оснащены необходимым медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения в соответствии с минимальным типовым набором. В оснащение кабинетов входит необходимое медицинское оборудование согласно специализации.

Водоснабжение и канализация. Подача воды в систему внутреннего водопровода предусмотрена от существующих наружных водопроводных сетей питьевой воды. Трубопроводы внутреннего водоснабжения В1

монтируются из полиэтиленовых труб. Подводящие трубопроводы В1 монтируются из трубы полиэтиленовой и прокладываются по стенам помещений, а в коридорах - в конструкции пола. Подвод холодной воды В1 производится к санитарным приборам.

Горячее водоснабжение. Источником горячей воды является накопительный водонагреватель на 200 литров, мощностью 2,2 кВт. В процедурном, прививочном и стерилизационном кабинетах предусмотрены электро-водонагреватели непрерывного действия на 30л, мощностью 1,5 кВт. Трубопроводы внутреннего горячего водоснабжения Т3 монтируются из полипропиленовых армированных труб и прокладываются по стенам помещений, а в коридорах - в конструкции пола. Подвод горячей воды Т3 производится к санитарным приборам.

Канализация. Система хоз-бытовой канализации предназначена для сбора и отвода сточной воды от санитарных приборов самотеком в септик. Внутренние сети канализации проектируются из канализационных труб. Трубопроводы канализации Ø50 проложены с уклоном 0,035. Трубопроводы канализации Ø110 проложены с уклоном 0,035. На канализационных стояках установлены ревизии. В Техническом помещений (узел ввода и котельной) предусмотрен приямок для опорожнения. Откачка воды из приямка в помещении ввода осуществляется погружным насосом марки ГНОМ 7-7, производительностью 7м3/час, напором 7м. Выпуск выполнено на отмостку с укладкой отводящего лотка. Вентиляция канализационной сети производится через стояк, вытяжная часть которого выводится через кровлю.

Отопление. Теплоснабжение здания предусмотрено автономное. К установке принят два котла марки ЭВН-К-15 Э2 тепловой мощностью - 15 кВт (каждый), установленных в помещении электро-котельной.

Теплоноситель в системе отопления - вода. Система отопления-запроектирована двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы "РБС-500"(q=165 вт/секц.). Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется терморегуляторами.

Вентиляция. Вентиляция здания с естественным и механическим побуждением. Для притока используются приточные клапаны с фильтрацией наружного воздуха и электро-подогревом в физиотерапевтическом кабинете и аптеке. Вытяжка-естественная и механическая с установкой настенных и потолочных Вентиляторы энергосберегающие, оборудованы регуляторами скорости для более точного регулирования параметров расхода и напора.

Автоматическая пожарная сигнализация

Настоящий проект предусматривает установку пожарной сигнализации, звукового и светового оповещения людей о пожаре.В качестве аппаратуры обнаружения возгорания приняты извещатели дымовые ИП 212-141 и тепловые извещатели ИП 105-1А-А1.При визуальном обнаружении возгорания предусмотрены ручные пожарные извещатели ИПР 513-10.В качестве аппаратуры приема сигналов о возгорании пожара принята приемно- контрольный прибор «Гранит-4».

Телефонизация и передача данных. Проектом предусматривается структурированная кабельная система медпункта. Компьютерные розетки устанавливаются в справочная с аптечным пунктом, кабинет среднего медперсонала, кабинет акушерского приема. Активное и пассивное оборудование структурированной кабельной системы расположено в шкафу ШСКС-1 в справочная с аптечным пунктом.

Подключение к внешней сети телефонизации и сети интернет осуществляется от оптической муфты. Абонентская распределительная сеть выполняется кабелем типа «витая пара» UTP 4x2x0,5.

Видеонаблюдение. Купольные видеокамеры внутреннего исполнения устанавливаются: на коридоре. На наружных стенах входной группы установлены видеокамеры уличного исполнения.

Система вызова пациента в кабинет. Для вызова пациента в кабинет врача целесообразно применять световую или звуковую сигнализацию.

Электроосвещение. В проекте принято рабочее освещение на напряжение 220 В. Светильники запроектированы светодиодные, выбранные в зависимости от назначения, характера среды и архитектурно-строительных особенностей помещений.

Проектом предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное) и аварийное (безопасности) освещение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектной-сметной документации): всего 223,512 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 155,230 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 35,212 млн. тенге, прочие затраты – 33,070 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 209,029 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 152,125 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 34,508 млн. тенге, прочие затраты – 32,409 млн. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95,32% и применено 95,32% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - нормальный (С);

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Петровка, Есильского района СКО "(привязка)(Без наружных инженерных сетей)»принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»

Галеев Кайрола Тюлюевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аккредитованная организация **ТОО «Alem Construction Group», Исаков Еркебулан Сериккалиевич**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный эксперт **Исаков Еркебулан Сериккалиевич**, аттестат №KZ83VJE00024699 от 30.03.2017 г.; № KZ89VJE00023912 от 10.03.2017г.;№KZ81VJE00081286 от 15.06.2023года

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) организация **ТОО «Севгражданпроект» директор Бралин Куаныш Еркенович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный эксперт **Каирбеков Алибек Тоганбекович** аттестат № KZ44VJE00046450 от 13.05.2019

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**

Газдиев Султанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Петровка, Есильского района Северо-Казахстанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**1**	**-**	**23**	**344.92**	**1472.78**	**261.8**	**-**	**233.55**	**-**	**-**

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	Газо снабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ростверк, ФБС	**кирпичные**	**Односкатная, профлист**	**электрокотел**	**В проекте принято рабочее освещение на напряжение 220 В**	**Трубопроводы внутреннего водоснабжения В1 монтируются из полиэтиленовых труб НДПЭ 100 SDR11 по ГОСТ 18599-2001. Подводящие трубопроводы В1 монтируются из трубы полиэтиленовой «питьвой» НДПЭ 100 SDR11 Ø20х2 (Ø15) по ГОСТ 18599-2001 и прокладываются по стенам помещений, а в коридорах - в конструкции пола. Подвод холодной воды В1 производится к санитарным приборам.**	**Источником горячей воды является накопительный водонагреватель на 200 литров, мощностью 2,2 кВт. В процедурном кабинете предусмотрен электро-водонагреватель непрерывного действия на 30л, мощностью 1,5 кВт.**	**Система хоз-бытовой канализации предназначена для сбора и отвода сточной воды от санитарных приборов самотеком в септик.**	**-**

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного	В общежитиях	В гостиницах

			типа		
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	-	-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	**138,68**	-	-	-	-	-
-	-	-	**94,87**	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы **одноэтажное**

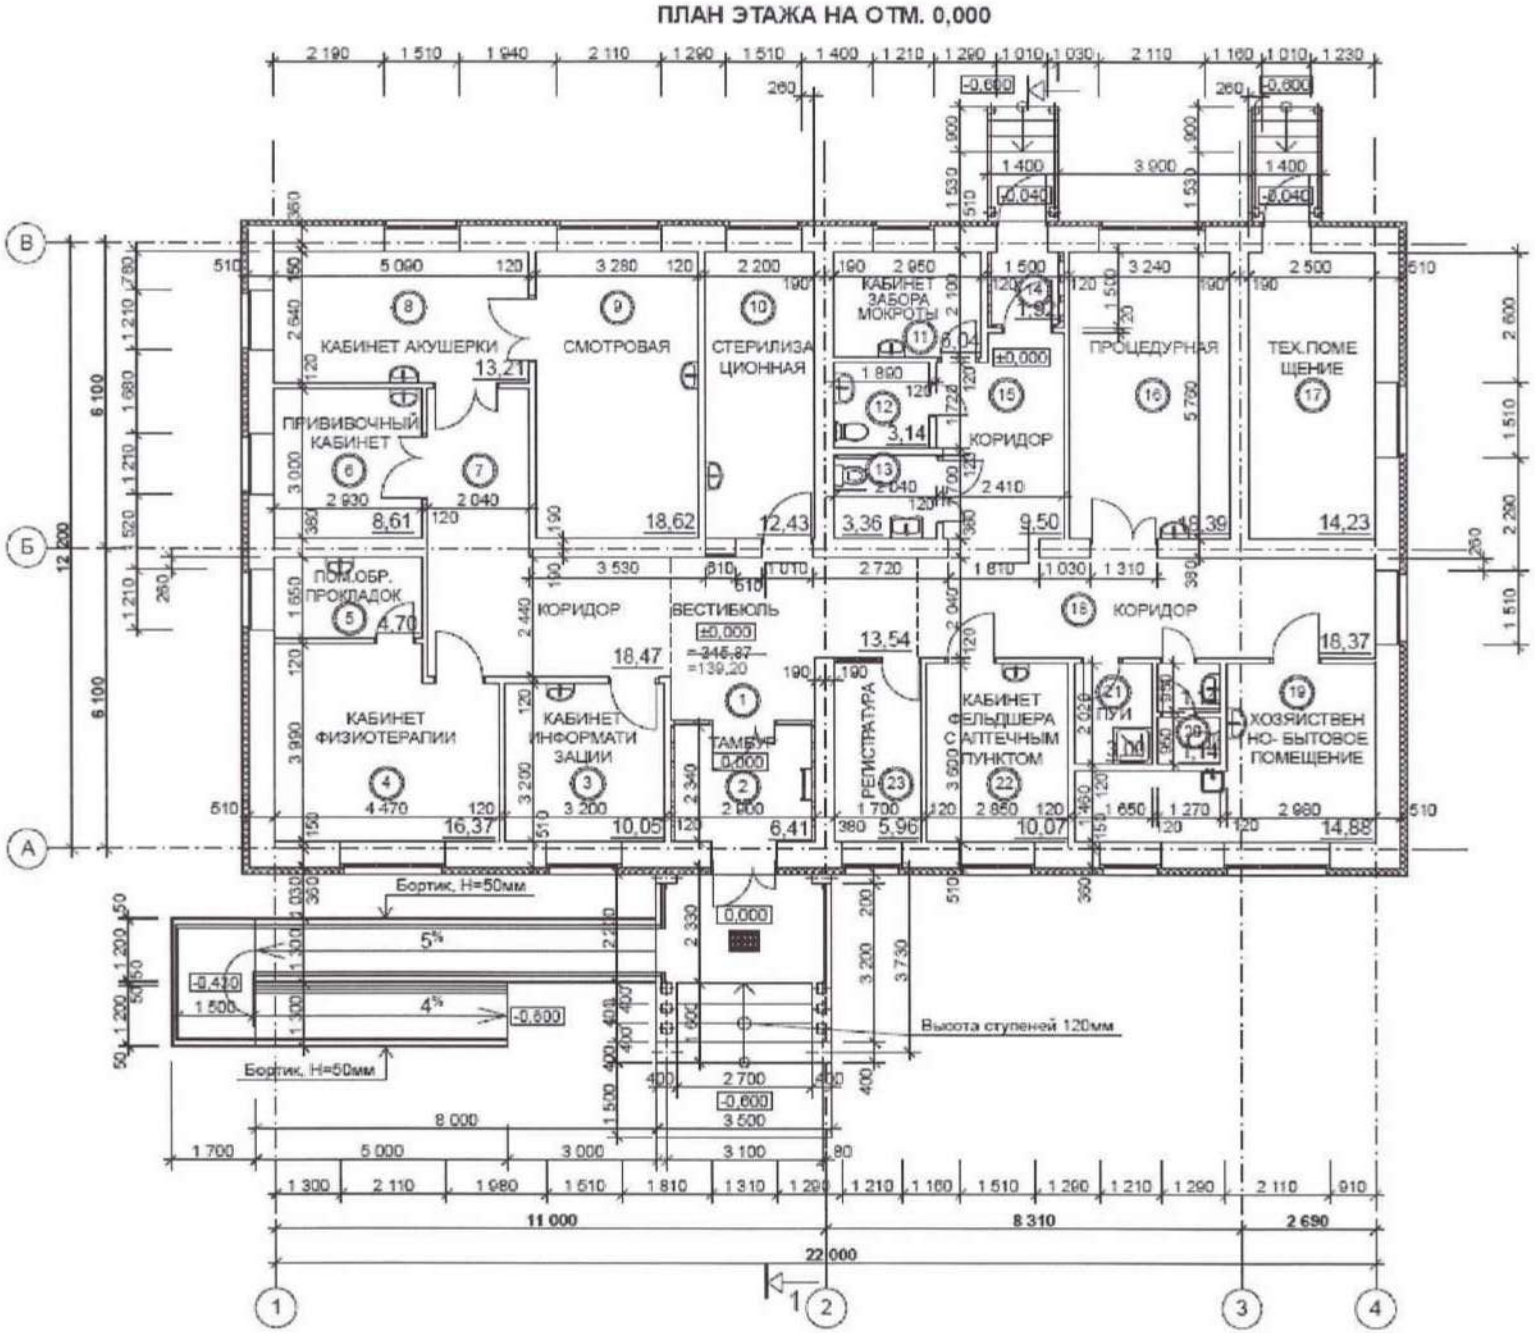

2. Экспликация к поэтажным планам **23 помещений**

Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь, м2
1	Вестибюль	13,54
2	Тамбур	6,41
3	Кабинет информатизации	10,05
4	Кабинет физиотерапии	16,37
5	Помещение обработки прокладок	4,70
6	Прививочный кабинет	8,61
7	Коридор	18,47
8	Кабинет акушерки	13,21
9	Смотровая	18,62
10	Стерилицационная	12,43
11	Кабинет забора мокроты	6,04
12	Санузел	3,14
13	Санузел МГН	3,36
14	Тамбур	1,92
15	Коридор	9,50
16	Процедурная	18,39
17	Техническое помещение	14,23
18	Коридор	18,37
19	Хозяйственно-бытовое помещение	14,88
20	Санузел	2,28
21	Помещение уборочного инвентаря	3,00
22	Кабинет фельдшеры с аптечным пунктом	10,07
23	Регистратура	5,96

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
0,2761 га	**261.8**	**261.8**	-	-	**510**	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-				-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	-	**Вестибюль**	**13,54**			**13,54**
1	**2**	-	**Тамбур**	**6,41**			**6,41**
1	**3**	-	**Кабинет информатизации**	**13,54**			**13,54**
1	**4**	-	**Кабинет физиотерапии**	**16,37**			**16,37**
1	**5**	-	**Помещение обработки прокладок**	**4,70**			**4,70**
1	**6**	-	**Прививочный кабинет**	**8,61**			**8,61**
1	**7**	-	**Коридор**	**18,47**			**18,47**
1	**8**	-	**Кабинет акушерки**	**13,21**			**13,21**
1	**9**	-	**Смотровая**	**18,62**			**18,62**
1	**10**	-	**Стерилицационная**	**12,43**			**12,43**
1	**11**	-	**Кабинет забора мокроты**	**6,04**			**6,04**
1	**12**	-	**Санузел**	**3,14**			**3,14**
1	**13**	-	**Санузел МГН**	**3,36**			**3,36**
1	**14**	-	**Тамбур**	**1,92**			**1,92**
1	**15**	-	**Коридор**	**9,50**			**9,50**
1	**16**	-	**Процедурная**	**18,39**			**18,39**
1	**17**	-	**Техническое помещение**	**14,23**			**14,23**
1	**18**	-	**Коридор**	**18,37**			**18,37**
1	**19**	-	**Хозяйственно-бытовое помещение**	**14,88**			**14,88**

1	20	-	Санузел	2,28			2,28
1	21	-	Помещение уборочного инвентаря	3,00			3,00
1	22	-	Кабинет фельдшеры с аптечным пунктом	10,07			10,07
1	23	-	Регистратура	5,96			5,96

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	**233.55**	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		**ростверк, ФБС**
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		**кирпичные**
	2) перегородки		**кирпичные**
3	Перекрытия	чердачное	**плиты покрытия многопустотные**
		междуэтажное	-
4	Крыша		**односкатная . из профилированных листов по деревянным стропилам**
5	Полы	1-го этажа	**грунт основания с втрамбованным щебнем фракцией - 40-60 мм, подстилающий слой из бетона класса С8/10, стяжка из ц/п раствора, чистовой пол (линолеум, плитка, наливной пол)**
		последующих этажей	-
6	Проемы	окна	**из ПВХ**
		двери	**деревянные, металлические**
7	Отделочные работы	внутренние	**штукатурка, чистовая отделка (выравнивание сухими смесями и покраска, облицовка плитками)**
		наружные	**утеплитель, штукатурка по сетке, покраска**
8	Горячее водоснабжение		**источником горячей воды является накопительный водонагреватель**
9	Водопровод		**полиэтиленовые трубы диаметром 20-32мм**

10	Канализация			**трубопроводы канализации Ø50, Ø110 самотеком в септик**
11	Электроосвещение			**принято рабочее освещение на напряжение 220 В. Светильники запроектированы светодиодные, выбранные в зависимости от назначения, характера среды и архитектурно-строительных особенностей помещений**
12	Отопление	печное		-
13		печное газовое		-
14		от ТЭЦ		-
15		от АГВ		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	-
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			**Электрокотлы 2 шт**

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Площадь (м 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота строения (м)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем строения (м 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундамент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перекрытия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Крыша	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Печи	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя	крыша	дополнительные

	подвала				отделка		устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
наружные		-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
