Стройгенплан

И.о. руководителя аппарата
[illegible]

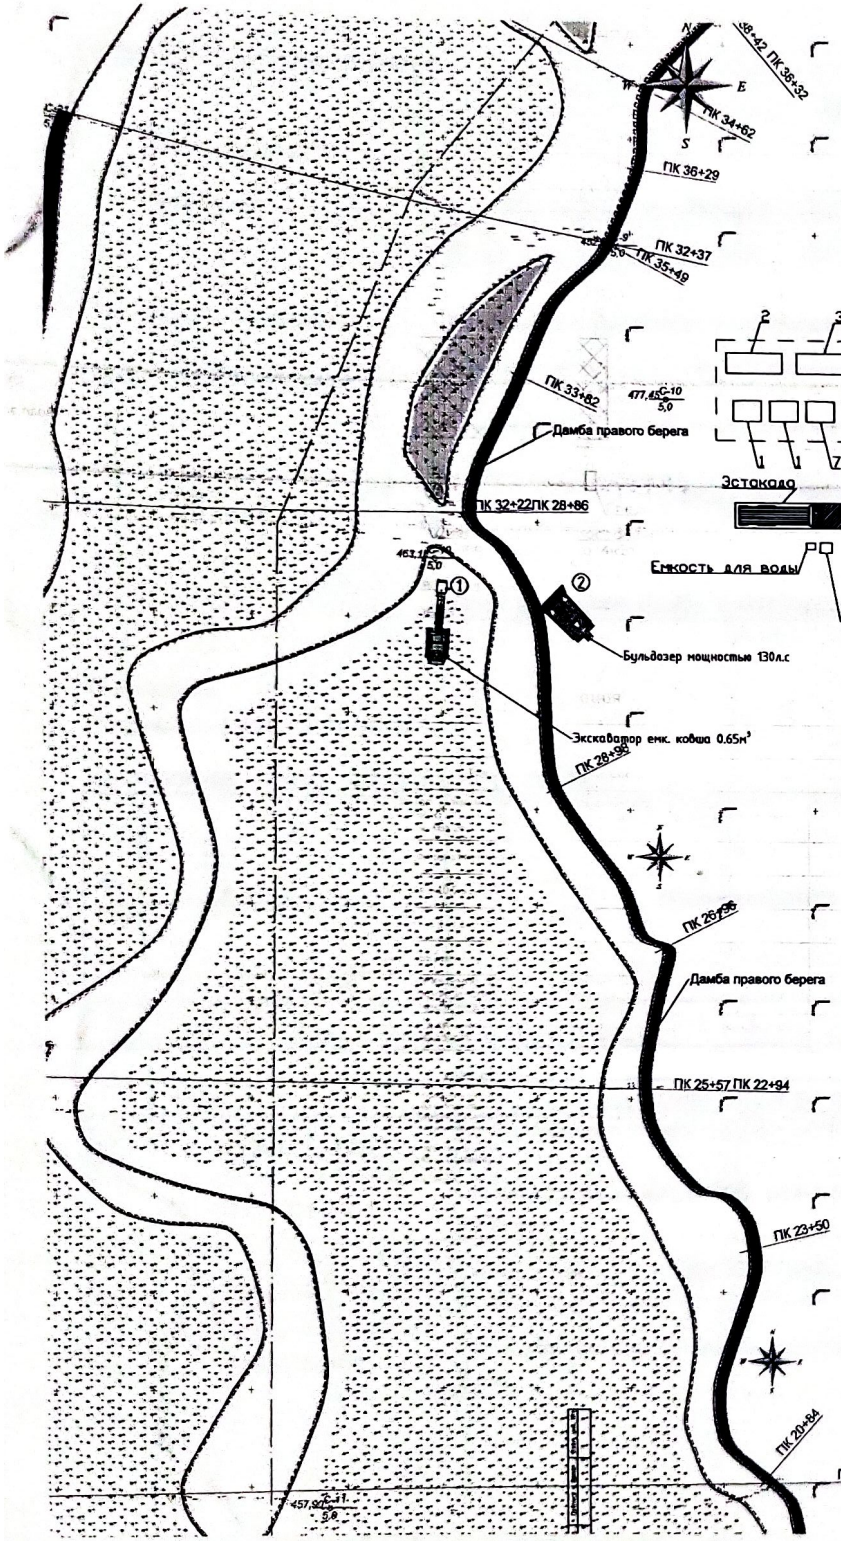

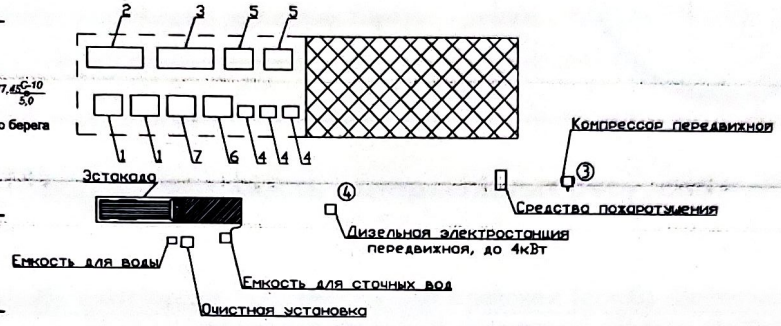

Экспликация

Марка поз.	Наименование	Примечание
	Временные здания и сооружения	
1	Гардеробная уличной одежды, помещение для обогрева работающих с сушилкой для одежды и обуви и хранения чистой спецодежды (6х3м)	
2	Столовая-раздаточная (10,5х3,2м)	
3	Прорабская (10,5х3,2м)	
4	Биотуалет (1,1х1,1м)	
5	Душевая (6х3м)	
6	Бытовое помещение для обеспыливание, чистки спецодежды, включая каски и спецобувь с кладовой средств индивидуальной защиты и местом для переодевания (6х3м)	
7	Помещение для укрытия строителей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий (6х3м)	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. До начала производства работ границы полосы отвода строительства должны быть обозначены на местности указательными знаками.
2. Электроснабжение на период строительства предусмотрено от передвижной ДЭС, водоснабжение - доставкой воды автоцистернами от существующих источников, снабжение сжатым воздухом - от передвижной компрессорной установки.
3. Бытовое обслуживание строителей (кроме проживания) предусмотрено во временном городке строителей. Доставка рабочих на стройплощадку - транспортом подрядчика.
4. Строительно-монтажные работы выполнять согласно разработанному Подрядчиком ППР7

Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Марка поз.	Наименование	Примечание
	Временные здания и сооружения	
1	Экскаватор одноковшовый емк. 0,65м³	
2	Бульдозер мощностью 130л.с	
3	Компрессор передвижной	
4	Дизельная электростанция передвижная, до 4кВт	

Площадка для временных инвентарных зданий и сооружений (гардеробная, столовая-раздаточная, прорабская, биотуалет)

Площадка для складирования конструкций, материалов и оборудования
