Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Акционерное общество "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., район Астана,пр.Санкибай батыра,12Б — 931240000052

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Байнур Строй Монтаж",Республика Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Г.Жубановой д. 102 — 110240015592

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №660 от 19.05.2025год

Номер документа	Дата составления
7	08.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция самотечного коллектора по пр.Мира от ул.Маресьева до ул.Рыскулова			Работа	1	213 318 375,00	213 318 375,00	22 855 540,18
				Итого	1	x	213 318 375,00	22 855 540,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): зам директора / _____ / Бектурсунов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Главный инженер по водоснабжению и водоотведению / _____ / Азамат Д.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Приказ и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 г. № 336

Заказчик : **Акционерное общество "Aqtobe su-energy group"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Байнур Строй Монтаж"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция самотечного коллектора по пр.Мира от ул.Маресьева до ул.Рыскулова**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за Август 2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования					
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/ специфики				код	
931240000052	031240005055	АО	ТОО	660	19.05.2025						
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в отчетном месяце, без НДС	из них			НДС	Всего
							Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А		1		2		3	4	5	6	7	8
Реконструкция самотечного коллектора по пр.Мира от ул.Маресьева до ул.Рыскулова		213 318 375,00		213 318 375,00		190462834,82				22 855 540,18	213 318 375,00
ИТОГО к оплате											213 318 375,00

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group", БИН 931240000052

Главный инженер по водоснабжению и водоотведению, АЗАМАТ ДАНИЯР

М.П.

Подрядчик: ТОО «Байнур Строй Монтаж», БИН 031240005055

Руководитель, БИТЕМИРОВ ҚАЗБЕК СЛАМБЕКҰЛЫ.

М.П.

Технический надзор: ТОО «САМТЕХ», БИН 240340026904

Эксперт по техническому надзору, АЛТЫНБАЕВ САГИНГАЛИ

Подписано через ЕОНРУЛУС.КЗ (ЖОЛ-1449-2025-4434-9b4-914b-7b71000

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 911009301317 - БИТЕМИРОВ ҚАЗБЕК null	Генеральный подрядчик	Подписано: 08.08.2025 09:24
Технический надзор: ИИН 540408300039 - АЛТЫНБАЕВ САГИНГАЛИ null	Эксперт	Подписано: 08.08.2025 09:49
Заказчик: ИИН 840823302907 - АЗАМАТ ДАНИЯР null	Главный инженер по водоснабженю и водоотведению	Подписано: 08.08.2025 11:04

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

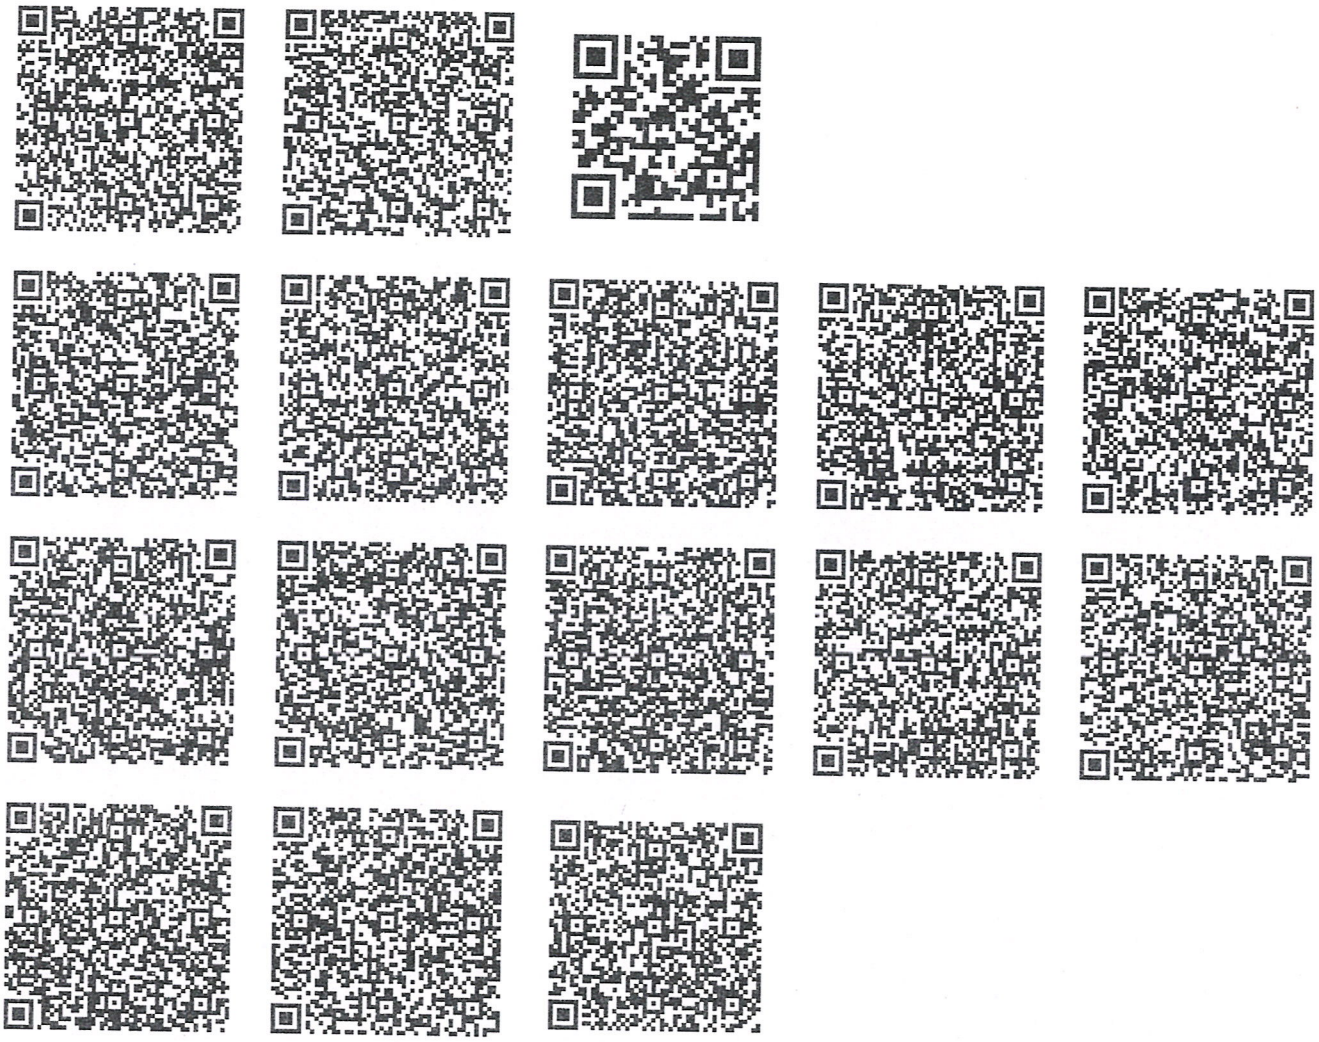

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **931240000052 - Акционерное общество "Aqtobe su-energy group"**

Подрядчик: **110240015592 - ТОО Байнур Строй Монтаж**

Стройка: **Реконструкция самотечного коллектора по пр.Мира от ул.Маресьева до ул.Рыскулова**

Договор подряда (контракт) №: **- от - года**

Акт выполненных работ
за Август 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети канализации				
			Раздел: Канализация хоз-бытовая (К1)				
			Подраздел: Временная канализация				
1	1	1216-0102-0402РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализационные диаметром 200 мм.Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава,перекачка стоков автонасосами	м	495	22 064	10 921 680
2	2	244-402-0102РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм-(в сборе с ГР-150) - /4шт по 20м/	м	40	5 031	201 240
			Итого по подразделу: Временная канализация				**11 122 920**
			Подраздел: Санация трубоповода гибким полимерно-тканевым рукавом Д200 - 603м				
3	3	1216-0102-0901РСНБ РК 2022	Трубопровод.Обследование телевизионное инспекционное до прочистки и промывки при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	495	2 029	1 004 355
4	4	1216-0102-0302РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализационные диаметром 200 мм.Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава,прочистка и промывка	м	495	17 389	8 607 555
5	5	1216-0102-1201РСНБ РК 2022	Сети самотечной канализации.Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 150-250 мм,самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения	м	495	12 344	6 110 280
6	6	ТПрайс лист ТОО "Сан Мир Астана" РСНБ РК 2022	Рукав полимерный Nordiwall диаметром 200 мм	м	495	250 000	123 750 000
7	7	217-207-0211РСНБ РК 2022	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 1300 мм,толщиной 0,8 мм	м	495	17 389	8 607 555
8	8	1216-0102-1001РСНБ РК 2022	Трубопровод.Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	495	880	435 600
			Итого по подразделу: Санация трубоповода гибким полимерно-тканевым рукавом Д200 - 603м				**148 515 345**
			Подраздел: null				
9	10	6302-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка люка	шт.	6	9 226	55 356

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	11	244-202-0108РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком,тип Т (С250)	комплект	6	63 070	378 420
11	12	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками -/отмостка -28 ш/	м3 подстилающего слоя	4.806	45 509	218 716
12	13	241-117-0107РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм	шт.	8	13 285	106 280
			Итого по подразделу: null				**758 772**
			Подраздел: Прочистка колодцев-14 шт				
13	14	1219-0101-0901РСНБ РК 2022	Прочистка сущ.колодцев-28 шт.Помещения.Очистка от строительного мусора	т	6.9	8 423	58 119
			Итого по подразделу: Прочистка колодцев-14 шт				**58 119**
			Итого по разделу: Канализация хоз-бытовая (К1)				**160 455 156**
			Итого по локальной смете: Наружные сети канализации				**160 455 156**
			ИТОГО по акту:				**160 455 156**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.000%)	160455155.750 x 6.00%	9 627 309
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	160455155.750 + 9627309.345	170 082 465
	Сметная прибыль, (5.00%)	170082465.095 x 5.00%	8 504 123
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	170082465.095 x 5.000%	8 504 123
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		187 090 712
	В том числе на II квартал 2025 г., доля - 100%, к = 1.0388	187090711.605 x 1.0388	194 349 831
	Итого по смете с понижающим коэффициентом, к = 0.9800	194349831.215 x 0.9800	190 462 835
	НДС (12%)	190462834.590 x 12%	22 855 540
	Итого с НДС	190462834.590 + 22855540.151	213 318 375

Представители заказчика:

Главный инженер по водоснабжению и водоотведению

Азамат Д.К. _____

Заместитель главного инженера

Ашубаев Ж.Б. _____

Начальник ОКС

Мейрхан Е.К. _____

Начальник канализационных сетей Хайрулин М.Ф.

Лист согласования
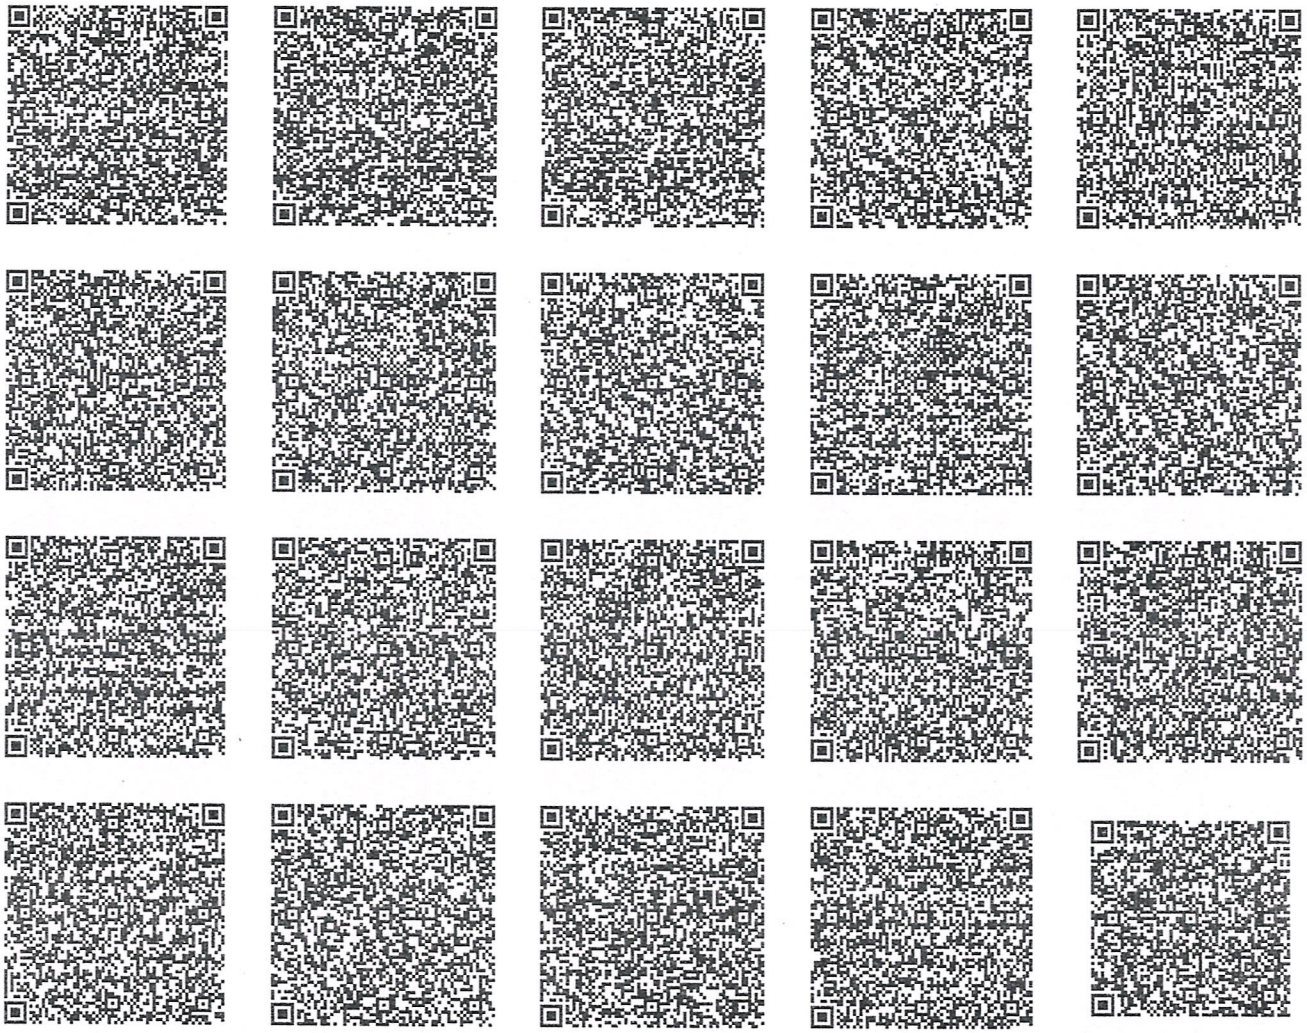
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
911009301317 - БИТЕМИРОВ ҚАЗБЕК СЛАМБЕКҰЛЫ	Генеральный подрядчик	06.08.2025 15:51
Представители технического надзора		
540408300039 - АЛТЫНБАЕВ САГИНГАЛИ null	Эксперт	06.08.2025 17:52
Представители авторского надзора		
930827302175 - ӘБДІЛЛА АЛДИЯР НҰРҒАЗЫҰЛЫ	Эксперт	06.08.2025 15:56
Представители заказчика		
840823302907 - АЗАМАТ ДАНИЯР КУАНЫШЕВИЧ	Главный инженер по водоснабженю и водоотведению	07.08.2025 13:38
710126300122 - АШУБАЕВ ЖАКСЫБАЙ БАЙЗОНОВИЧ	Заместитель главного инженера по водоотведению	07.08.2025 14:21
951006350376 - МЕЙРХАН ЕРЖАН ҚУАНТАЙҰЛЫ	Начальник ОКС	07.08.2025 13:47
