Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **070340004253 - Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **100940016554 - ТОО АЭS and Limited**

Стройка: **Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области.**

Договор подряда (контракт) №: **81 от 08.08.2024 года**

Акт выполненных работ
за Август 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: 1-1-2				
			Раздел: Фундаменты Снятие и восстановление ПРС. Высокое давление Г-3				
1	3	1101-0104-0105РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС)	м3 грунта	15502.8075	55	1 108 606
2	4	1101-0104-0105РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление ПРС)	м3 грунта	10769.287	55	770 112
			Итого по разделу: Фундаменты Снятие и восстановление ПРС. Высокое давление Г-3				**1 878 717**
			Итого по локальной смете: 1-1-2				**1 878 717**
			Локальная смета: № 2-1-2				
			Раздел: Земляные работы Земляные работы. Высокое давление Г-3				
3	1	1101-0101-0319РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	32634.2825	94	3 925 251
4	3	1101-0205-0301РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1106.988	1 910	3 926 973
5	4	1101-0205-0501РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/10 СМ/	м3 грунта	49.808	1 185	109 614
6	5	1101-0205-0501РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/20 СМ/	м3 грунта	4637.9375	1 185	10 206 802
7	6	211-501-0103РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	4411.43	6 895	32 850 155
8	8	1101-0104-0404РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	27472.706	32	1 135 722
			Итого по разделу: Земляные работы Земляные работы. Высокое давление Г-3				**52 154 517**
			Раздел: Фундаменты Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления Г-3				
9	13	1122-0501-0407РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	6.2	1 531 883	14 773 799

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	14	241-202-0220РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	6000	16 308	105 675 840
11	51	1308-0201-0405РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	6200	8	87 420
12	52	249-101-0201РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	6200	17	113 832
			Итого по разделу: Фундаменты Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления Г-3				**120 650 890**
			Итого по локальной смете: № 2-1-2				**172 805 407**
			Локальная смета: 1-1-1				
			Раздел: Разбивка трассы				
13	1	СТСЦИ	Восстановление трассы магистральных трубопроводов	км	6.2	16 478	102 164
14	2	СТСЦИ	Закрепление трасс магистральных трубопроводов	км	6.2	18 169	112 648
			Итого по разделу: Разбивка трассы				**214 811**
			Итого по локальной смете: 1-1-1				**214 811**
			ИТОГО по акту:				**174 898 936**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (2.900%)	174898936.161 x 2.90%	5 072 069
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	174898936.161 + 5072069.315	179 971 005
	Сметная прибыль, (8.00%)	179971005.477 x 8.00%	14 397 680
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	179971005.477 x 2.000%	3 599 420
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		197 968 106
	НДС (12%)	197968106.024 x 12%	23 756 173
	Итого с НДС	197968106.024 + 23756172.723	221 724 279

Лист согласования
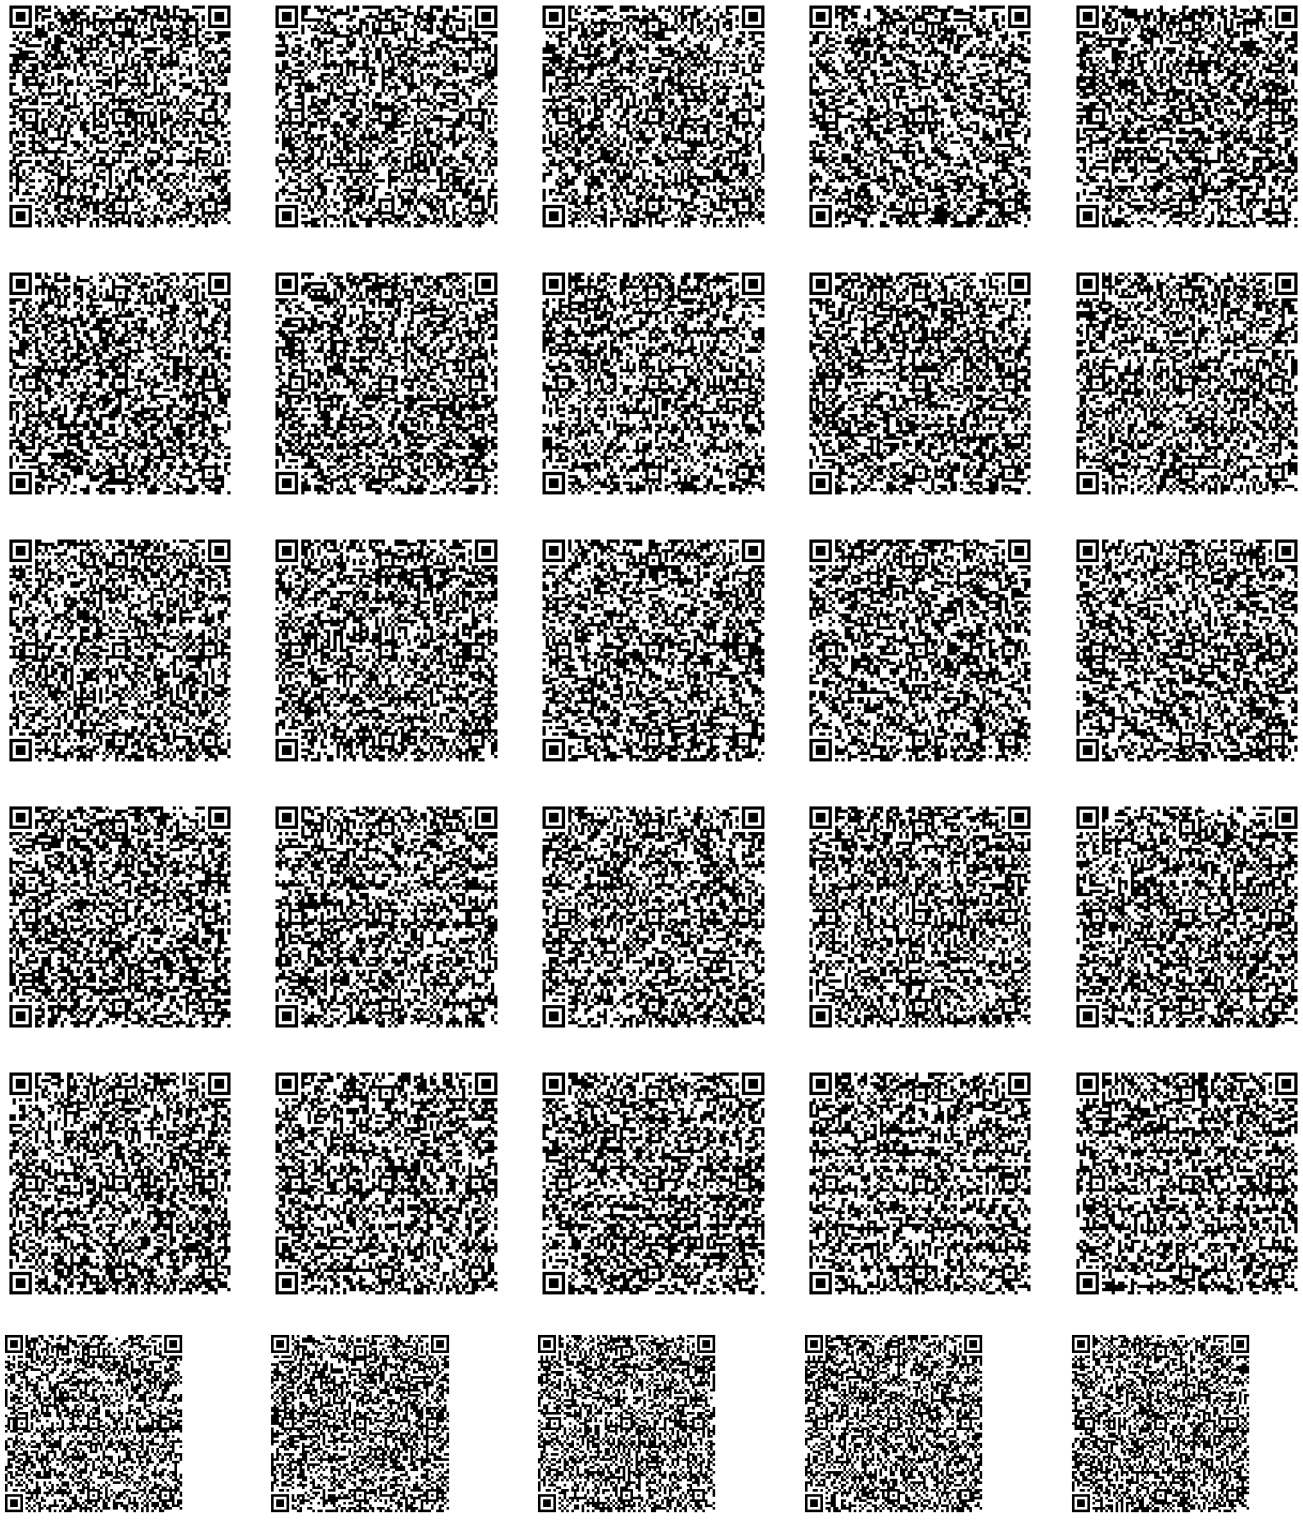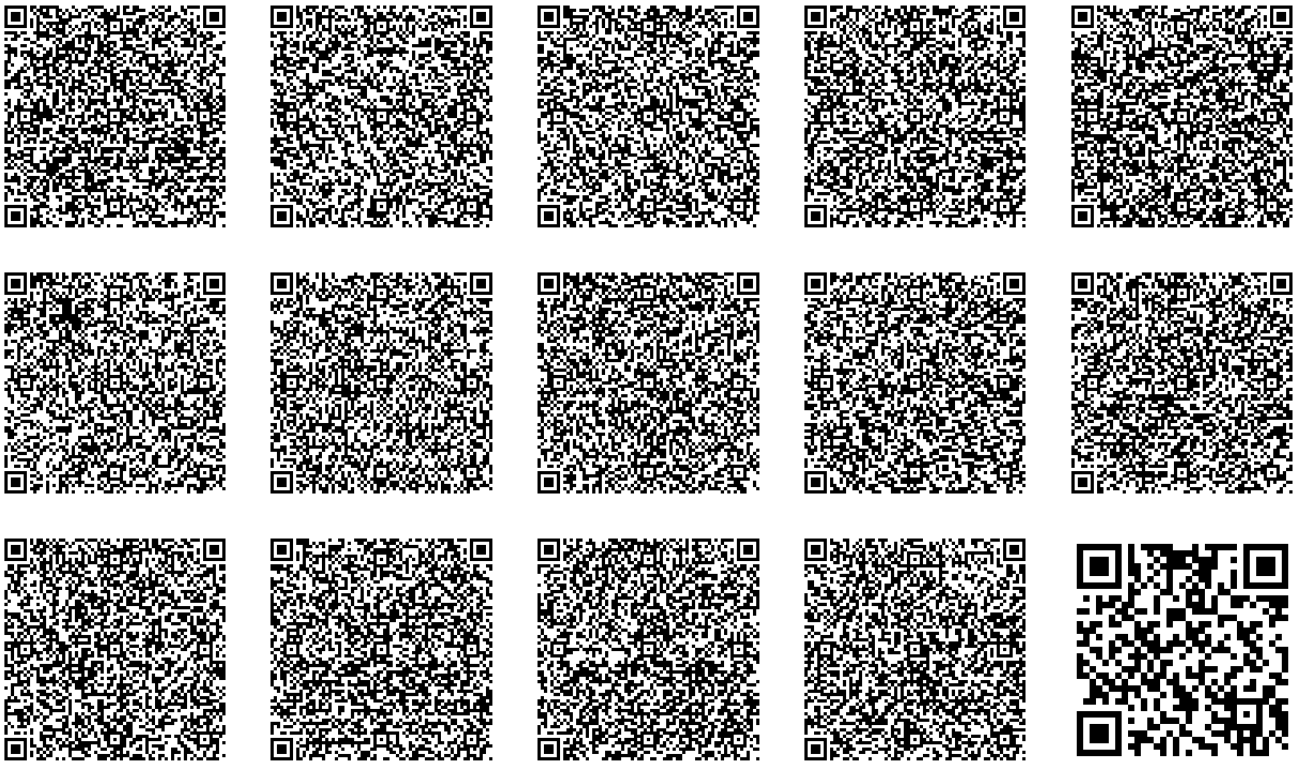
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
840314350968 - КАЛКАЕВ ЖАСУЛАН БОЛАТОВИЧ	Начальник участка	28.08.2025 17:08
Представители технического надзора		
910704350589 - ЕСКАЛИЕВ АЛДАН ЖОЛДЫБАЕВИЧ	Эксперт технического надзора	28.08.2025 17:10
Представители авторского надзора		
570904301387 - ЗАВЬЯЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	Авторский надзор	28.08.2025 17:13
Представители заказчика		
960807350855 - ИСКАЛИЕВ ТЕМЕРЛАН РАДИКОВИЧ	Заказчик	28.08.2025 17:45
980405351277 - БИСЕМБАЕВ АРМАН ДАУЛЕТОВИЧ	Руководитель	28.08.2025 17:46
