Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27» 10 **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «УниверсалСтройСервис», г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Момбеков Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительства системы электроснабжения улиц в селе Головацкого Панфиловский район, Алматинская область»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" - Саурыков А.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Тендер Береке», ТОО «Гранд Тауэр Сервис», ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», ТОО «ЖАЙЛЫАҚТАУ», ТОО «БЕНД-Стройсервис»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Redline Pro» Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

Сканировано с CamScanner

Утвержден(а) **ГУ «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта, Автомобильных Дорог И Жилищной Инспекции Панфиловского Района» №15 от 07.11.2022 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование показателей	Единица измерения	Показатели	
		заявленные	рекомен.к утвержд.
Провод СИП-3 1х70-35	км	9,871	9,871
Провод СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0	км	7,774	7,774
Провод СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	км	4,456	4,456
Провод СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	км	1,629	1,629
Провод СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,488	1,488
Провод СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	11,25	11,25
Установка опор ВЛ 0,4 кВ	шт	836	836
Установка опор ВЛ 10 кВ	шт	151	151

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

Сканировано с CamScanner

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Электроснабжение осуществляется от проектируемой КТПН. Питание проектируемой КТПН предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых ж/б опорах отпайкой от существующей ВЛ-10кВ с алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИП3-1х70. Выбор сечения проводов произведен по механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%. Закрепление опор в грунте и их заземление выполнить согласно серии 3.407.1-143 и 3.407-150. Расчетные пролеты ВЛИ-0,4кВ составляют 30-40м. Расчетные пролеты ВЛЗ-10кВ составляют 40-60м.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2023 г.**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2023 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: месяцев;
по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;
фактически 6 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 94,2% и фактический применено 95 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Сканировано с CamScanner

тавщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жарменбетий РА

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Момбеков Шамболат Асанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительства системы электроснабжения улиц в селе Головацкого Панфиловский район, Алматинская область»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «УниверсалСтройСервис» - Момбеков Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место для печати

Сканировано с CamScanner

Исполнительная съемка установленных ЛЭП опор и СИП кабелей по проекту «Строительства электроснабжения улиц с. Головацкого, Панфиловского района, Алматинской области».

КТПН-1

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"



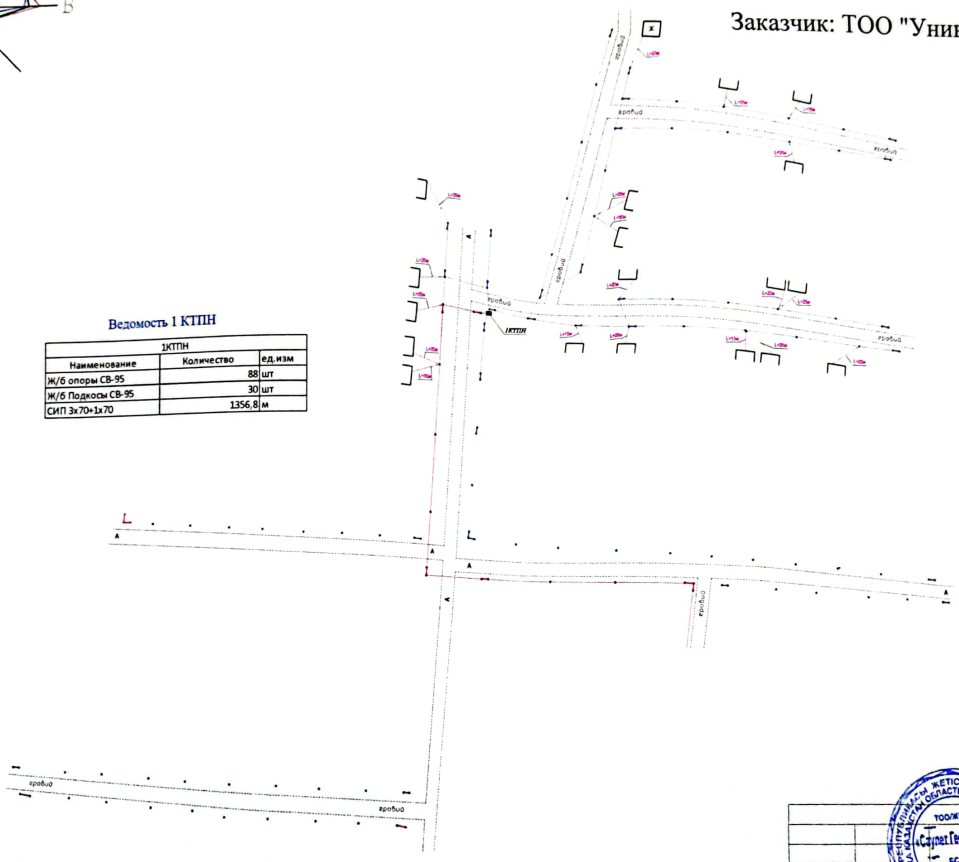

Ведомость 1 КТПН

1КТПН		
Наименование	Количество	ед.изм
Ж/б опоры СВ-95	88	шт
Ж/б Подкосы СВ-95	30	шт
СИП 3х70+1х70	1356,8	м

						ОР-2023
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ТОО "Саулет Гео-Групп" ГЛ № 21011898 (от 12.03.2021г) (8702-62-999-21)
Директор:		Шарипов Б.				Система координат - местная Система высот - Балтийская

Сканировано с CamScanner

Исполнительная съемка установленных ЛЭП опор и СИП кабелей по проекту «Строительства электроснабжения улиц с. Головацкого, Панфиловского района, Алматинской области».

КТПН-5

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"



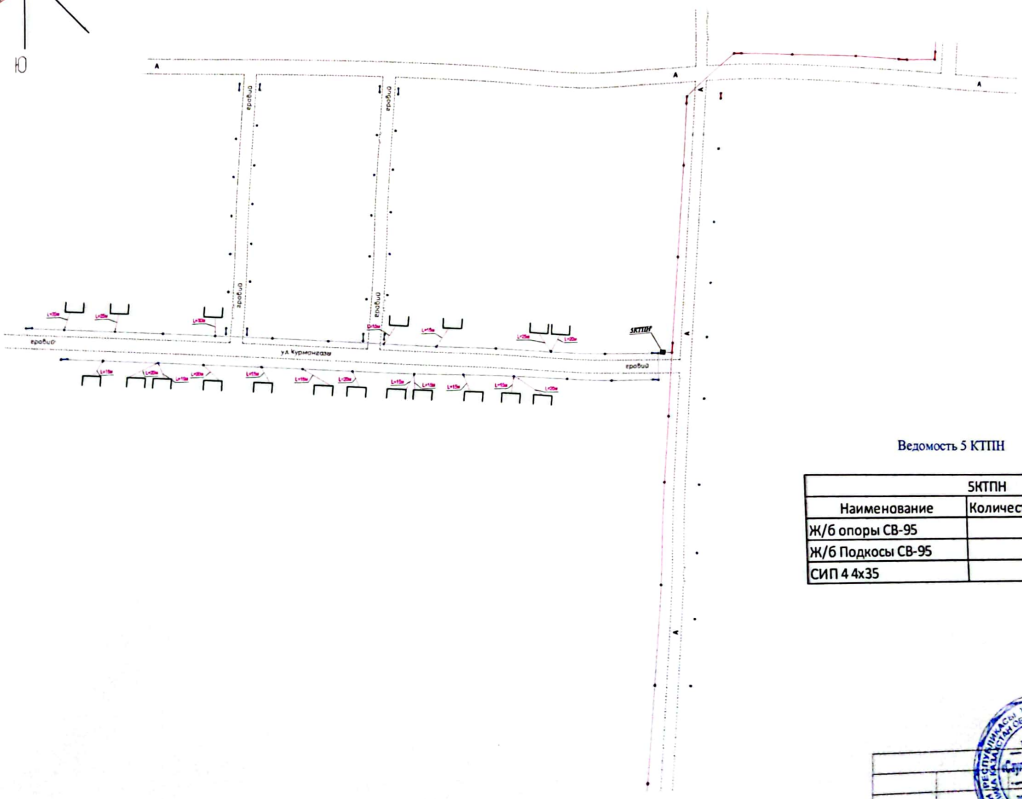

Ведомость 5 КТПН

5КТПН		
Наименование	Количество	ед.изм
Ж/б опоры СВ-95	63	шт
Ж/б Подкосы СВ-95	12	шт
СИП 4 4х35	690,1	м

					ТОО.2023
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Директор		Шарипов Б.			ТОО "Саулет Гео-Группа" ГЛ № 21011898 (от 12.03.2021г) (8702-42-999-21)
Инженер		Кузембаев Д.		20.11.23	Система координат - местная Система высот - Балтийская

Сканировано с CamScanner



Исполнительная съемка установленных ЛЭП опор и СИП кабелей по проекту «Строительства электроснабжения улиц с. Головацкого, Панфиловского района, Алматинской области».

КТПН-4

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

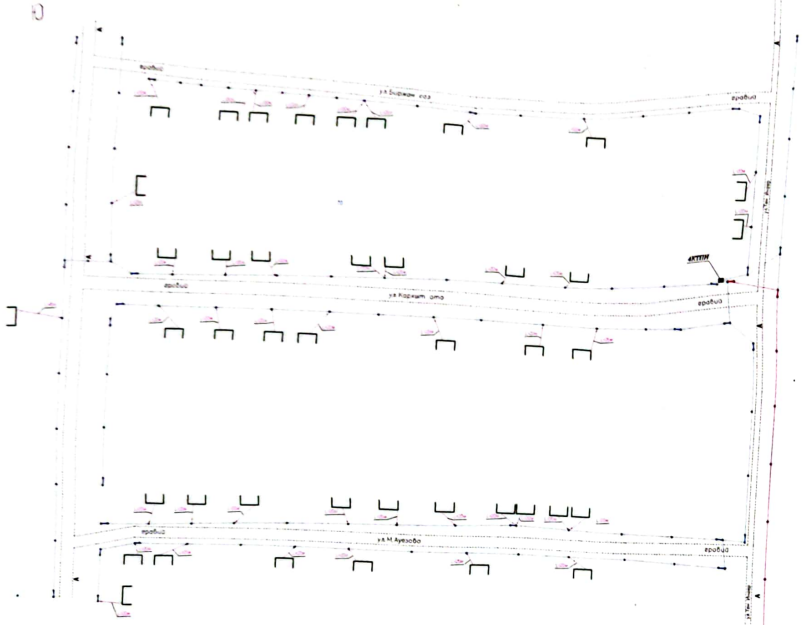

Ведомость 4 КТПН

4КТПН		
Наименование	Количество	ед.изм
Ж/б опоры СВ-95	116	шт
Ж/б Подкосы СВ-95	32	шт
СИП 2 3х70+1х70	2830,2	м

					ТОР-2023
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подпись	Дата	ТОО "Саулет Гео-Групп" ГЛ № 21011898 (от 12.03.2021г) (8702-62-999-21)
Директор:		Шарипов Б.				Система координат - местная Система высот - Балтийская
Исполнитель:		Кузыбеков Д.			20.11.23	

ТОО/ЖШС «Саулет Гео-Групп» БСН 160240031 ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ ЖЕТІСУ ОБЛАСТЬ

Сканировано с CamScanner

Исполнительная съемка установленных ЛЭП опор и СИП кабелей по проекту «Строительства электроснабжения улиц с. Головацкого, Панфиловского района, Алматинской области».
КТПН-3

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"



Ведомость 3 КТПН

3КТПН		
Наименование	Количество	ед.изм
Ж/б опоры СВ-95	245	шт
Ж/б Подкосы СВ-95	53	шт
СИП 2 3х95+1х95	7774	м

				ТОР-2023
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ТОО "Саулет Гео-Групп" ГЛ № 21011898 (от 12.03.2021г) (8702-62-999-21)
Директор:		Шарипов Б.				Система координат - местная Система высот - Балтийская
Исполнитель:		Кулыбеков Д.			20.11.23	

Сканировано с CamScanner



Исполнительная съемка установленных ЛЭП опор и СИП кабелей по проекту «Строительства электроснабжения улиц с. Головацкого, Панфиловского района, Алматинской области».

КТПН-2

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

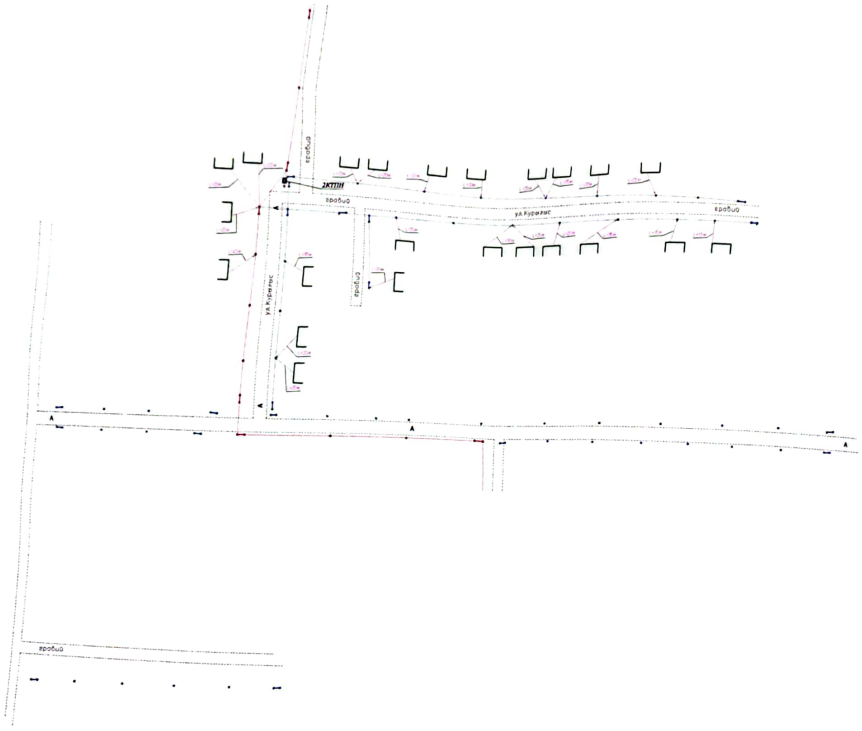

Ведомость 2 КТПН

2КТПН		
Наименование	Количество	ед.изм
Ж/б опоры СВ-95	59	шт
Ж/б Подкосы СВ-95	19	шт
СИП 4 4х35	797,9	м

					ТОО-2023
Изм.	Кол.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата
Директор		Шарипов Б.			ТОО "Саулет Гео-Групп" ГЛ № 21011898 (от 12.03.2021г) (8702-62-999-21)
Исполнитель		Кулыбеков Д.			20.11.23

Система координат - местная
Система высот - Балтийская

Сканировано с CamScanner

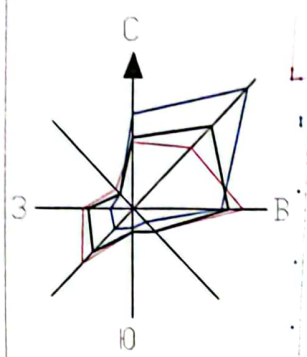

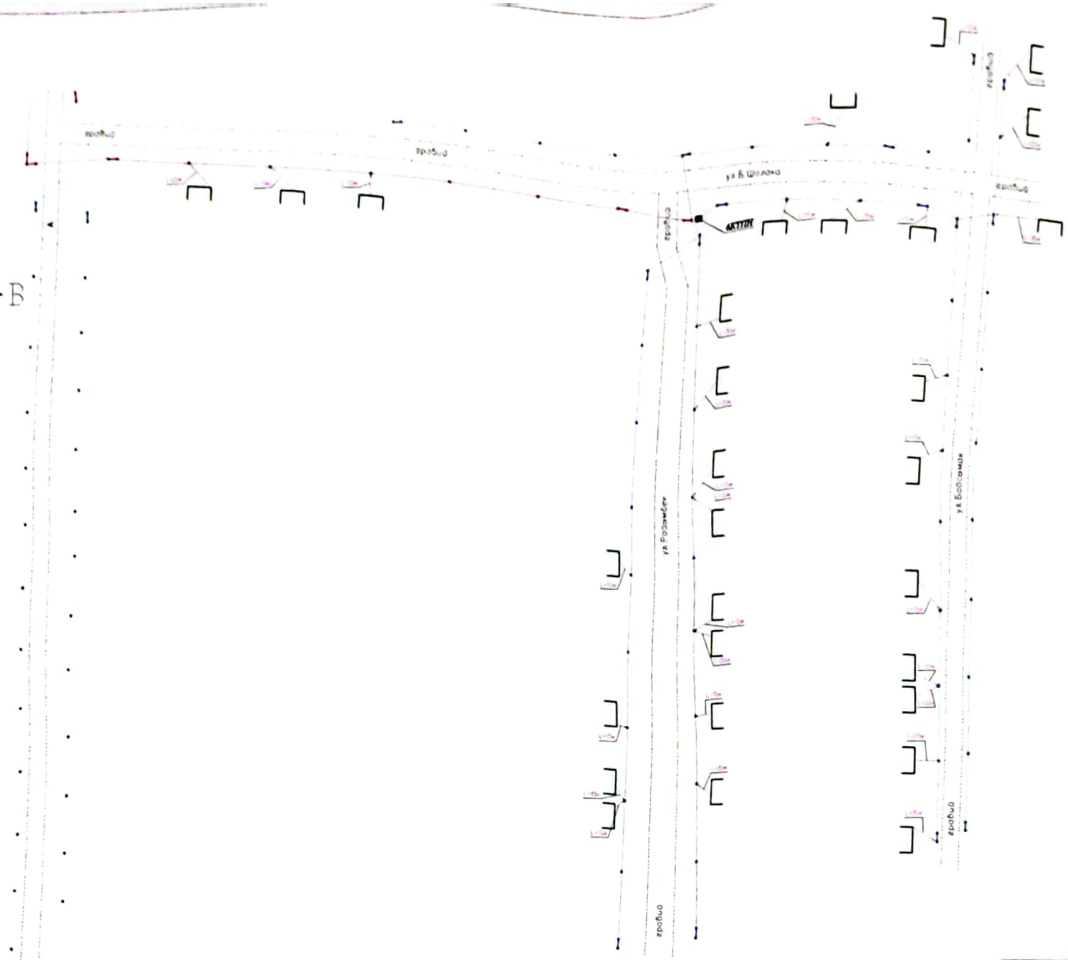

Исполнительная съемка установленных ЛЭП опор и СИП кабелей по проекту «Строительства электроснабжения улиц с. Головацкого, Панфиловского района, Алматинской области».

КТПН-6

Заказчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Ведомость 6 КТПН

6КТПН		
Наименование	Количество	ед.изм
Ж/б опоры СВ-95	98	шт
Ж/б Подкосы СВ-95	21	шт
СИП 2 3х70+1х70	269	м
СИП 2 3х50+1х50	1629	м

				ТОО "Саулет Гео-Групп" ГЛ № 21011898 (от 12.03.2021г) (8702-62-999-21)
Изм.	Кол.	Лист	Подпись	Дата
Директор	Шарипов Б.			Система координат - местная Система высот - Балтийская
Исполнитель	Кульбеков Д.			20.11.23

ТОО ЖШС «Саулет Гео-Групп» БСН 210317021 РЕСПУБЛИКАСЫ ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ ЖЕТІСУ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Сканировано с CamScanner

Исполнительная съемка установленных ЛЭП опор и СИП кабелей по проекту «Строительства электроснабжения улиц с. Головацкого, Панфиловского района, Алматинской области».

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"



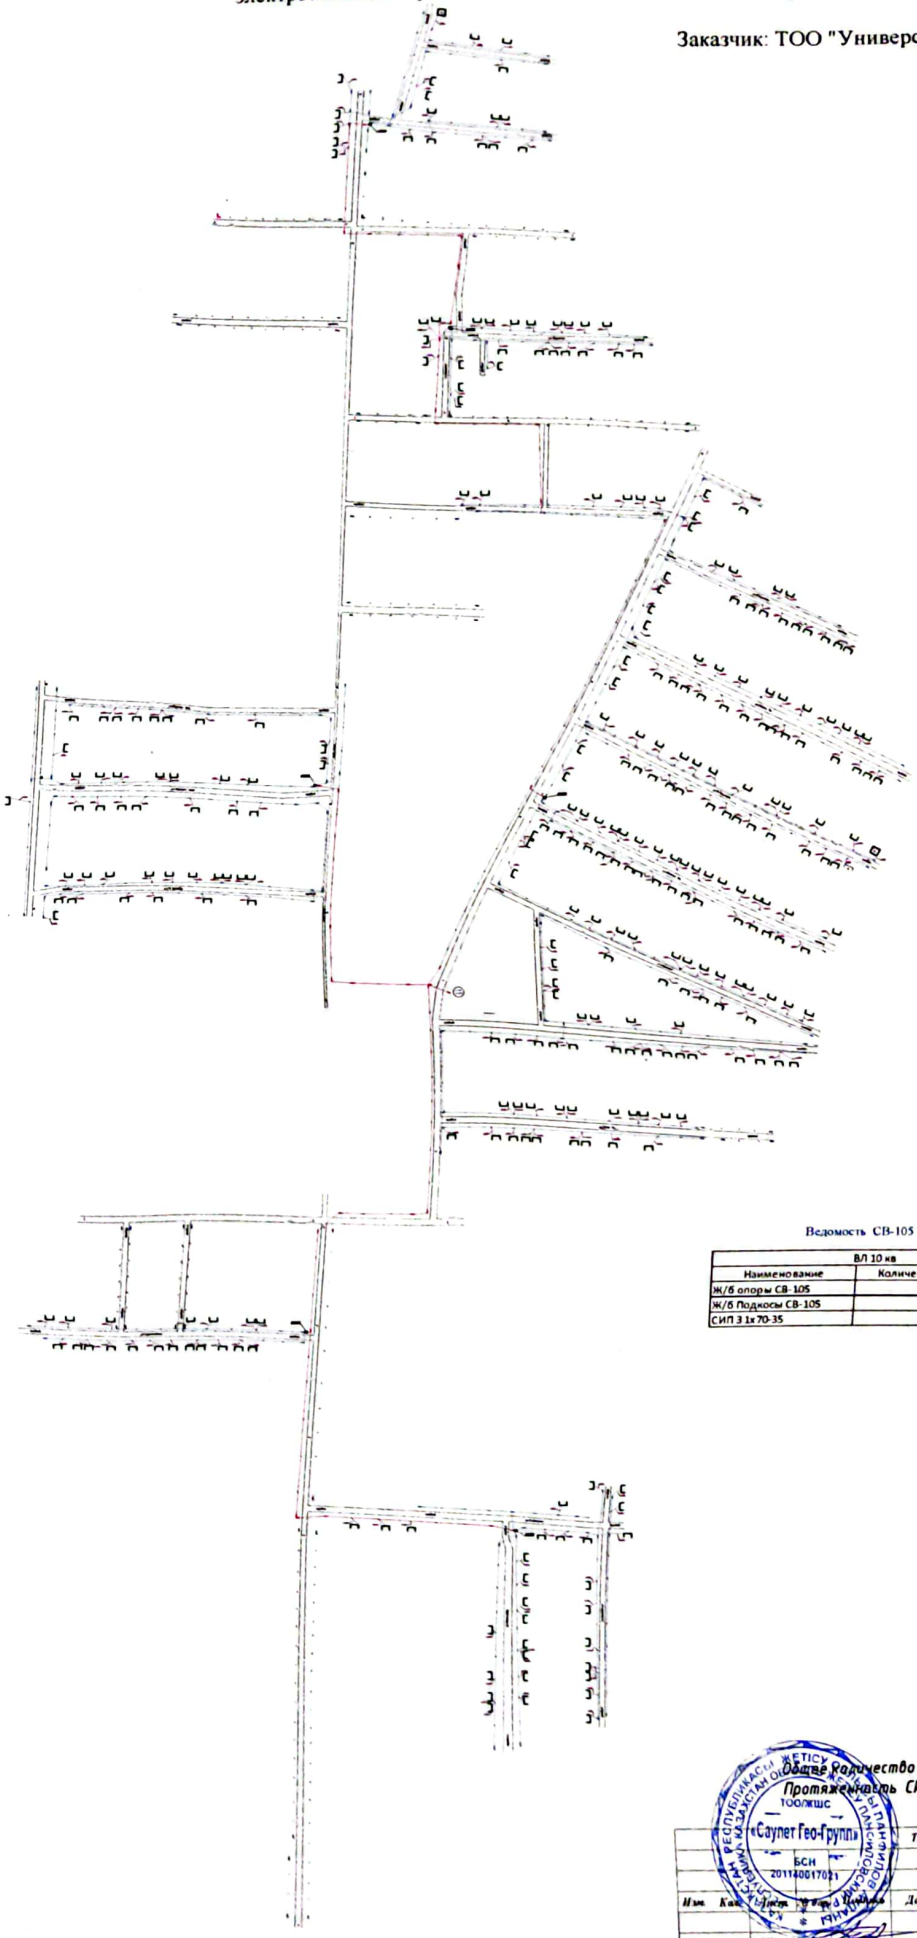

Ведомость СВ-105

ВЛ 10 кв		
Наименование	Количество шт.	ед.изм
Ж/б опоры СВ-105	101	шт
Ж/б Подкосы СВ-105	38	шт
СИП 3 1х70-35	9871	м

Общее количество подключенных абонентов – 450.
Протяженность СИП 4 2х16-0,6/1,0 =11250 м.

					ТОР-2023
Изм.	Кол.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	ТОО "Саулет Гео-Групп" ГЛ № 21011898 (от 12.03.2021г) (8702-62-999-21)
Директор		Шарипов				Система координат - местная Система высот - Балтийская
Исполнитель		Кулибеков Д			20.11.21	

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНЫҢ ЖЕРГІЛІКТІ ӨКІЛДІК ОРГАНЫ ТОО/ЖШС «Саулет Гео-Групп» БСН 201140017021

Сканировано с CamScanner
