Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140001989 - ТОО "Отау-Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне «Улы Дала» по улице Ж. Елебекова, 21 города Тараз Жамбылской области на 2 000 мест**

Договор подряда (контракт) №: **67 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружное освещение				
			Раздел: Освещение				
			Подраздел: Опора наружного освещения Тип 3/2-компл./лист ЭН-8/				
1	56	1133-0304-0402РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	2	30 096	60 192
2	57	212-101-0501РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.42	16 033	6 734
3	58	247-306-0105РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	2	110 048	220 096
4	59	247-306-0934СпрСЦ 07.2024	Кронштейн консольный К-6	шт.	2	88 812	177 624
5	60	1133-0207-0103РСНБ РК 2022	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	6	15 518	93 108
6	61	247-103-2547РСНБ РК 2022	Прожектор Philips, типа BVP433 LED517/NW 380W SMB, мощность 380 Вт, IP 66	шт.	6	471 763	2 830 578
7	62	6401-0202-1107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж соединительной коробки при прокладке кабеля саморегулирующего (нагревательного) греющего	шт.	2	3 555	7 110
8	63	Тпункт перечня 60 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Коробка соединительная ЕКМ-2050-2D1-5S6/U, в комплекте: предохранитель GURO-F-D1-02- 2шт, адаптер GURO-F-D1-AS02 - 2шт,УЗИП COBOX-SLSA10-S-S- 1шт	шт	2	17 987	35 975
9	64	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0.059	283 873	16 749
10	65	247-306-1006СпрСЦ 07.2024	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,8-Б, высотой 1800 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	2	43 686	87 372
			Итого по подразделу: Опора наружного освещения Тип 3/2-компл./лист ЭН-8/				**3 535 538**
			Итого по разделу: Освещение				**3 535 538**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по локальной смете: Наружное освещение				**3 535 538**
			ИТОГО по акту:				**3 535 538**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.200%)				3535538.000 x 6.20%	219 203
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				3535538.000 + 219203.349	3 754 741
		Сметная прибыль, (5.00%)				3754741.349 x 5.00%	187 737
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				3754741.349 x 2.000%	75 095
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					4 017 573
		в том числе на 2024 г., доля - 75 %, к - 1, к = 1.0000				4017573.244 x 1.0000	4 017 573
		НДС (12%)				4017573.244 x 12%	482 109
		Итого с НДС				4017573.244 + 482108.789	4 499 682

Лист согласования
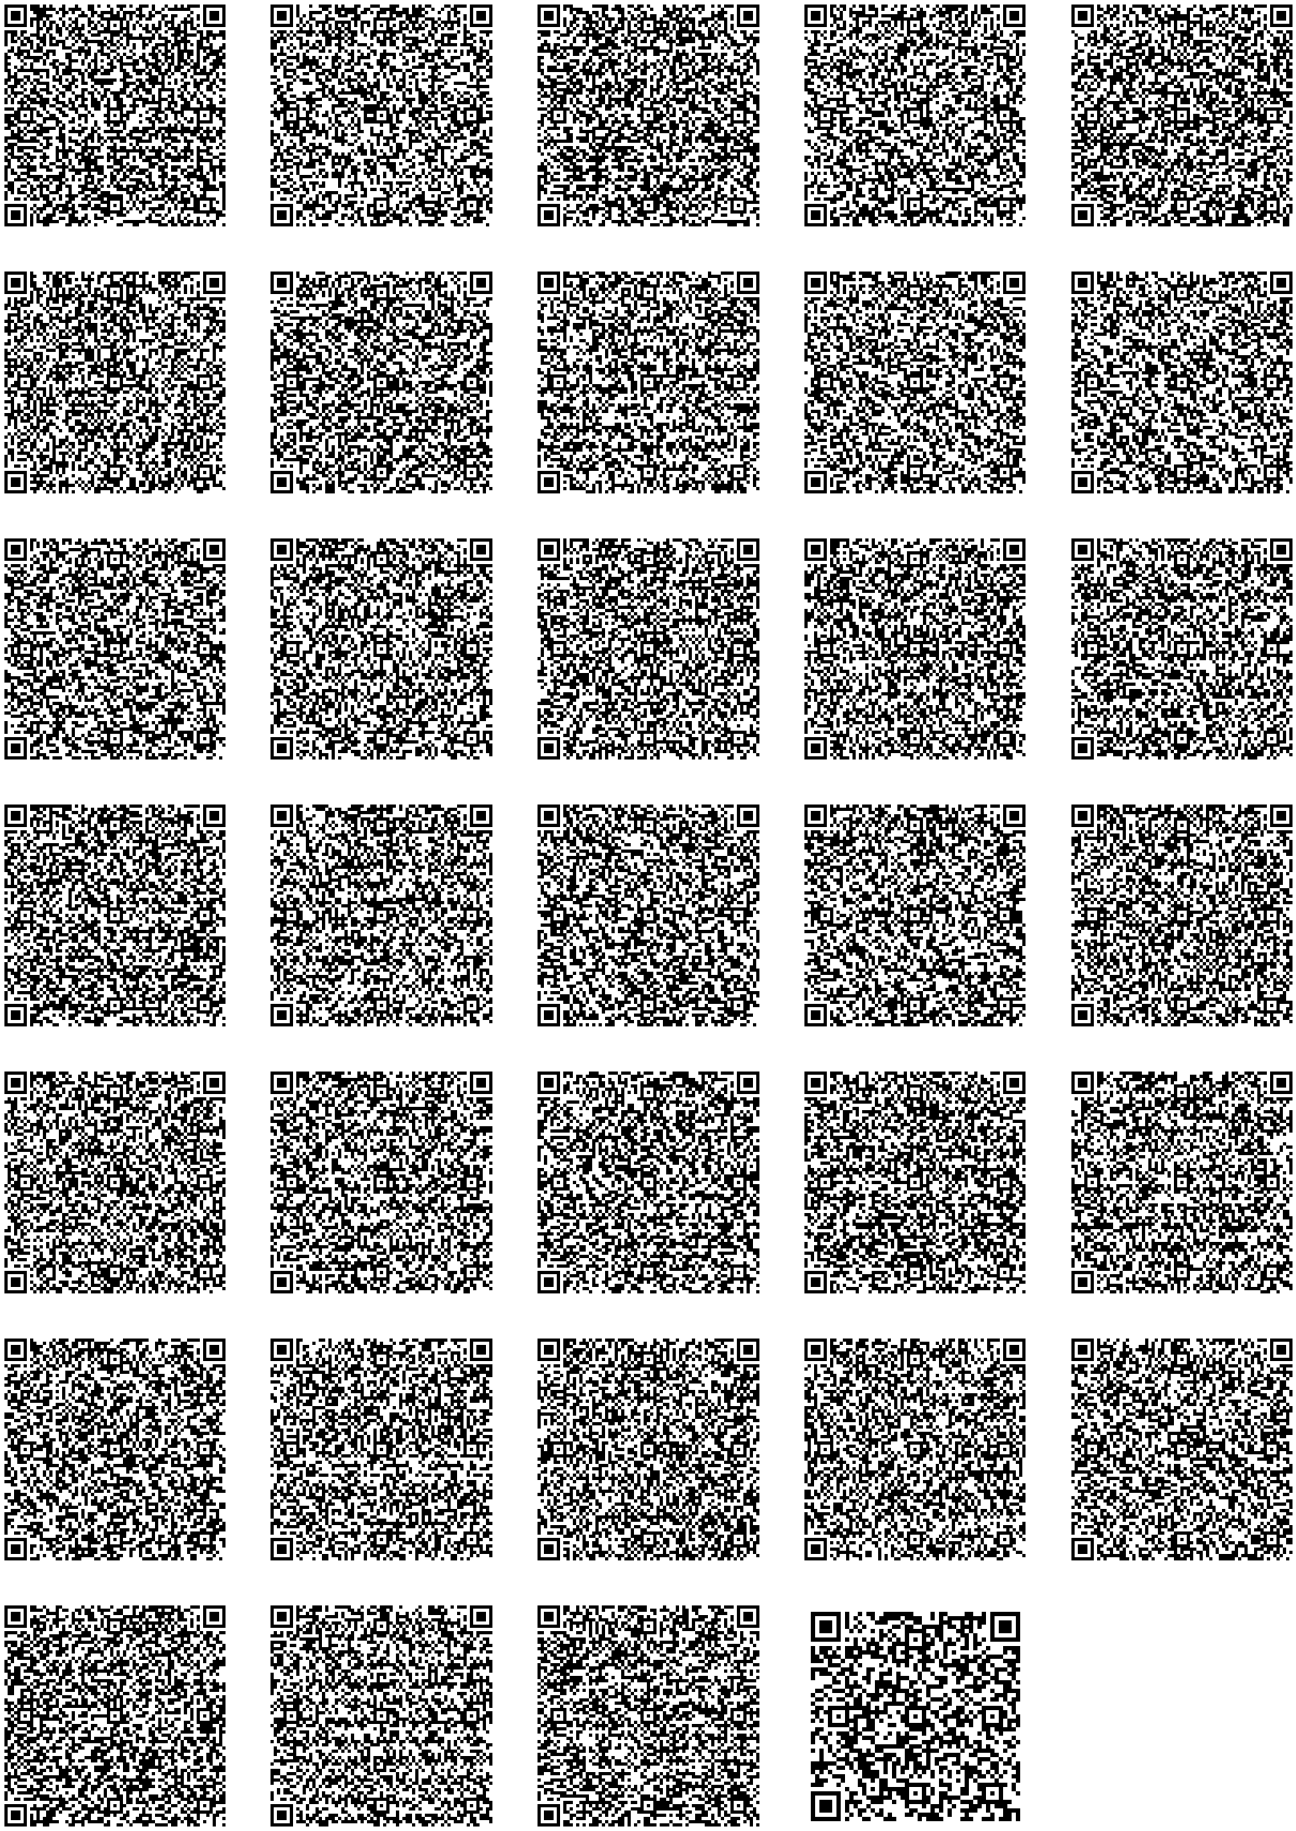
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
800511401159 - МОЛДАСЕИТОВА МАЙРА КУСАЙНОВНА	Генеральный директор	04.04.2025 19:59
Представители технического надзора		
550324300441 - АБСАЛИМОВ КАНТАР АБСАЛИМОВИЧ	Эксперт технического надзора	10.04.2025 14:00
Представители авторского надзора		
850617302826 - ДУЙСЕНОВ РУСТЕМ АМАНОВИЧ	инженер авторского надзора	04.04.2025 20:02
Представители заказчика		
610712302351 - СЕЙДАЛИН МУРАТ САТЫБАЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (ПТО) Жамбылская область	07.04.2025 15:18
750530301174 - МУРБЕКОВ КАНАТ ДЖУРАБЕКОВИЧ	Региональный руководитель Жамбылской области	07.04.2025 17:58
920702300583 - САБИТОВ АЯТ САБИТҰЛЫ	Региональный руководитель Алматинская область и область Жетысу	08.04.2025 17:28
790519401613 - ДАУТОВА ДИНА АПЛОТОНОВНА	Ведущий специалист Отдел смет и ценообразования	08.04.2025 09:26 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
870113303039 - АМИРЕЕВ МОЛДИЯР АМАНТАЕВИЧ	Ведущий специалист (сметчик) Жамбылская область	07.04.2025 15:50 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
