Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140001989 - ТОО "Отау-Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне "Акжар"(Аргымак) Абайском районе города Шымкент на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **143 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции металлические (КМ)				
			Отдел: Блок Е				
			Подраздел: РФермы				
1	1	6106-0302-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж стропильной фермы,подстропильной фермы: пролет до 24 м,масса до 3 т,высота до 25 м.	т	3.42228	196 478	672 403
2	2	222-525-0105РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	3.5591712	1 123 608	3 999 113
3	3	СТРСНБ РК 2022	Доплата на изменение марки стали С255	тн	3.5591712	14 178	50 462
			Итого по подразделу: РФермы				**4 721 978**
			Подраздел: РВертикальные связи				
4	4	6106-0302-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м.	т	1.4258	286 194	408 055
5	5	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1.482832	1 122 070	1 663 840
6	6	СТРСНБ РК 2022	Доплата на изменение марки стали С255	тн	1.482832	14 178	21 024
			Итого по подразделу: РВертикальные связи				**2 092 919**
			Подраздел: РГоризонтальные связи и распорки				
7	7	6106-0302-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м.	т	2.05167	334 797	686 893
8	8	222-525-0104РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	2.1337368	1 123 608	2 397 484
9	9	СТРСНБ РК 2022	Доплата на изменение марки стали С255	тн	2.1337368	14 178	30 252
			Итого по подразделу: РГоризонтальные связи и распорки				**3 114 629**
			Подраздел: РПрогоны				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	6106-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м.	т	2.547	101 118	257 548
11	11	214-203-0202РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	2.64888	372 994	988 016
12	12	СТРСНБ РК 2022	Доплата на изменение марки стали С255	тн	2.64888	14 178	37 556
			Итого по подразделу: РПрогоны				**1 283 120**
			Подраздел: РАнтикоррозийная защита				
13	13	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	273.95575	258	70 680
14	14	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	273.95575	397	108 760
			Итого по подразделу: РАнтикоррозийная защита				**179 441**
			Итого по отделу: Блок Е				**11 392 088**
			Отдел: Блок Ж				
			Подраздел: РФермы				
15	16	6106-0302-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж стропильной фермы,подстропильной фермы: пролет до 24 м,масса до 3 т,высота до 25 м.	т	12.36977	196 478	2 430 388
16	17	222-525-0105РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	12.8645608	1 123 608	14 454 723
17	18	СТРСНБ РК 2022	Доплата на изменение марки стали С255	тн	12.8645608	14 178	182 394
			Итого по подразделу: РФермы				**17 067 505**
			Подраздел: РВертикальные связи				
18	19	6106-0302-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м.	т	1.27588	286 194	365 149
19	20	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1.3269152	1 122 070	1 488 892
20	21	СТРСНБ РК 2022	Доплата на изменение марки стали С255	тн	1.3269152	14 178	18 813
			Итого по подразделу: РВертикальные связи				**1 872 854**
			Подраздел: РГоризонтальные связи и распорки				
21	22	6106-0302-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м.	т	4.90452	334 797	1 642 019
22	23	222-525-0104РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	5.1007008	1 123 608	5 731 188
23	24	СТРСНБ РК 2022	Доплата на изменение марки стали С255	тн	5.1007008	14 178	72 318
			Итого по подразделу: РГоризонтальные связи и распорки				**7 445 525**
			Подраздел: РПрогоны				
24	25	6106-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м.	т	7.959	101 118	804 798

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	26	214-203-0202РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	8.27736	372 994	3 087 406
26	27	СТРСНБ РК 2022	Доплата на изменение марки стали С255	тн	8.27736	14 178	117 356
			Итого по подразделу: РПрогоны				**4 009 560**
			Подраздел: РАнтикоррозийная защита				
27	28	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	768.76593	258	198 342
28	29	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	768.76593	397	305 200
			Итого по подразделу: РАнтикоррозийная защита				**503 542**
			Итого по отделу: Блок Ж				**30 898 986**
			Отдел: Блок И				
			Подраздел: РФермы				
29	31	6106-0302-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж стропильной фермы,подстропильной фермы: пролет до 24 м,масса до 3 т,высота до 25 м.	т	2.65936	196 478	522 506
30	32	222-525-0105РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	2.7657344	1 123 608	3 107 600
31	33	СТРСНБ РК 2022	Доплата на изменение марки стали С255	тн	2.7657344	14 178	39 213
			Итого по подразделу: РФермы				**3 669 319**
			Подраздел: РВертикальные связи				
32	34	6106-0302-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м.	т	0.97492	286 194	279 016
33	35	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1.0139168	1 122 070	1 137 686
34	36	СТРСНБ РК 2022	Доплата на изменение марки стали С255	тн	1.0139168	14 178	14 375
			Итого по подразделу: РВертикальные связи				**1 431 077**
			Подраздел: РГоризонтальные связи и распорки				
35	37	6106-0302-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м.	т	1.53604	334 797	514 262
36	38	222-525-0104РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	1.5974816	1 123 608	1 794 943
37	39	СТРСНБ РК 2022	Доплата на изменение марки стали С255	тн	1.5974816	14 178	22 649
			Итого по подразделу: РГоризонтальные связи и распорки				**2 331 854**
			Подраздел: РПрогоны				
38	40	6106-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м.	т	1.931	101 118	195 259
39	41	214-203-0202РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	2.00824	372 994	749 061

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	42	СТРСНБ РК 2022	Доплата на изменение марки стали С255	тн	2.00824	14 178	28 473
			Итого по подразделу: РПрогоны				**972 793**
			Подраздел: РАнтикоррозийная защита				
41	43	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	205.93828	258	53 131
42	44	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	205.93828	397	81 757
			Итого по подразделу: РАнтикоррозийная защита				**134 889**
			Итого по отделу: Блок И				**8 539 933**
			Итого по локальной смете: Конструкции металлические (КМ)				**50 831 007**
			ИТОГО по акту:				**50 831 007**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				50831007.000 x 6.20%	3 151 522
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				50831007.000 + 3151522.337	53 982 529
		Сметная прибыль, 5.00%				53982529.337 x 5.00%	2 699 126
		Непредвиденные расходы, 2.000%				53982529.337 x 2.000%	1 079 650
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					57 761 306
		Коэффициент 2023 года, к = 0.9699				57761306.391 x 0.9699	56 024 545
		НДС (12%)				56024545.481 x 12%	6 722 945
		Итого с НДС				56024545.481 + 6722945.458	62 747 490

Лист согласования
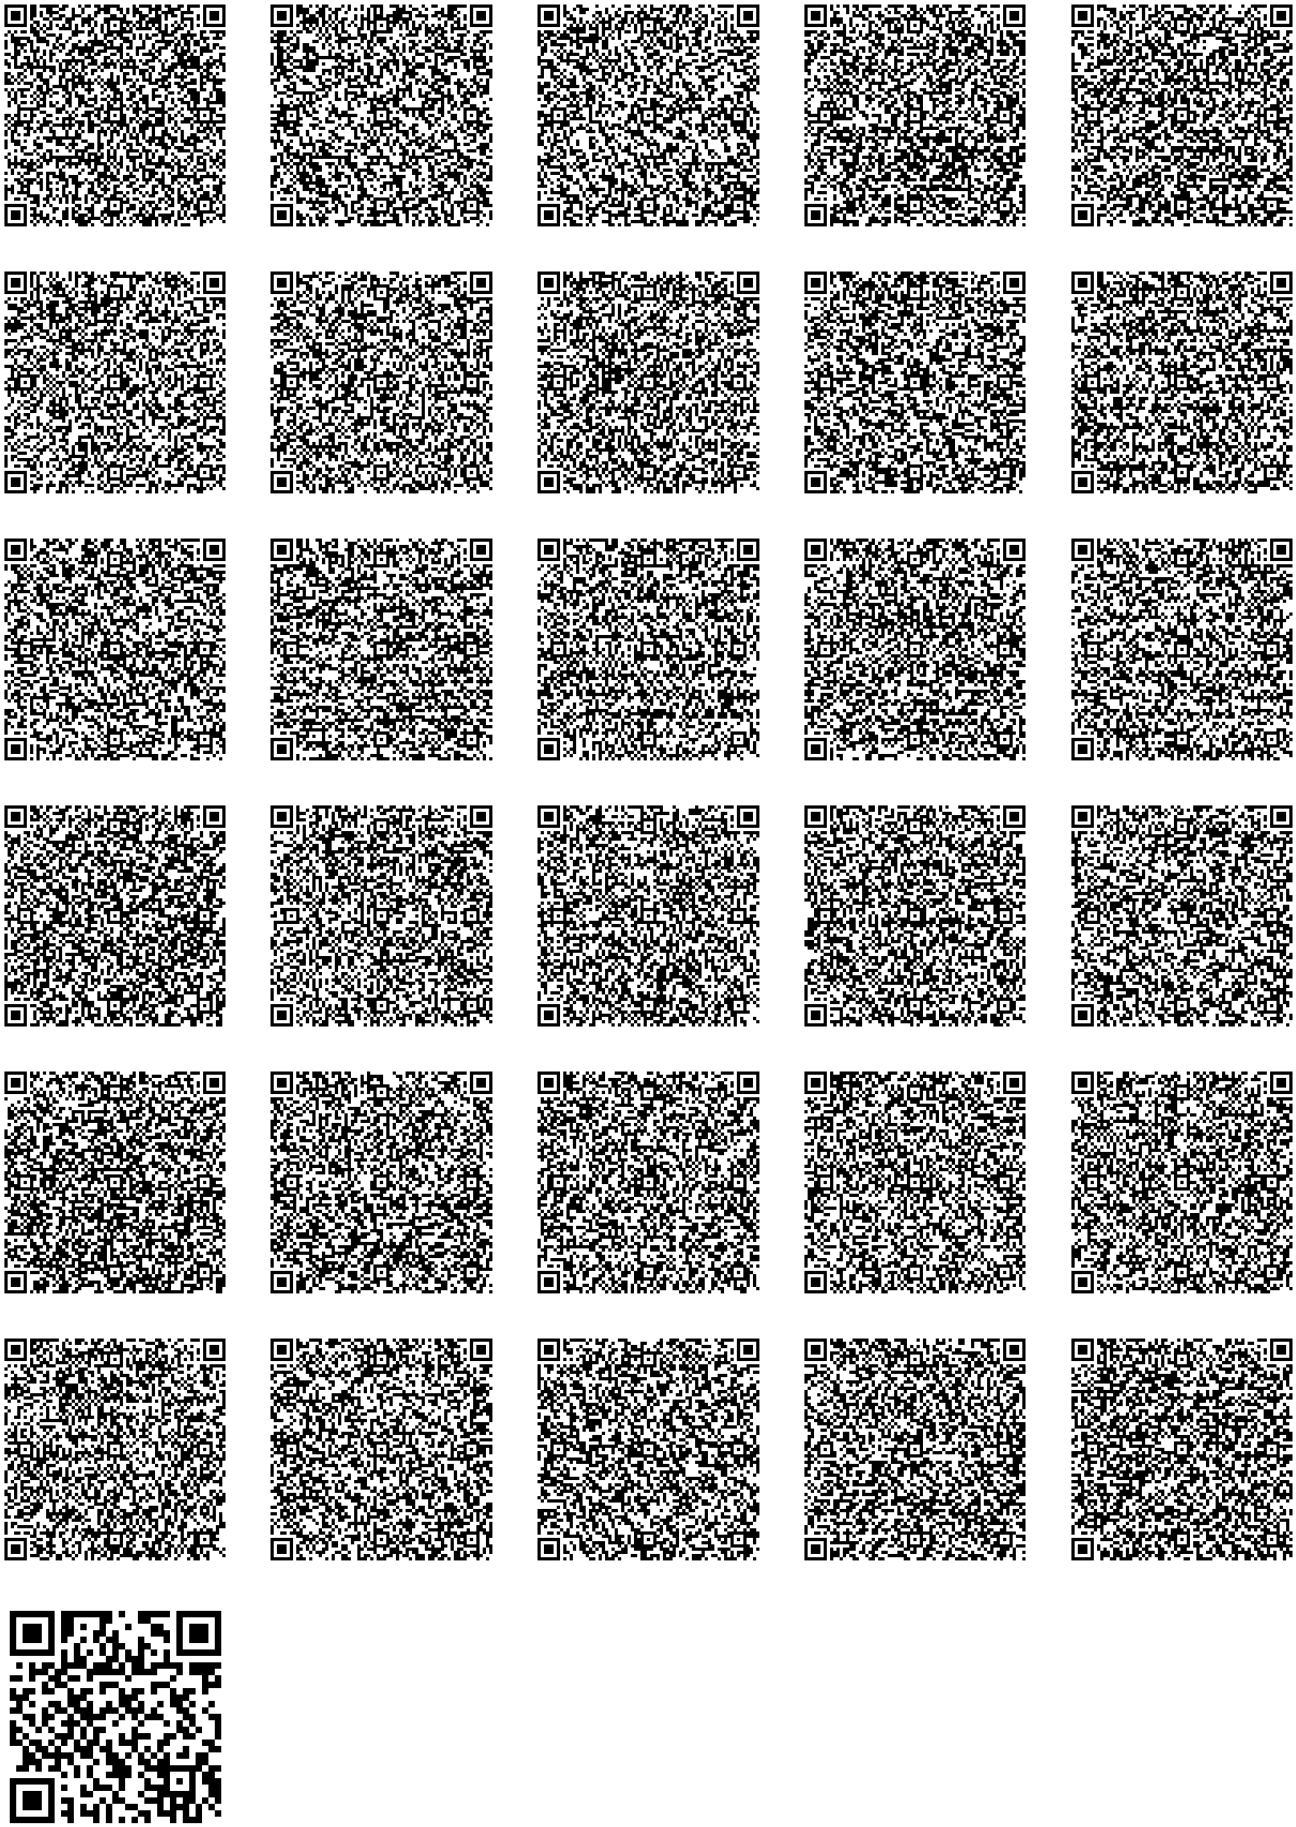
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910705300072 - АЛИМБЕК АСЛАН null	Генеральный директор	21.11.2024 11:15
Представители технического надзора		
631111302390 - МАМБЕТАЛИЕВ АБИЛХАН СЕИТОВИЧ	инженер эксперт	21.11.2024 17:09
Представители авторского надзора		
640601300092 - ШОЙБЕКОВ КУАНЫШБЕК ТУЛЕБЕКОВИЧ	Представитель авторского надзора	21.11.2024 11:27
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник сметного отдела	22.11.2024 16:24 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
841207350851 - ПРОТАСОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Шымкент	25.11.2024 04:03
920506301289 - ШЫНТЕМІРОВ ЖАНТӨРЕ БАУЫРЖАНҰЛЫ	Ведущий специалист ПТО регионального подразделения по городу Шымкент	22.11.2024 04:33 Комментарий: Объемы и расценки соответствуют
621019301182 - ТАЖИМБЕТОВ ЖАНАБАЙ БАЛГАБАЕВИЧ	Руководитель подразделения по городу Шымкент	22.11.2024 04:34
