Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140001989 - ТОО "Отау-Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне "Акжар"(Аргымак) Абайском районе города Шымкент на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **143 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные (КЖ)				
			Отдел: Блок А				
			Раздел: Колонны				
			Подраздел: Колонна Км-1 (КЖ-24)				
1	19	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	150.02	3 524	528 670
2	20	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	2.27591	82 602	187 994
3	21	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.81181	278 558	504 694
4	22	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.31642	292 454	92 538
5	23	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.14768	484 830	71 599
6	24	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.058968	2 230 253	131 514
7	25	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	15.002	37 590	563 925
8	26	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	150.02	1 603	240 482
			Итого по подразделу: Колонна Км-1 (КЖ-24)				**2 321 418**
			Подраздел: Колонна Км-2 (КЖ-25)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	27	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	23.08	3 524	81 333
10	28	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0.346	82 602	28 580
11	29	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.27874	278 558	77 645
12	30	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05022	292 454	14 686
13	31	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01704	484 830	8 261
14	32	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.009072	2 230 253	20 233
15	33	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	2.308	37 590	86 757
16	34	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	23.08	1 603	36 997
			Итого по подразделу: Колонна Км-2 (КЖ-25)				**354 495**
			Итого по разделу: Колонны				**2 675 914**
			Раздел: Диафрагмы жесткости				
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-1 (КЖ-26)				
17	35	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	23.03	9 089	209 319
18	36	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.36883	127 942	47 188
19	37	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05688	292 454	16 634
20	38	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.14213	287 903	40 919
21	39	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.16982	278 558	47 304
22	40	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	4.606	32 307	148 806
23	41	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	23.03	1 621	37 331
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-1 (КЖ-26)				**547 505**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-2 (КЖ-27)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	42	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	19.93	9 089	181 143
25	43	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.19748	127 942	153 207
26	44	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.16842	292 454	49 254
27	45	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.42349	287 903	121 924
28	46	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.60557	278 558	168 686
29	47	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	3.986	32 307	128 775
30	48	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	19.93	1 621	32 306
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-2 (КЖ-27)				**835 300**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-3 (КЖ-28)				
31	49	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	23.03	9 089	209 319
32	50	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.10651	127 942	141 569
33	51	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.17064	292 454	49 904
34	52	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.42639	287 903	122 758
35	53	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.50945	278 558	141 911
36	54	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	4.606	32 307	148 806
37	55	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	23.03	1 621	37 331
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-3 (КЖ-28)				**851 601**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-4 (КЖ-29)				
38	56	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	28.47	9 089	258 763

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	57	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.51646	127 942	194 019
40	58	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.21585	292 454	63 125
41	59	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.48187	287 903	138 731
42	60	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.81874	278 558	228 066
43	61	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	5.694	32 307	183 956
44	62	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	28.47	1 621	46 150
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-4 (КЖ-29)				**1 112 813**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-5 (КЖ-30)				
45	67	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	27.36	9 089	248 675
46	68	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.33817	127 942	171 207
47	69	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.19463	292 454	56 920
48	70	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.4983	287 903	143 462
49	71	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.64524	278 558	179 736
50	72	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	5.472	32 307	176 784
51	73	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	27.36	1 621	44 350
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-5 (КЖ-30)				**1 021 136**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-6 (КЖ-31)				
52	78	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	54.74	9 089	497 531
53	79	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	2.37775	127 942	304 214
54	80	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.41292	292 454	120 759

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	81	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1.18114	287 903	340 053
56	82	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.78366	278 558	218 294
57	83	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	10.948	32 307	353 697
58	84	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	54.74	1 621	88 733
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-6 (КЖ-31)				**1 923 284**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-7 (КЖ-32)				
59	85	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	27.48	9 089	249 765
60	86	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.37893	127 942	176 423
61	87	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.21585	292 454	63 125
62	88	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.48821	287 903	140 556
63	89	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.67487	278 558	187 990
64	90	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	5.496	32 307	177 559
65	91	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	27.48	1 621	44 544
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-7 (КЖ-32)				**1 039 966**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-8 (КЖ-33)				
66	96	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	27.48	9 089	249 765
67	97	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.38186	127 942	176 798
68	98	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.21585	292 454	63 125
69	99	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.49252	287 903	141 798
70	100	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.67349	278 558	187 606

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	101	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	5.496	32 307	177 559
72	102	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	27.48	1 621	44 544
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-8 (КЖ-33)				**1 041 198**
			Итого по разделу: Диафрагмы жесткости				**8 372 806**
			Раздел: Ригели монолитные				
			Подраздел: Ригель монолитный Рм1 (КЖ-41)				
73	148	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	10.74	112 529	1 208 561
74	149	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5366	292 454	156 930
75	150	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.5078	278 558	420 010
76	151	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1 (КЖ-41)				**1 795 617**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм2 (КЖ-42)				
77	152	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	7.16	112 529	805 707
78	153	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3576	292 454	104 581
79	154	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.038	278 558	289 143
80	155	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0090708	2 230 253	20 230
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм2 (КЖ-42)				**1 219 662**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм3 (КЖ-43)				
81	156	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	8.84	112 529	994 756
82	157	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4388	292 454	128 328
83	158	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.2712	278 558	354 102
84	159	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм3 (КЖ-43)				**1 487 303**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм4 (КЖ-44)				
85	160	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	10.62	112 529	1 195 058
86	161	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5284	292 454	154 532
87	162	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.5078	278 558	420 010
88	163	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм4 (КЖ-44)				**1 779 716**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм5 (КЖ-45)				
89	164	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	2.56	112 529	288 074
90	165	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1464	292 454	42 815
91	166	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4144	278 558	115 434
92	167	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0090708	2 230 253	20 230
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм5 (КЖ-45)				**466 553**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм6 (КЖ-45)				
93	168	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	17.28	112 529	1 944 501
94	169	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.2648	292 454	369 895
95	170	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.2256	278 558	898 516
96	171	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0181416	2 230 253	40 460
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм6 (КЖ-45)				**3 253 374**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм7 (КЖ-45)				
97	172	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	7.04	112 529	792 204
98	173	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1936	292 454	56 619

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	174	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5092	278 558	141 841
100	175	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм7 (КЖ-45)				**1 000 780**
			Итого по разделу: Ригели монолитные				**11 003 008**
			Раздел: Плиты перекрытия				
			Подраздел: Р Плиты перекрытия Пм1 на отм. -0.100, +3.500, +7.100 (КЖ-47)				
101	186	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	680	5 340	3 631 200
102	187	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	15.31951	103 970	1 592 769
103	188	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.0267	82 011	2 189
104	189	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.088	292 454	318 190
105	190	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	14.2315	278 558	3 964 298
106	191	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м3	136	38 511	5 237 496
107	192	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	680	2 912	1 980 160
			Итого по подразделу: Р Плиты перекрытия Пм1 на отм. -0.100, +3.500, +7.100 (КЖ-47)				**16 726 303**
			Подраздел: Р Монолитная плита Мп2 на отм. +10.700 (КЖ-51)				
108	193	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	683	5 340	3 647 220
109	194	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	15.8582	103 970	1 648 777
110	195	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.0267	82 011	2 190
111	196	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.1184	292 454	327 080
112	197	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	14.7398	278 558	4 105 889

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	198	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м3	136.6	38 511	5 260 603
114	199	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	683	2 912	1 988 896
			Итого по подразделу: Р Монолитная плита Мп2 на отм. +10.700 (КЖ-51)				**16 980 656**
			Итого по разделу: Плиты перекрытия				**33 706 959**
			Итого по отделу: Блок А				**55 758 688**
			Отдел: Блок Б				
			Раздел: Колонны				
			Подраздел: Колонна Км-1 (КЖ-21)				
115	333	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	138.48	3 524	488 003
116	334	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	2.10084	82 602	173 533
117	335	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.67244	278 558	465 871
118	336	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.29208	292 454	85 420
119	337	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.13632	484 830	66 092
120	338	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.054432	2 230 253	121 397
121	339	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	13.848	37 590	520 546
122	340	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	138.48	1 603	221 983
			Итого по подразделу: Колонна Км-1 (КЖ-21)				**2 142 847**
			Итого по разделу: Колонны				**2 142 847**
			Раздел: Диафрагмы жесткости				
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-1 (КЖ-22)				
123	341	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	12.215	9 089	111 022
124	342	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.46953	127 942	60 072

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
125	343	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06979	292 454	20 410
126	344	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.13473	287 903	38 789
127	345	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.26498	278 558	73 812
128	346	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	2.443	32 307	78 926
129	347	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	12.215	1 621	19 800
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-1 (КЖ-22)				**402 833**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-2 (КЖ-23)				
130	352	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	14.2	9 089	129 063
131	353	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.48879	127 942	62 536
132	354	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06341	292 454	18 544
133	355	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.157865	287 903	45 449
134	356	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.267495	278 558	74 512
135	357	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	2.84	32 307	91 751
136	358	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	14.2	1 621	23 018
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-2 (КЖ-23)				**444 877**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-4 (КЖ-24)				
137	363	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	27.37	9 089	248 766
138	364	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.50701	127 942	64 867
139	365	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07194	292 454	21 039
140	366	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.16215	287 903	46 683

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	367	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.27292	278 558	76 024
142	368	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	5.474	32 307	176 848
143	369	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	27.37	1 621	44 366
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-4 (КЖ-24)				**678 595**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-5 (КЖ-25)				
144	374	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	23.51	9 089	213 682
145	375	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.53819	127 942	68 857
146	376	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07583	292 454	22 176
147	377	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.1954	287 903	56 256
148	378	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.26696	278 558	74 363
149	379	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	4.702	32 307	151 907
150	380	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	23.51	1 621	38 109
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-5 (КЖ-25)				**625 353**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-6 (КЖ-26)				
151	385	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	54.74	9 089	497 531
152	386	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.6681	127 942	85 478
153	387	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.13764	292 454	40 253
154	388	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.32425	287 903	93 352
155	389	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.20621	278 558	57 441
156	390	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	10.948	32 307	353 696

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
157	391	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	54.74	1 621	88 733
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-6 (КЖ-26)				**1 216 487**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-7 (КЖ-27)				
158	392	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	23.4	9 089	212 682
159	393	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.52273	127 942	66 879
160	394	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07425	292 454	21 714
161	395	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.19256	287 903	55 438
162	396	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.25589	278 558	71 280
163	397	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	4.68	32 307	151 196
164	398	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	23.4	1 621	37 931
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-7 (КЖ-27)				**617 123**
			Итого по разделу: Диафрагмы жесткости				**3 985 271**
			Раздел: Ригели монолитные				
			Подраздел: Ригель монолитный Рм1 (КЖ-33)				
165	427	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	14.08	112 529	1 584 408
166	428	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.6988	292 454	204 366
167	429	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.0392	278 558	568 035
168	430	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0090708	2 230 253	20 230
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1 (КЖ-33)				**2 377 040**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм1" (КЖ-33)				
169	431	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	10.48	112 529	1 179 304
170	432	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.59	292 454	172 547

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
171	433	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.5336	278 558	427 196
172	434	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0090708	2 230 253	20 230
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1" (КЖ-33)				**1 799 278**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм2 (КЖ-34)				
173	435	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	4.32	112 529	486 125
174	436	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1936	292 454	56 619
175	437	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6052	278 558	168 583
176	438	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм2 (КЖ-34)				**721 443**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм3 (КЖ-34)				
177	439	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	8.64	112 529	972 250
178	440	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3872	292 454	113 238
179	441	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.2104	278 558	337 166
180	442	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0090708	2 230 253	20 230
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм3 (КЖ-34)				**1 442 885**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм4 (КЖ-35)				
181	443	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	14.08	112 529	1 584 408
182	444	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.6324	292 454	184 947
183	445	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.4728	278 558	688 818
184	446	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0090708	2 230 253	20 230
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм4 (КЖ-35)				**2 478 404**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм5 (КЖ-35)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
185	447	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	1.6	112 529	180 046
186	448	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0732	292 454	21 407
187	449	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3102	278 558	86 408
188	450	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм5 (КЖ-35)				**297 978**
			Итого по разделу: Ригели монолитные				**9 117 029**
			Раздел: Плиты перекрытия				
			Подраздел: Р Плиты перекрытия Пм1 на отм. -0.100, +3.500, +7.100 (КЖ-37)				
189	461	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	453	5 340	2 419 020
190	462	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	10.465821	103 970	1 088 131
191	463	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.0267	82 011	2 189
192	464	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.73126	292 454	213 860
193	465	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	9.73456	278 558	2 711 639
194	466	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м3	90.6	38 511	3 489 096
195	467	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	453	2 912	1 319 136
			Итого по подразделу: Р Плиты перекрытия Пм1 на отм. -0.100, +3.500, +7.100 (КЖ-37)				**11 243 073**
			Подраздел: Р Монолитная плита Мп2 на отм. +10.700 (КЖ-41)				
196	468	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	469	5 340	2 504 460
197	469	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	10.5606	103 970	1 097 986
198	470	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.7504	292 454	219 457
199	471	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	9.8102	278 558	2 732 710

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
200	472	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м3	93.8	38 511	3 612 332
201	473	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	469	2 912	1 365 728
			Итого по подразделу: Р Монолитная плита Мп2 на отм. +10.700 (КЖ-41)				**11 532 673**
			Итого по разделу: Плиты перекрытия				**22 775 746**
			Итого по отделу: Блок Б				**38 020 894**
			Отдел: Блок В				
			Раздел: Колонны				
			Подраздел: Колонна Км-1 (КЖ-18)				
202	567	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	132.71	3 524	467 670
203	568	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	2.01329	82 602	166 301
204	569	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.60274	278 558	446 456
205	570	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.41055	292 454	120 067
206	571	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.13064	484 830	63 338
207	572	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.052164	2 230 253	116 339
208	573	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	13.271	37 590	498 856
209	574	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	132.71	1 603	212 734
			Итого по подразделу: Колонна Км-1 (КЖ-18)				**2 091 763**
			Итого по разделу: Колонны				**2 091 763**
			Раздел: Диафрагмы жесткости				
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-1 (КЖ-19)				
210	575	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	27.37	9 089	248 766
211	576	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.32853	127 942	42 032

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
212	577	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0633	292 454	18 512
213	578	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.16214	287 903	46 680
214	579	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.10309	278 558	28 716
215	580	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	5.474	32 307	176 848
216	581	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	27.37	1 621	44 366
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-1 (КЖ-19)				**605 923**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-2 (КЖ-20)				
217	586	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	28.2	9 089	256 309
218	587	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.44317	127 942	56 700
219	588	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06394	292 454	18 699
220	589	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.16728	287 903	48 160
221	590	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.21195	278 558	59 040
222	591	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	5.64	32 307	182 211
223	592	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	28.2	1 621	45 712
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-2 (КЖ-20)				**666 833**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-3 (КЖ-21)				
224	597	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	24.11	9 089	219 135
225	598	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.40937	127 942	52 375
226	599	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05688	292 454	16 634
227	600	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.14253	287 903	41 034

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
228	601	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.20996	278 558	58 486
229	602	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	4.822	32 307	155 784
230	603	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	24.11	1 621	39 082
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-3 (КЖ-21)				**582 533**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-4 (КЖ-22)				
231	604	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	23.165	9 089	210 546
232	605	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.41102	127 942	52 586
233	606	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05816	292 454	17 009
234	607	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.15262	287 903	43 939
235	608	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.20024	278 558	55 778
236	609	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	4.633	32 307	149 678
237	610	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	23.165	1 621	37 550
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-4 (КЖ-22)				**567 089**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-5 (КЖ-23)				
238	611	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	54.74	9 089	497 531
239	612	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.79721	127 942	101 996
240	613	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.13764	292 454	40 253
241	614	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.39833	287 903	114 680
242	615	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.26121	278 558	72 762
243	616	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	10.948	32 307	353 697

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
244	617	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	54.74	1 621	88 733
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-5 (КЖ-23)				**1 269 654**
			Итого по разделу: Диафрагмы жесткости				**3 692 035**
			Раздел: Ригели монолитные				
			Подраздел: Ригель монолитный Рм1 (КЖ-28)				
245	634	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	11.32	112 529	1 273 828
246	635	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5532	292 454	161 785
247	636	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.5156	278 558	422 182
248	637	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1 (КЖ-28)				**1 867 911**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм1" (КЖ-29)				
249	638	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	10.92	112 529	1 228 816
250	639	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.547	292 454	159 972
251	640	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.5156	278 558	422 182
252	641	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1" (КЖ-29)				**1 821 087**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм2 (КЖ-30)				
253	642	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	7.24	112 529	814 710
254	643	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.366	292 454	107 037
255	644	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.0394	278 558	289 533
256	645	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм2 (КЖ-30)				**1 221 396**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм3 (КЖ-31)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
257	646	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	16	112 529	1 800 464
258	647	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.708	292 454	207 057
259	648	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.7856	278 558	775 951
260	649	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0181416	2 230 253	40 460
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм3 (КЖ-31)				**2 823 933**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм4 (КЖ-31)				
261	650	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	3.84	112 529	432 111
262	651	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1698	292 454	49 658
263	652	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.77712	278 558	216 472
264	653	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0136062	2 230 253	30 345
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм4 (КЖ-31)				**728 588**
			Итого по разделу: Ригели монолитные				**8 462 916**
			Раздел: Плиты перекрытия				
			Подраздел: Р Плиты перекрытия Пм1 на отм. -0.100, +3.500, +7.100 (КЖ-33)				
265	669	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	402	5 340	2 146 680
266	670	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	9.3562	103 970	972 763
267	671	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.0267	82 011	2 189
268	672	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.6432	292 454	188 106
269	673	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	8.713	278 558	2 427 076
270	674	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м3	80.4	38 511	3 096 284
271	675	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	402	2 912	1 170 624

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Р Плиты перекрытия Пм1 на отм. -0.100, +3.500, +7.100 (КЖ-33)				**10 003 724**
			Подраздел: Р Монолитная плита Мп2 на отм. +10.700 (КЖ-37)				
272	676	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	418	5 340	2 232 120
273	677	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	9.2738	103 970	964 196
274	678	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.0267	82 011	2 190
275	679	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.6432	292 454	188 106
276	680	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	8.6306	278 558	2 404 123
277	681	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м3	83.6	38 511	3 219 520
278	682	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	418	2 912	1 217 216
			Итого по подразделу: Р Монолитная плита Мп2 на отм. +10.700 (КЖ-37)				**10 227 471**
			Итого по разделу: Плиты перекрытия				**20 231 196**
			Итого по отделу: Блок В				**34 477 911**
			Отдел: Блок Г				
			Раздел: Колонны				
			Подраздел: Колонна Км-1 (КЖ-20)				
279	798	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	230.8	3 524	813 339
280	799	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	3.5014	82 602	289 222
281	800	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2.7874	280 148	780 884
282	801	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4868	292 454	142 366
283	802	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.2272	484 830	110 153
284	803	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.04536	2 230 253	101 164

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
285	804	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	23.08	37 590	867 577
286	805	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	230.8	1 603	369 972
			Итого по подразделу: Колонна Км-1 (КЖ-20)				**3 474 679**
			Итого по разделу: Колонны				**3 474 679**
			Раздел: Диафрагмы жесткости				
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-1 (КЖ-21)				
287	806	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	109.48	9 089	995 063
288	807	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.65186	127 942	211 342
289	808	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.31718	292 454	92 760
290	809	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.81222	287 903	233 840
291	810	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.52244	278 558	145 529
292	811	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	21.896	32 307	707 394
293	812	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	109.48	1 621	177 466
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-1 (КЖ-21)				**2 563 397**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-2 (КЖ-22)				
294	817	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	54.64	9 089	496 623
295	818	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.88798	127 942	113 610
296	819	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.12975	292 454	37 945
297	820	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.329	287 903	94 720
298	821	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.42923	278 558	119 565
299	822	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	10.948	32 307	353 697

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
300	823	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	54.74	1 621	88 733
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-2 (КЖ-22)				**1 304 895**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-3 (КЖ-23)				
301	828	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	54.74	9 089	497 532
302	829	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.90032	127 942	115 188
303	830	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.12975	292 454	37 945
304	831	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.34134	287 903	98 272
305	832	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.42923	278 558	119 565
306	833	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	10.948	32 307	353 697
307	834	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	54.74	1 621	88 733
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-3 (КЖ-23)				**1 310 934**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-4 (КЖ-24)				
308	839	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	46.06	9 089	418 639
309	840	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.00731	127 942	128 877
310	841	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.11522	292 454	33 696
311	842	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.0165312	287 903	4 759
312	843	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.8755588	278 558	243 894
313	844	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	9.212	32 307	297 612
314	845	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	46.06	1 621	74 663
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-4 (КЖ-24)				**1 202 142**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-5 (КЖ-25)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
315	850	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	27.59	9 089	250 765
316	851	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.89812	127 942	114 907
317	852	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.18212	292 454	53 261
318	853	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.2553	287 903	73 501
319	854	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.46069	278 558	128 329
320	855	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	5.518	32 307	178 269
321	856	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	27.59	1 621	44 723
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-5 (КЖ-25)				**843 758**
			Итого по разделу: Диафрагмы жесткости				**7 225 128**
			Раздел: Ригели монолитные				
			Подраздел: Ригель монолитный Рм1 (КЖ-30)				
322	877	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	6.92	112 529	778 700
323	878	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3474	292 454	101 598
324	879	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.9888	278 558	275 438
325	880	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1 (КЖ-30)				**1 165 852**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм2 (КЖ-30)				
326	881	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	6.92	112 529	778 700
327	882	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3474	292 454	101 598
328	883	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.9888	278 558	275 438
329	884	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм2 (КЖ-30)				**1 165 852**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм3 (КЖ-31)				
330	885	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	4.8	112 529	540 139
331	886	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4368	292 454	127 744
332	887	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.2256	278 558	341 400
333	888	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм3 (КЖ-31)				**1 019 399**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм4 (КЖ-32)				
334	889	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	16.32	112 529	1 836 473
335	890	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.531	292 454	155 293
336	891	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.0892	278 558	581 963
337	892	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0272124	2 230 253	60 690
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм4 (КЖ-32)				**2 634 420**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм5 (КЖ-32)				
338	893	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	3.84	112 529	432 111
339	894	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1698	292 454	49 658
340	895	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6696	278 558	186 522
341	896	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0272124	2 230 253	60 690
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм5 (КЖ-32)				**728 983**
			Итого по разделу: Ригели монолитные				**6 714 508**
			Раздел: Плиты перекрытия				
			Подраздел: Р Плиты перекрытия Пм1 на отм. -0.100, +3.500, +7.100 (КЖ-34)				
342	912	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	320	5 340	1 708 800

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
343	913	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	7.56173	103 970	786 193
344	914	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.0267	82 011	2 189
345	915	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.51846	292 454	151 625
346	916	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7.04327	278 558	1 961 959
347	917	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м3	64	38 511	2 464 704
348	918	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	320	2 912	931 840
			Итого по подразделу: Р Плиты перекрытия Пм1 на отм. -0.100, +3.500, +7.100 (КЖ-34)				**8 007 311**
			Подраздел: Р Монолитная плита Мп2 на отм. +10.700 (КЖ-38)				
349	919	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	336	5 340	1 794 240
350	920	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	7.87802	103 970	819 078
351	921	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.0267	82 011	2 190
352	922	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.54406	292 454	159 113
353	923	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7.33396	278 558	2 042 933
354	924	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м3	67.2	38 511	2 587 939
355	925	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	336	2 912	978 432
			Итого по подразделу: Р Монолитная плита Мп2 на отм. +10.700 (КЖ-38)				**8 383 925**
			Итого по разделу: Плиты перекрытия				**16 391 236**
			Итого по отделу: Блок Г				**33 805 553**
			Отдел: Блок Д				
			Раздел: Колонны				
			Подраздел: Колонна Км-1 (КЖ-17)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
356	1047	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	196.18	3 524	691 338
357	1048	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	2.97618	82 602	245 838
358	1049	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2.36928	280 148	663 749
359	1050	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.41378	292 454	121 011
360	1051	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.19312	484 830	93 630
361	1052	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.038556	2 230 253	85 990
362	1053	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	19.618	37 590	737 440
363	1054	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	196.18	1 603	314 476
			Итого по подразделу: Колонна Км-1 (КЖ-17)				**2 953 474**
			Итого по разделу: Колонны				**2 953 474**
			Раздел: Диафрагмы жесткости				
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-1 (КЖ-18)				
364	1055	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	164.22	9 089	1 492 595
365	1056	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	2.14325	127 942	274 211
366	1057	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.41292	292 454	120 760
367	1058	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1.11169	287 903	320 059
368	1059	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.61862	278 558	172 321
369	1060	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	32.844	32 307	1 061 090
370	1061	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	164.22	1 621	266 200
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-1 (КЖ-18)				**3 707 239**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-2 (КЖ-19)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
371	1066	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	92.12	9 089	837 278
372	1067	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.4901	127 942	190 646
373	1068	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.22752	292 454	66 539
374	1069	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.5833	287 903	167 933
375	1070	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.67928	278 558	189 218
376	1071	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	18.424	32 307	595 224
377	1072	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	92.12	1 621	149 326
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-2 (КЖ-19)				**2 196 167**
			Итого по разделу: Диафрагмы жесткости				**5 903 406**
			Раздел: Ригели монолитные				
			Подраздел: Ригель монолитный Рм1 (КЖ-24)				
378	1093	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	1.8	112 529	202 551
379	1094	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0894	292 454	26 145
380	1095	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2614	278 558	72 815
381	1096	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1 (КЖ-24)				**311 627**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм1" (КЖ-24)				
382	1097	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	1.66	112 529	186 797
383	1098	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0812	292 454	23 747
384	1099	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2614	278 558	72 815
385	1100	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1" (КЖ-24)				**293 475**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм2 (КЖ-25)				
386	1101	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	7.16	112 529	805 707
387	1102	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3578	292 454	104 640
388	1103	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.0086	278 558	280 953
389	1104	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм2 (КЖ-25)				**1 201 416**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм2" (КЖ-25)				
390	1105	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	7.04	112 529	792 204
391	1106	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3494	292 454	102 183
392	1107	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.0086	278 558	280 953
393	1108	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0045354	2 230 253	10 115
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм2" (КЖ-25)				**1 185 456**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм3 (КЖ-26)				
394	1109	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	16.32	112 529	1 836 473
395	1110	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.531	292 454	155 293
396	1111	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.0892	278 558	581 963
397	1112	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0272124	2 230 253	60 690
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм3 (КЖ-26)				**2 634 420**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм4 (КЖ-26)				
398	1113	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	2.56	112 529	288 074
399	1114	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1132	292 454	33 105

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
400	1115	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4464	278 558	124 348
401	1116	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0181416	2 230 253	40 460
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм4 (КЖ-26)				**485 988**
			Итого по разделу: Ригели монолитные				**6 112 385**
			Раздел: Плиты перекрытия				
			Подраздел: Р Плиты перекрытия Пм1 на отм. -0.100, +3.500, +7.100 (КЖ-37)				
402	1127	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	257	5 340	1 372 380
403	1128	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	5.9485	103 970	618 465
404	1129	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.0267	82 011	2 189
405	1130	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4112	292 454	120 257
406	1131	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.5373	278 558	1 542 459
407	1132	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м3	51.4	38 511	1 979 465
408	1133	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	257	2 912	748 384
			Итого по подразделу: Р Плиты перекрытия Пм1 на отм. -0.100, +3.500, +7.100 (КЖ-37)				**6 383 601**
			Подраздел: Р Монолитная плита Мп2 на отм. +10.700 (КЖ-32)				
409	1134	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	273	5 340	1 457 820
410	1135	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	6.2616	103 970	651 019
411	1136	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4368	292 454	127 743
412	1137	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.8248	278 558	1 622 544
413	1138	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м3	54.6	38 511	2 102 701

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
414	1139	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	273	2 912	794 976
			Итого по подразделу: Р Монолитная плита Мп2 на отм. +10.700 (КЖ-32)				**6 756 805**
			Итого по разделу: Плиты перекрытия				**13 140 406**
			Итого по отделу: Блок Д				**28 109 671**
			Отдел: Блок Е				
			Раздел: Колонны				
			Подраздел: Колонна Км-1 (КЖ-17)				
415	1229	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	29.76	3 524	104 874
416	1230	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0.41034	82 602	33 894
417	1231	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.32054	278 558	89 288
418	1232	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08678	292 454	25 379
419	1233	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.02844	484 830	13 788
420	1234	6103-0701-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0.0672	1 285 468	86 383
421	1235	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.009072	2 230 253	20 233
422	1236	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	2.976	37 590	111 867
423	1237	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	29.76	1 603	47 705
			Итого по подразделу: Колонна Км-1 (КЖ-17)				**533 415**
			Подраздел: Колонна Км-2 (КЖ-18)				
424	1238	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	25.32	3 524	89 227
425	1239	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0.41034	82 602	33 894
426	1240	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.32054	278 558	89 288

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
427	1241	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05834	292 454	17 061
428	1242	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.02844	484 830	13 788
429	1243	6103-0701-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0.0672	1 285 468	86 383
430	1244	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.009072	2 230 253	20 233
431	1245	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	2.532	37 590	95 177
432	1246	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	25.32	1 603	40 587
			Итого по подразделу: Колонна Км-2 (КЖ-18)				**485 643**
			Подраздел: Колонна Км-3 (КЖ-17)				
433	1247	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	14.88	3 524	52 436
434	1248	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0.20516	82 602	16 946
435	1249	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.16026	278 558	44 641
436	1250	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02916	292 454	8 528
437	1251	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01422	484 830	6 894
438	1252	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.004536	2 230 253	10 116
439	1253	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1.488	37 590	55 933
440	1254	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	14.88	1 603	23 852
			Итого по подразделу: Колонна Км-3 (КЖ-17)				**219 350**
			Подраздел: Колонна Км-4 (КЖ-18)				
441	1256	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0.09024	82 602	7 453

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
442	1257	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.0624	278 558	17 382
443	1258	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.016848	292 454	4 927
444	1259	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00948	484 830	4 596
445	1260	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.004536	2 230 253	10 116
			Итого по подразделу: Колонна Км-4 (КЖ-18)				**44 475**
			Подраздел: Колонна Км-5 (КЖ-19)				
446	1263	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	70.68	3 524	249 076
447	1264	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	1.0488	82 602	86 633
448	1265	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.8016	278 558	223 292
449	1266	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.152808	292 454	44 689
450	1267	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.08532	484 830	41 365
451	1268	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.027216	2 230 253	60 699
452	1269	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	7.068	37 590	265 686
453	1270	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	70.68	1 603	113 300
			Итого по подразделу: Колонна Км-5 (КЖ-19)				**1 084 741**
			Подраздел: Колонна Км-6 (КЖ-19)				
454	1271	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	11.78	3 524	41 512
455	1272	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0.17154	82 602	14 169
456	1273	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1336	278 558	37 215
457	1274	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.025056	292 454	7 327

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
458	1275	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.011368	484 830	5 511
459	1276	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.004536	2 230 253	10 116
460	1277	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1.178	37 590	44 281
461	1278	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	11.78	1 603	18 883
			Итого по подразделу: Колонна Км-6 (КЖ-19)				**179 017**
			Итого по разделу: Колонны				**2 546 643**
			Раздел: Диафрагмы жесткости				
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-1 (КЖ-20)				
462	1279	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	56.84	9 089	516 618
463	1280	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.91356	127 942	116 882
464	1281	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.13225	292 454	38 676
465	1282	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.34762	287 903	100 080
466	1283	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.43371	278 558	120 813
467	1284	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	11.368	32 307	367 265
468	1285	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	56.84	1 621	92 137
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-1 (КЖ-20)				**1 352 476**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-2 (КЖ-21)				
469	1290	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	54.58	9 089	496 077
470	1291	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.98261	127 942	125 716
471	1292	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.12448	292 454	36 404
472	1293	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.29712	287 903	85 541

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
473	1294	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.56099	278 558	156 268
474	1295	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	10.916	32 307	352 663
475	1296	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	54.58	1 621	88 474
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-2 (КЖ-21)				**1 341 146**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-3 (КЖ-28)				
476	1301	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	26.83	9 089	243 857
477	1302	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.51674	127 942	66 112
478	1303	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06204	292 454	18 144
479	1304	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.16366	287 903	47 118
480	1305	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.29104	278 558	81 071
481	1306	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	5.366	32 307	173 359
482	1307	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	26.83	1 621	43 491
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-3 (КЖ-28)				**673 155**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-4 (КЖ-29)				
483	1312	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	27.165	9 089	246 902
484	1313	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.43074	127 942	55 109
485	1314	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04628	292 454	13 534
486	1315	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.16302	287 903	46 934
487	1316	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.22142	278 558	61 678
488	1317	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	5.433	32 307	175 523

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
489	1318	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	27.165	1 621	44 034
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-4 (КЖ-29)				**643 717**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-5 (КЖ-30)				
490	1323	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки стены железобетонной	м2	47.14	9 089	428 455
491	1324	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0.6713	127 942	85 887
492	1325	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.108	292 454	31 585
493	1326	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.27046	287 903	77 866
494	1327	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.29284	278 558	81 572
495	1328	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	9.428	32 307	304 590
496	1329	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	47.14	1 621	76 413
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-5 (КЖ-30)				**1 086 371**
			Итого по разделу: Диафрагмы жесткости				**5 096 867**
			Раздел: Ригели монолитные				
			Подраздел: Ригель монолитный Рм1 (КЖ-35)				
497	1374	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	2.9	112 529	326 334
498	1375	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1477	292 454	43 195
499	1376	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4106	278 558	114 376
500	1377	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0022677	2 230 253	5 058
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1 (КЖ-35)				**488 963**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм1" (КЖ-35)				
501	1378	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	2.83	112 529	318 457
502	1379	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1435	292 454	41 967

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
503	1380	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4106	278 558	114 376
504	1381	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0022677	2 230 253	5 058
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1" (КЖ-35)				**479 858**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм2 (КЖ-36)				
505	1382	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	3.79	112 529	426 485
506	1383	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1924	292 454	56 268
507	1384	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5369	278 558	149 558
508	1385	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0022677	2 230 253	5 058
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм2 (КЖ-36)				**637 369**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм2" (КЖ-36)				
509	1386	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	3.73	112 529	419 733
510	1387	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1882	292 454	55 040
511	1388	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5369	278 558	149 558
512	1389	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0022677	2 230 253	5 058
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм2" (КЖ-36)				**629 389**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм3 (КЖ-37)				
513	1390	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	10.08	112 529	1 134 292
514	1391	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4566	292 454	133 534
515	1392	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.4901	278 558	415 079
516	1393	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0068031	2 230 253	15 173
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм3 (КЖ-37)				**1 698 078**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм4 (КЖ-37)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
517	1394	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	1.12	112 529	126 032
518	1395	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0507	292 454	14 827
519	1396	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1742	278 558	48 525
520	1397	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0022677	2 230 253	5 058
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм4 (КЖ-37)				**194 442**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм5 (КЖ-37)				
521	1398	6103-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м3	2.24	112 529	252 065
522	1399	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1015	292 454	29 683
523	1400	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3304	278 558	92 036
524	1401	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.0022677	2 230 253	5 058
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм5 (КЖ-37)				**378 843**
			Итого по разделу: Ригели монолитные				**4 506 942**
			Раздел: Плиты перекрытия				
			Подраздел: Р Плиты перекрытия Пм1 на отм. +7.100 (КЖ-42)				
525	1428	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	362	5 340	1 933 080
526	1429	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8.3341	103 970	866 496
527	1430	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5808	292 454	169 857
528	1431	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.026	287 903	7 484
529	1432	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	17.6273	278 558	4 910 225
530	1433	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м3	72.4	38 511	2 788 196
531	1434	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	362	2 912	1 054 144

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Р Плиты перекрытия Пм1 на отм. +7.100 (КЖ-42)				**11 729 483**
			Итого по разделу: Плиты перекрытия				**11 729 483**
			Итого по отделу: Блок Е				**23 879 935**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные (КЖ)				**214 052 655**
			ИТОГО по акту:				**214 052 655**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				214052655.624 x 6.20%	13 271 264
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				214052655.624 + 13271264.240	227 323 919
		Сметная прибыль, 5.00%				227323919.864 x 5.00%	11 366 195
		Непредвиденные расходы, 2.000%				227323919.864 x 2.000%	4 546 478
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					243 236 594
		Коэффициент 2023 года, к = 0.9699				243236594.255 x 0.9699	235 922 981
		НДС (12%)				235922981.818 x 12%	28 310 757
		Итого с НДС				235922981.818 + 28310757.818	264 233 739

Лист согласования
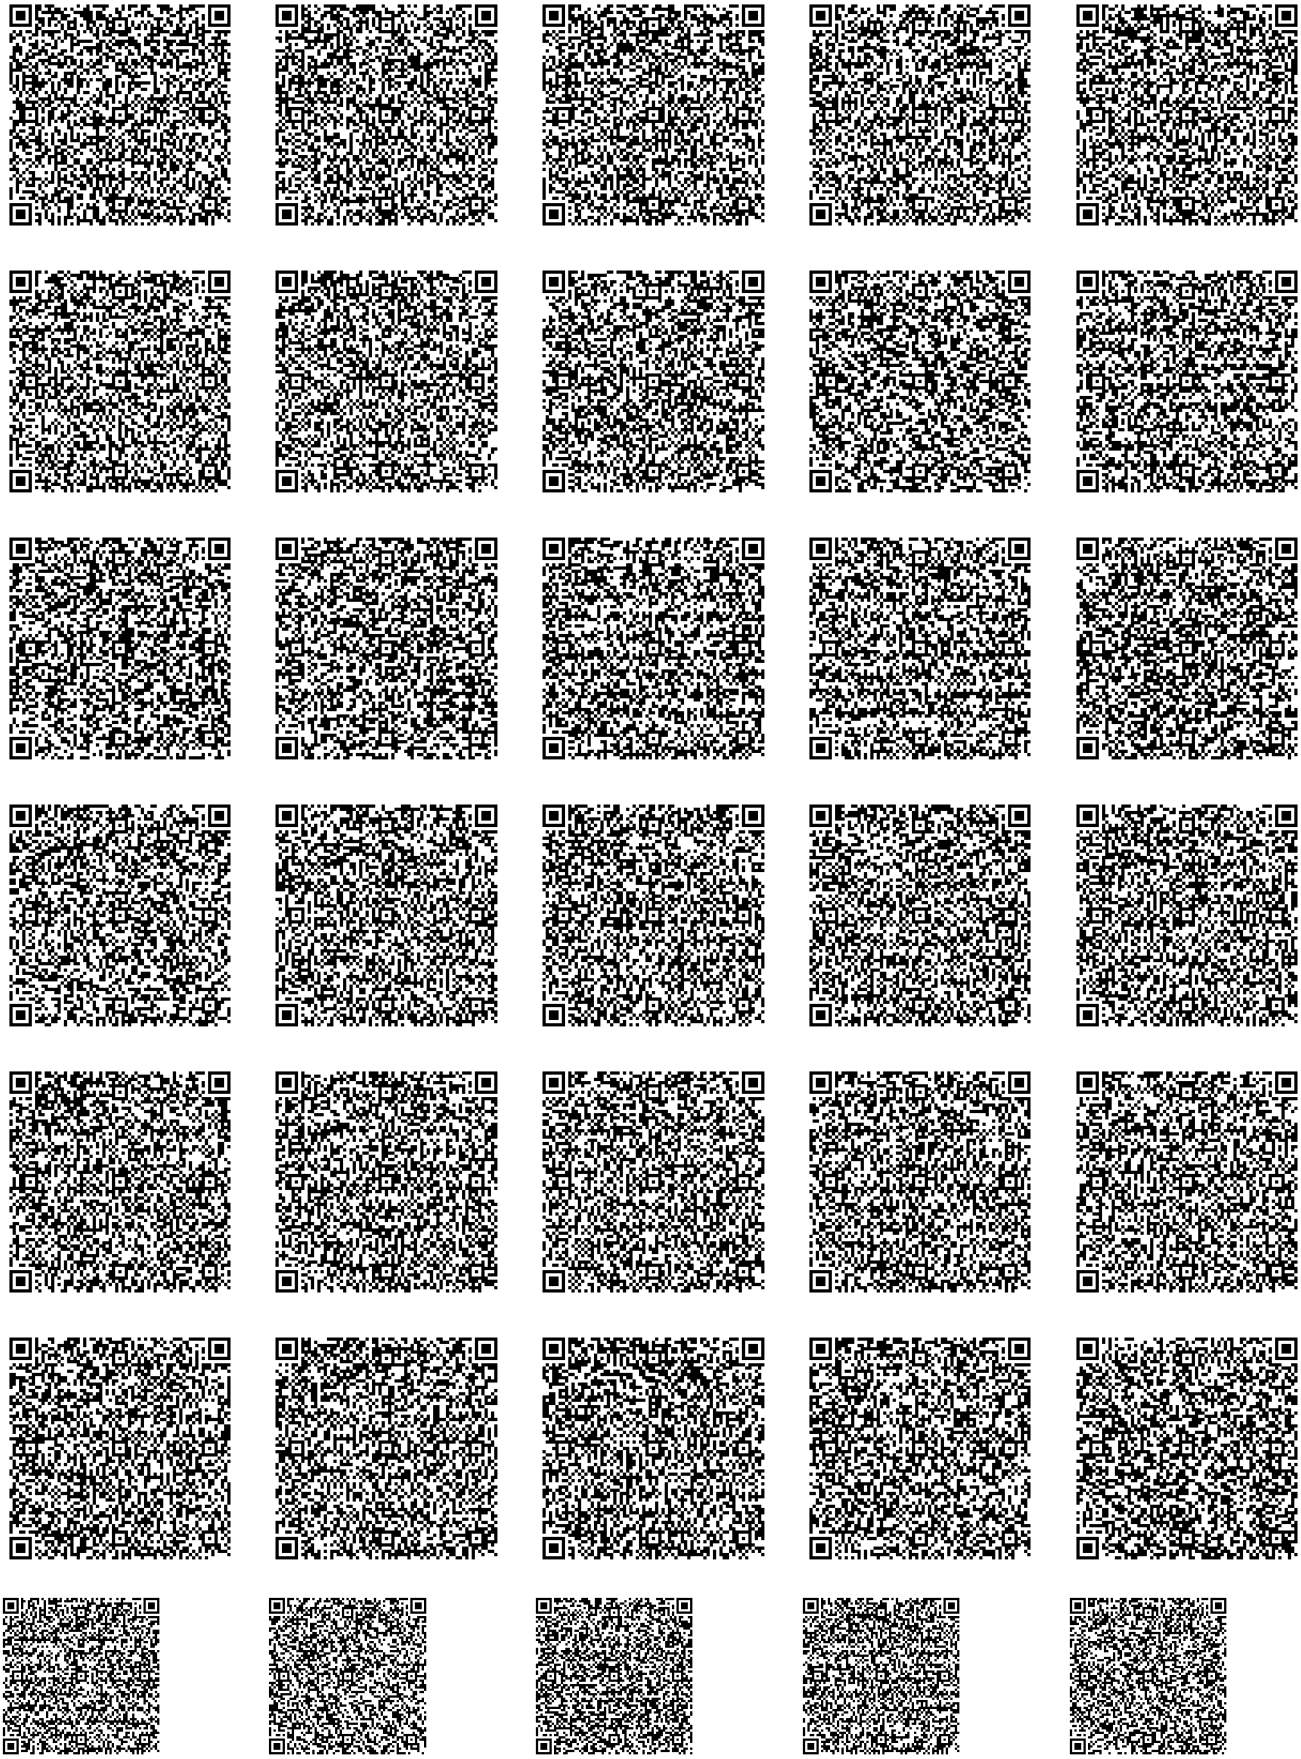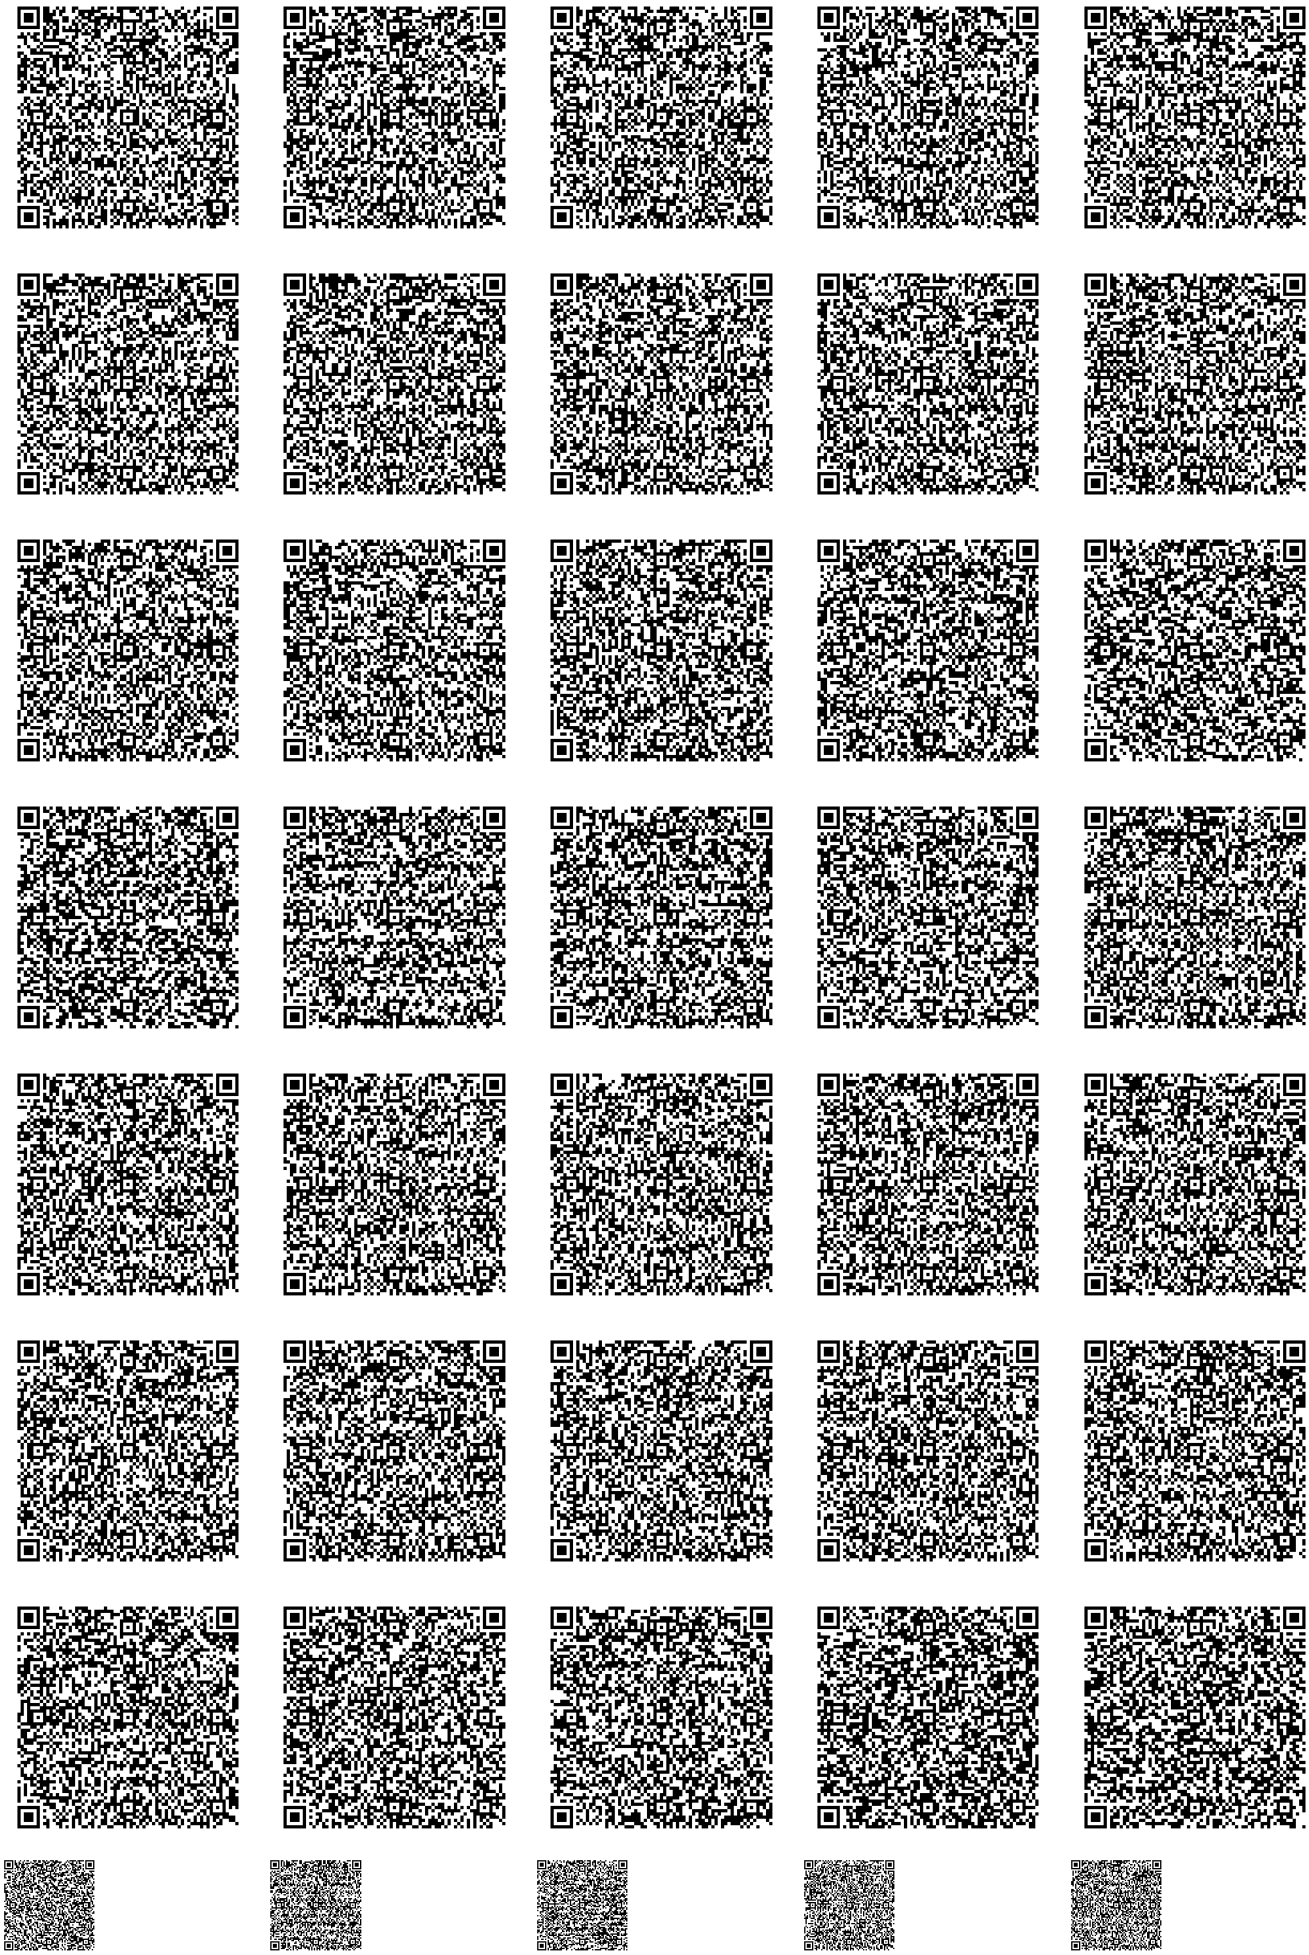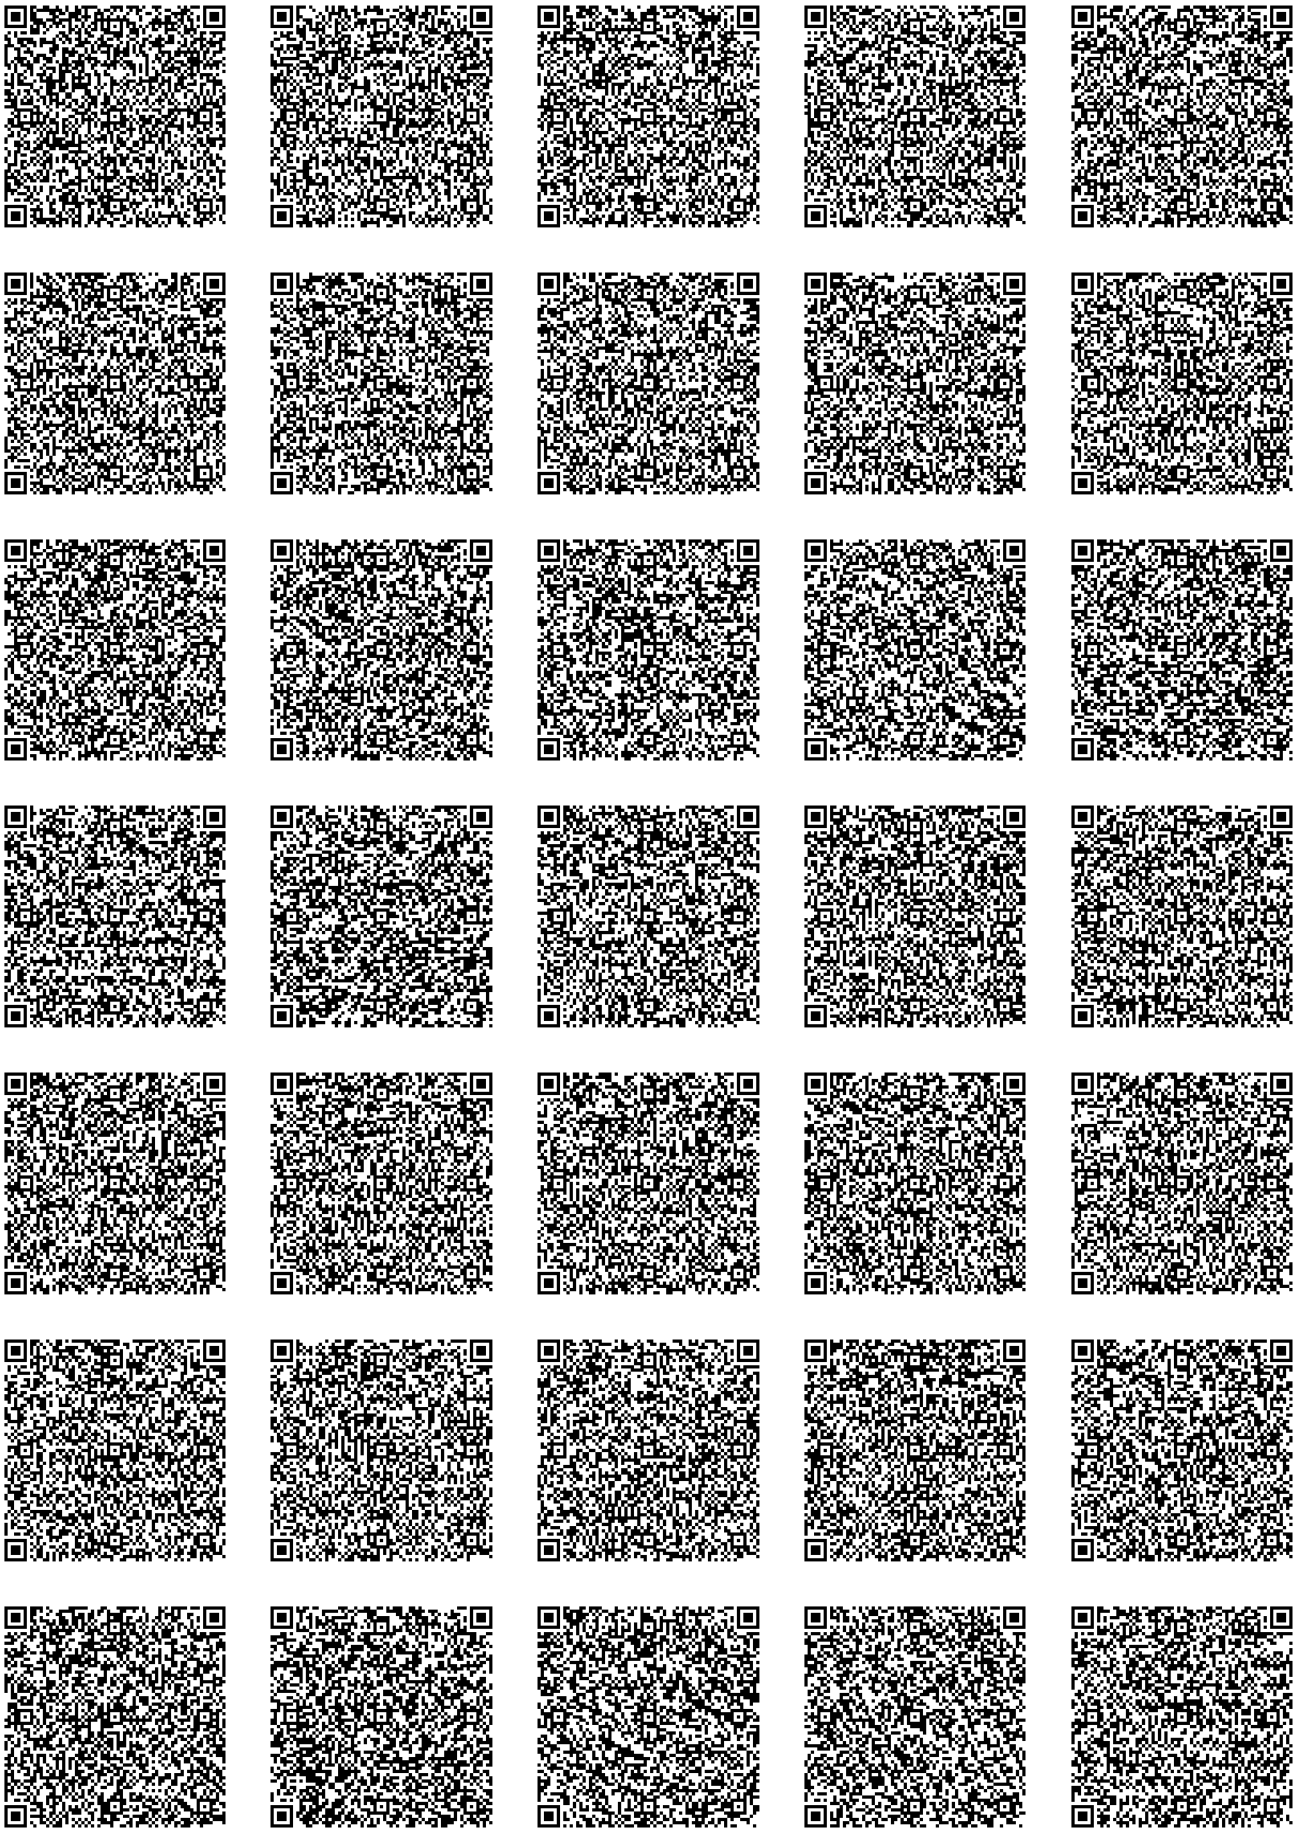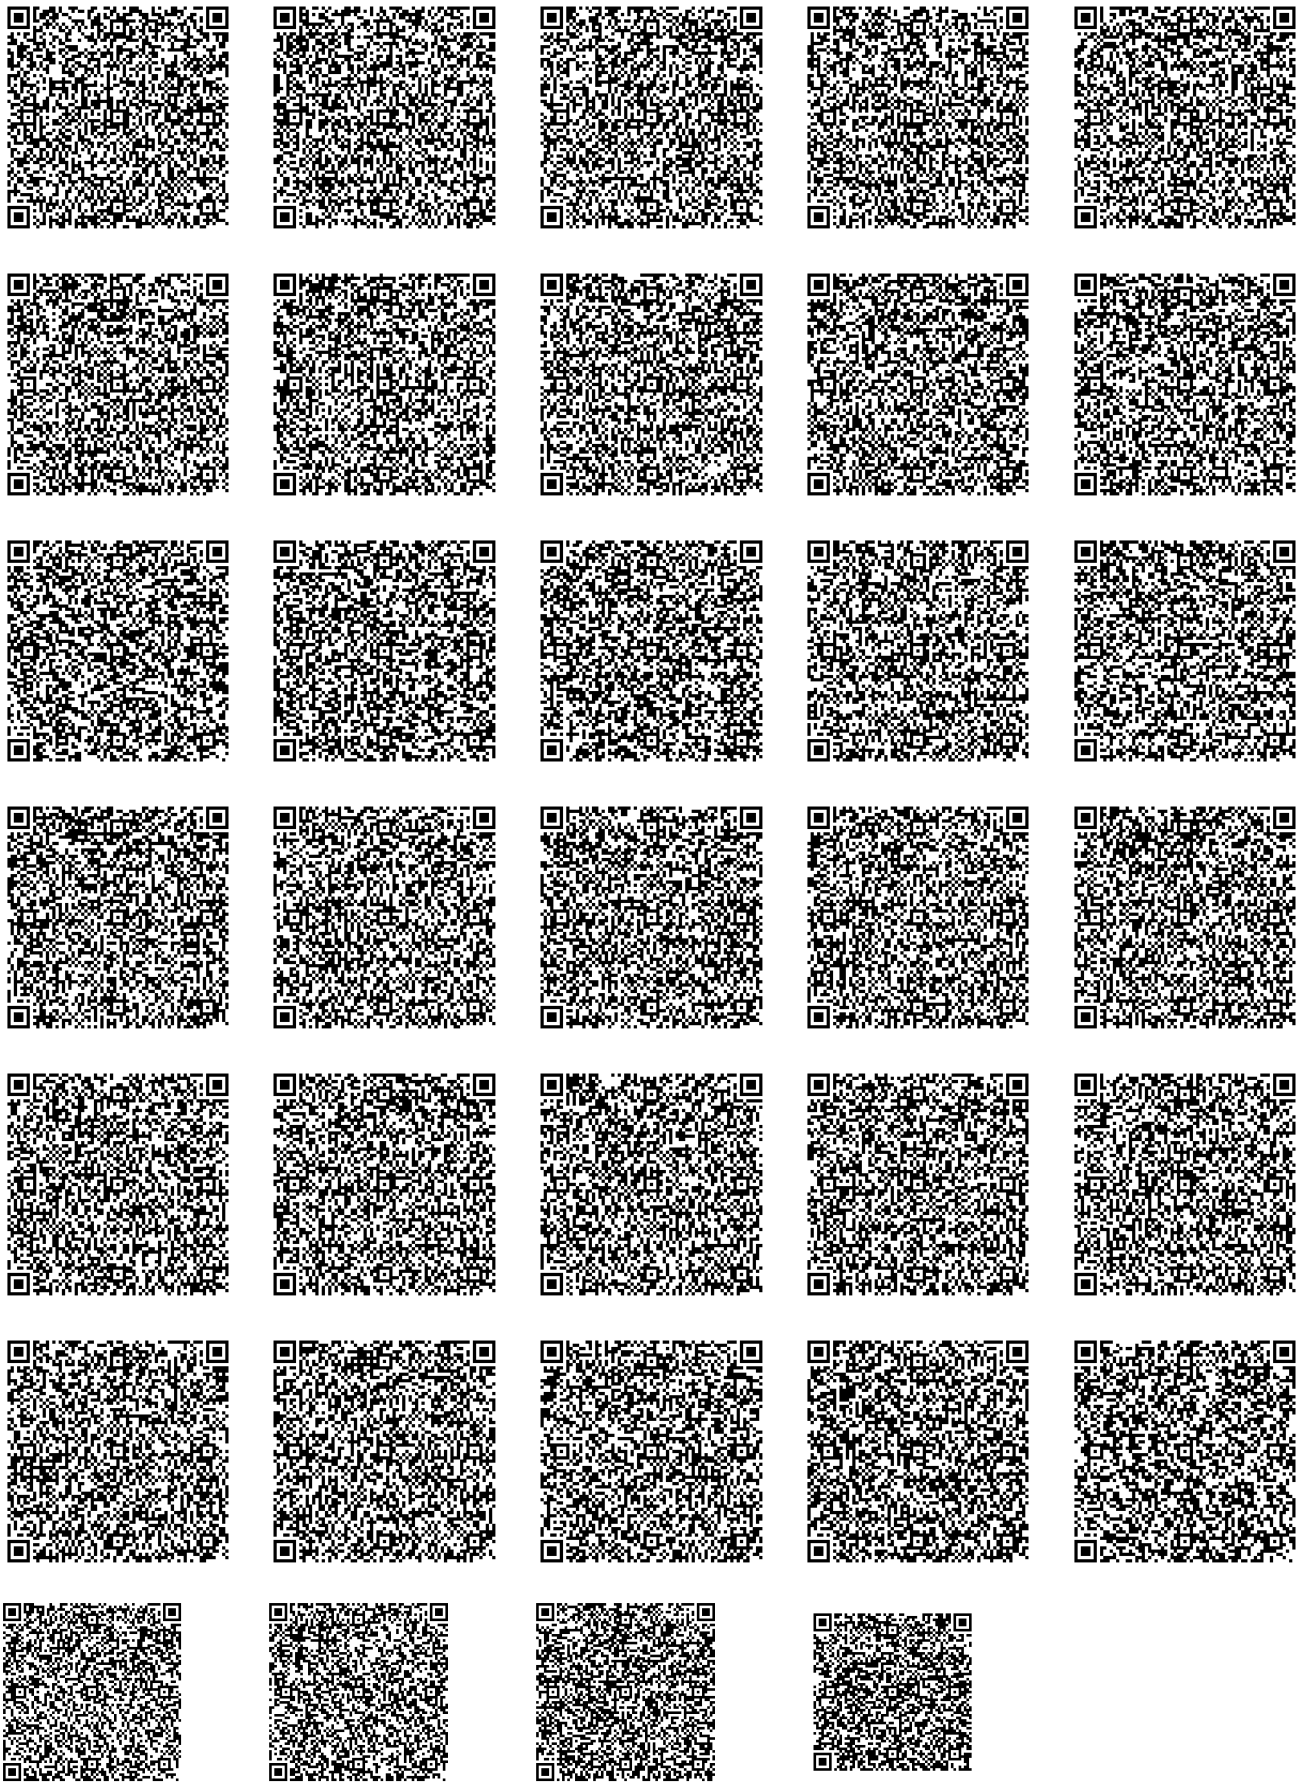
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
800511401159 - МОЛДАСЕИТОВА МАЙРА КУСАЙНОВНА	Генеральный директор	26.11.2024 07:45
Представители технического надзора		
631111302390 - МАМБЕТАЛИЕВ АБИЛХАН СЕИТОВИЧ	инженер эксперт	26.11.2024 11:46
Представители авторского надзора		
640601300092 - ШОЙБЕКОВ КУАНЫШБЕК ТУЛЕБЕКОВИЧ	Представитель авторского надзора	28.11.2024 04:39
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник сметного отдела	28.11.2024 14:03 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
920506301289 - ШЫНТЕМІРОВ ЖАНТӨРЕ БАУЫРЖАНҰЛЫ	Ведущий специалист ПТО регионального подразделения по городу Шымкент	28.11.2024 05:19
780101400096 - МЫРЗАКМЕТОВА МАРЖАН НУРТАСОВНА	Ведущий специалист сметчик подразделения по городу Шымкент	28.11.2024 05:20 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете.
910822300178 - КАРАБАЕВ КАНАТ МУЛДАШУЛЫ	Ведущий специалист	28.11.2024 05:22
841207350851 - ПРОТАСОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Шымкент	29.11.2024 04:22
621019301182 - ТАЖИМБЕТОВ ЖАНАБАЙ БАЛГАБАЕВИЧ	Руководитель подразделения по городу Шымкент	28.11.2024 05:23
